

東広島市公共下水道（防災・安全）（重点計画）
（事後評価）

東 広 島 市

令和 4 年 8 月 1 日

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年08月01日

計画の名称	東広島市公共下水道（防災・安全）（重点計画）												
計画の期間	平成30年度～平成31年度（2年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	東広島市												
計画の目標	本市は、南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されており、下水道施設の地震対策を実施することにより、安全・安心に暮らせるまちづくりを推進していきます。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	177	A	177	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H30当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H31末)
1	優先的に耐震化が必要な4施設（東広島浄化センター管理棟、黒瀬水質管理センター管理棟、福富浄化センター管理棟、高屋中継ポンプ場）の耐震化率を0%（H30当初）から75%（H31末）に増加させる。 耐震対策達成率 対策済施設数（施設） / 耐震化が必要な施設数（施設）	0%	0%	75%
2	下水道総合地震対策計画に基づくマンホールトイレの設置率を0%（H30当初）から10%（H31末）に増加させる。 マンホールトイレの設置率 マンホールトイレが設置された避難所数（箇所） / マンホールトイレを設置すべき避難所数（箇所）	0%	0%	10%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	東広島市	直接	東広島市	終末処理場	-	東広島浄化センター(地震対策)	処理場の駆体補強	東広島市						84	-		
	A07-002	下水道	一般	東広島市	直接	東広島市	ポンプ場	-	高屋中継ポンプ場他(地震対策)	ポンプ場の駆体補強	東広島市						47	-		
	A07-003	下水道	一般	東広島市	直接	東広島市	終末処理場	-	黒瀬水質管理センター(地震対策)	処理場の駆体補強	東広島市						10	-		
	A07-004	下水道	一般	東広島市	直接	東広島市	終末処理場	-	福富浄化センター(地震対策)	処理場の駆体補強	東広島市						22	-		
	A07-005	下水道	一般	東広島市	直接	東広島市	-	-	下水道総合地震対策事業	計画策定・マンホールトイレ整備	東広島市						14	未策定		
		総合地震対策																		
													小計						177	
												合計							177	


事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 東広島市において実施する	事後評価の実施時期 令和4年8月
	公表の方法 本市ホームページで公表する
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・処理場管理棟の耐震化を図ったことで、震災時における対応拠点の確保及び機器の監視設備機能の維持が可能となった ・マンホールトイレ整備について、詳細設計を実施した
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
<ul style="list-style-type: none"> ・施設の改築更新に合わせた耐震化を進める ・下水道総合地震対策計画に基づくマンホールトイレの整備を推進する 	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	耐震対策達成率	
	最終目標値	75%
	最終実績値	100%
2	マンホールトイレの設置率	
	最終目標値	10%
	最終実績値	0%

参考図面 (防災・安全交付金)

計画の名称	東広島市公共下水道 (防災・安全) (重点計画)		交付対象	東広島市
計画の期間	平成30年度 ~ 平成31年度 (2年間)			

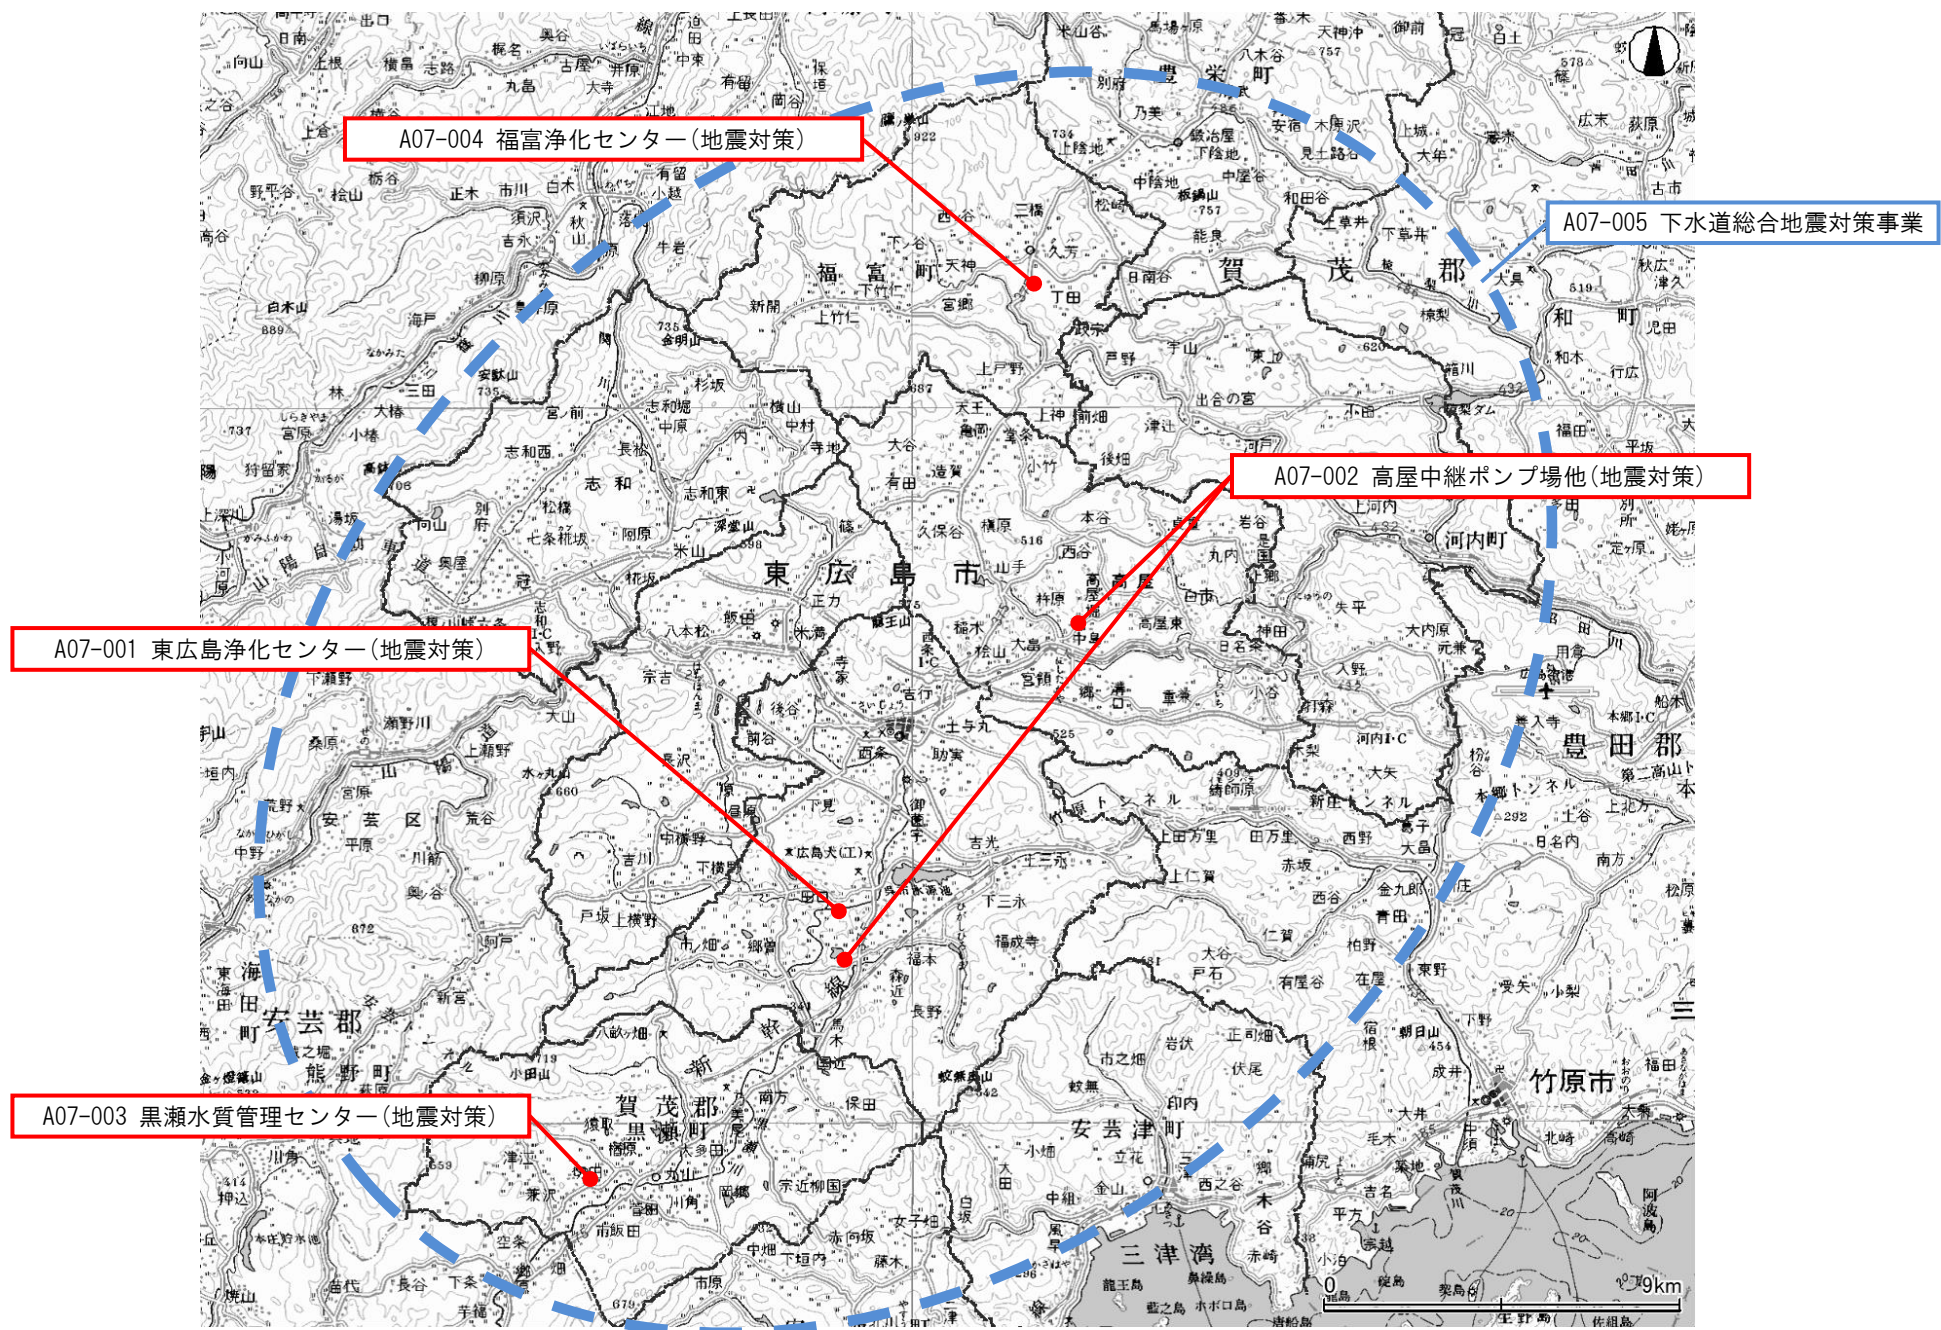

本事業は、すべて事業計画区域内において実施する。
