

東広島市公共下水道  
(事後評価)

東 広 島 市

令和 4 年 8 月 1 日

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年08月01日

計画の名称	東広島市公共下水道											
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	東広島市											
計画の目標	本市では、清潔で快適な居住環境の維持・向上を図り、海域や河川、湖沼等の公共用水域の水質保全・向上を図るため、全国平均と比較し遅れている公共下水道の整備を早急に進めていきます。											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	1,900	A	1,900	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	公共下水道(広義)により汚水を排除することができる区域の面積を2,040ha(予定)から2,150haに増加する。			
	公共下水道整備済み面積	2040ha	2150ha	2150ha
	公共下水道供用面積または整備が完了し供用を予定している面積			
2	良好な水環境創出のために必要な処理場施設増設の整備率を0%(H27当初)から67%(H31末)に増加させる。			
	処理場施設増設の整備率	0%	0%	67%
	整備が完了した施設数(施設) / 増設が必要な施設数(施設)			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	東広島市	直接	東広島市	-	-	東広島市東広島処理区(未普及対策)	75~800 L=8km	東広島市						921	-	
	A07-002	下水道	一般	東広島市	直接	東広島市	-	-	東広島浄化センター(水質保全)	水処理施設 一式	東広島市							82	-
	A07-003	下水道	一般	東広島市	直接	東広島市	-	-	東広島市黒瀬処理区(未普及対策)	75~800 L=5km	東広島市							310	-
	A07-004	下水道	一般	東広島市	直接	東広島市	-	-	東広島市安芸津処理区(未普及対策)	75~450 L=2km	東広島市							183	-
	A07-005	下水道	一般	東広島市	直接	東広島市	-	-	福富浄化センター(資源循環形成)	汚泥処理設備 一式	東広島市							87	-
	A07-006	下水道	一般	東広島市	直接	東広島市	-	-	豊栄浄化センター(資源循環形成)	汚泥処理設備 一式	東広島市							67	-




事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 東広島市において実施する	事後評価の実施時期 令和4年8月
	公表の方法 本市ホームページで公表する
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公共下水道の整備に伴い水洗化人口も増加することから、公共用水域の水質保全及び生活環境の向上に寄与している</li> <li>・良質な水環境創出のために必要な処理場施設の増設について、段階的整備を進めている</li> </ul>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・東広島市未普及解消整備計画に基づき、効率的な下水道整備を推進する</li> <li>・処理場施設の増設について、排水量の増加を踏まえた段階的整備を進める</li> </ul>	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	公共下水道整備済み面積	
	最終目標値	2150ha
	最終実績値	2199ha
2	処理場施設増設の整備率	
	最終目標値	67%
	最終実績値	67%

参考図面（社会資本整備総合交付金）

計画の名称	東広島市公共下水道		
計画の期間	平成27年度 ～ 平成31年度（5年間）	交付対象	東広島市

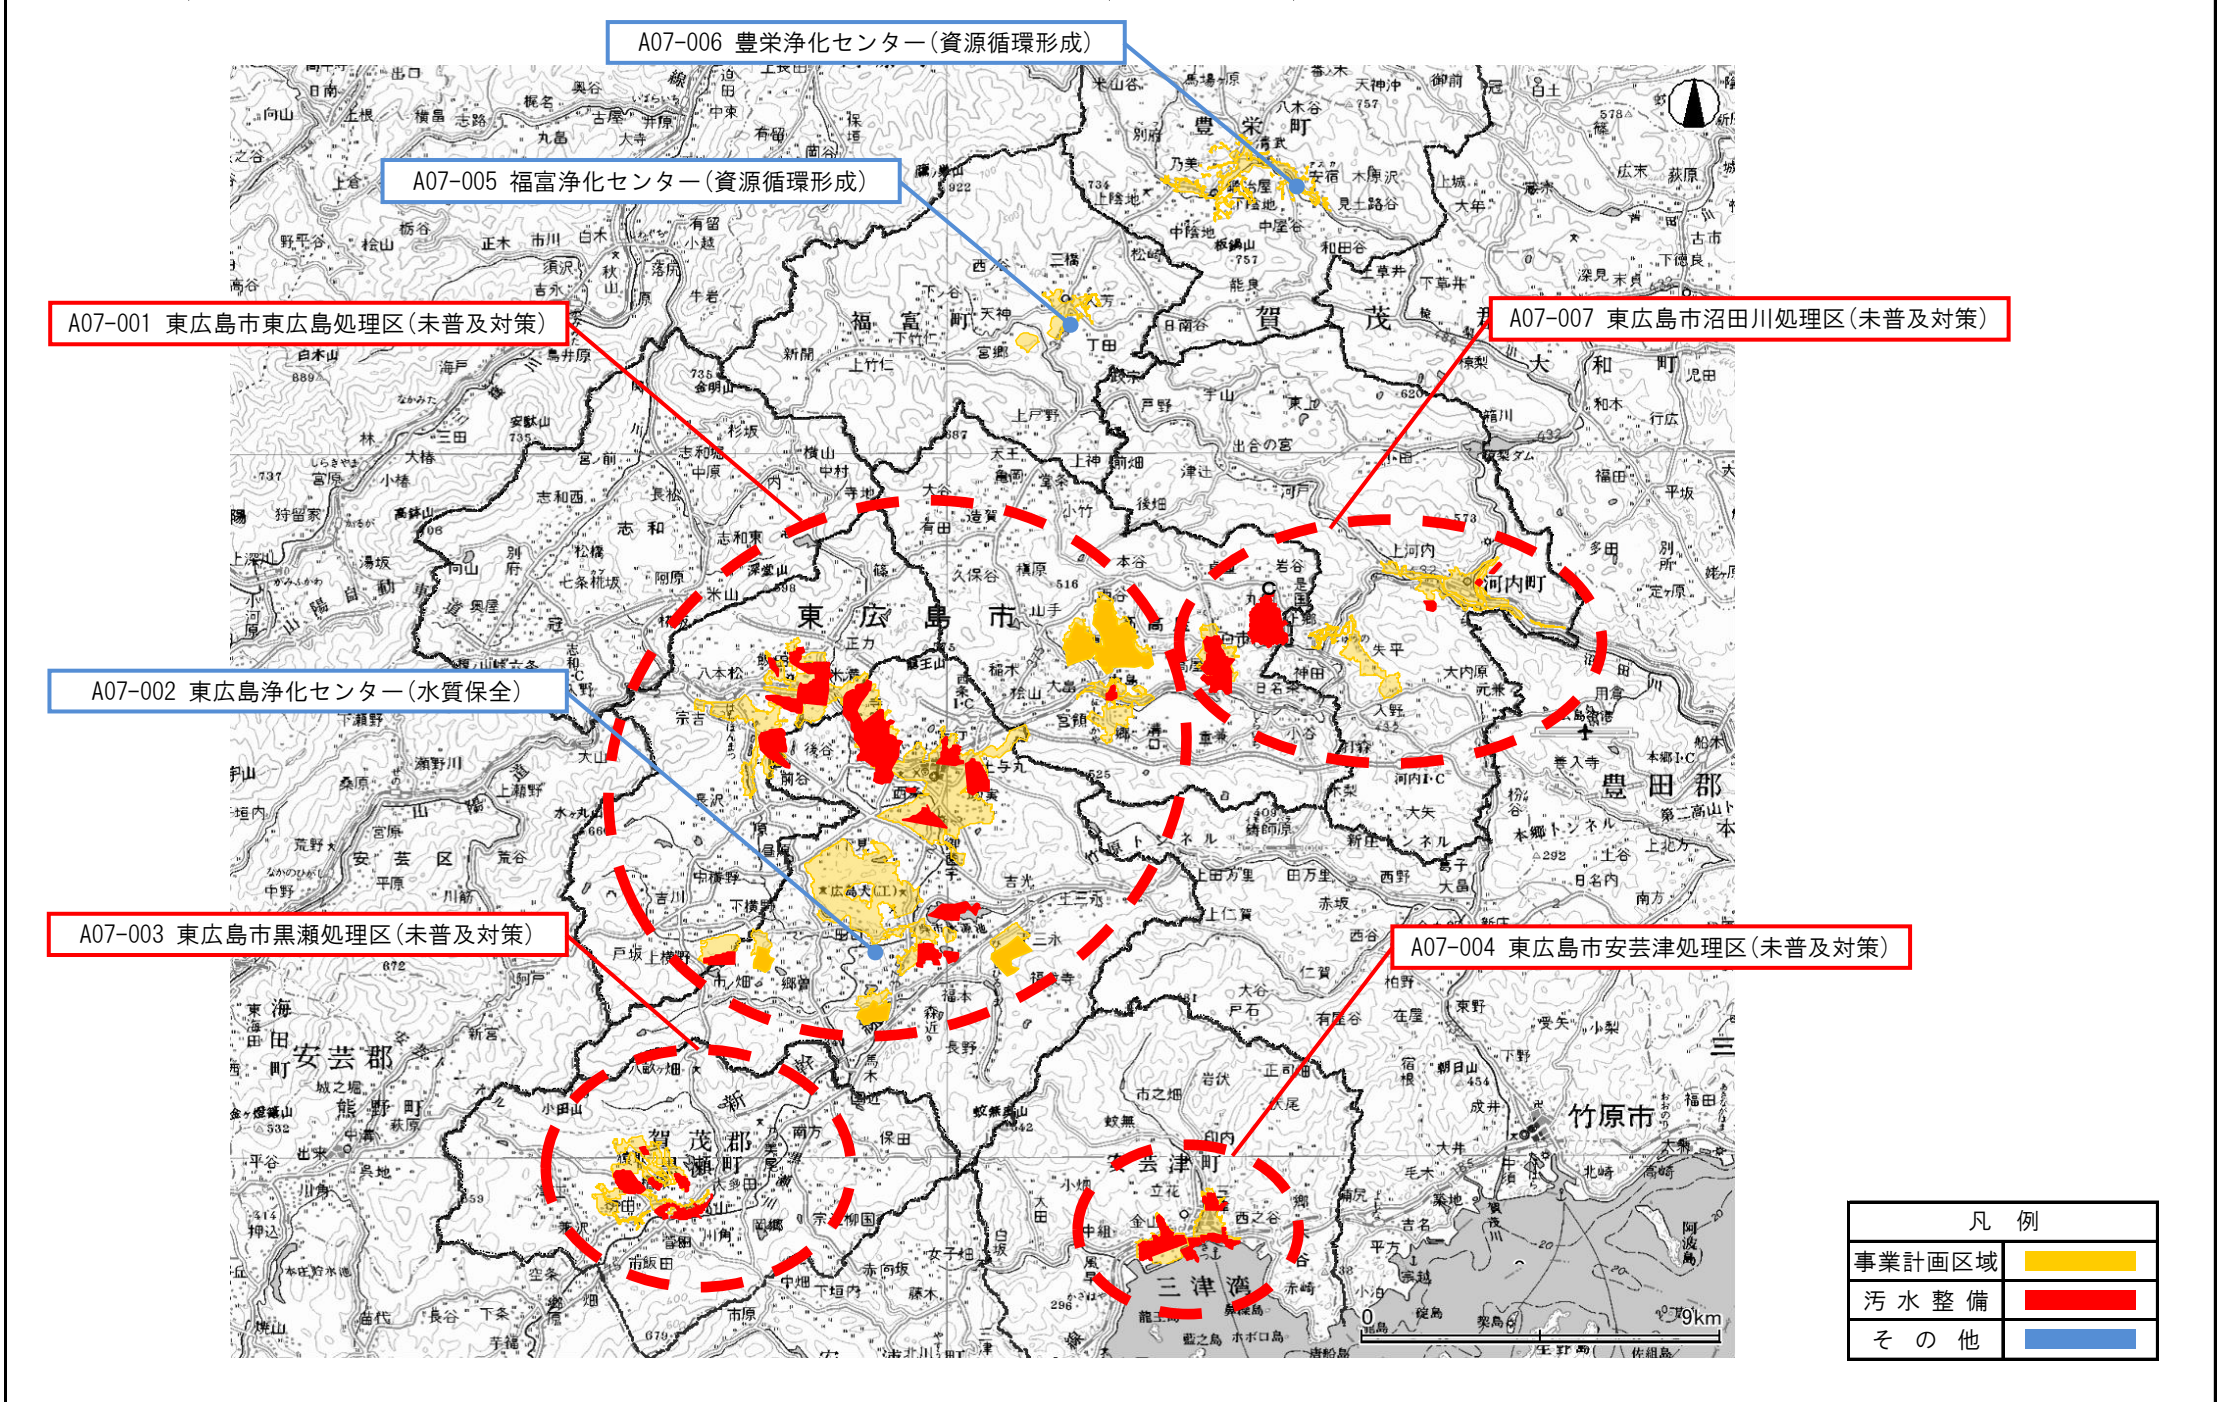

凡例	
事業計画区域	黄色
汚水整備	赤色
その他	青色

本事業は、すべて事業計画区域内において実施する。
