令和8年度

生活市道整備事業

道面郷線道路改良工事

仕様書

施　工　場　所　　東広島市河内町入野

東広島市

道面郷線道路改良工事

位置図

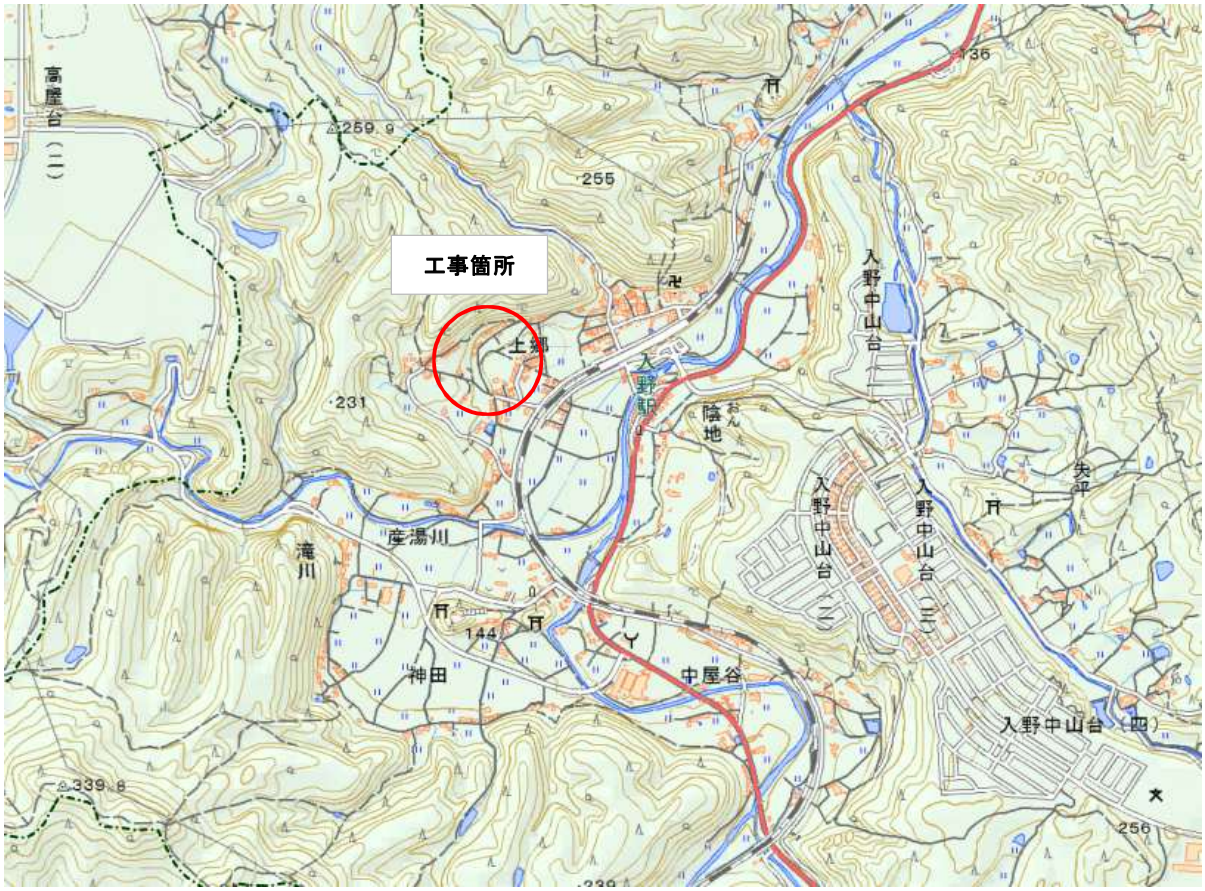

拡大図

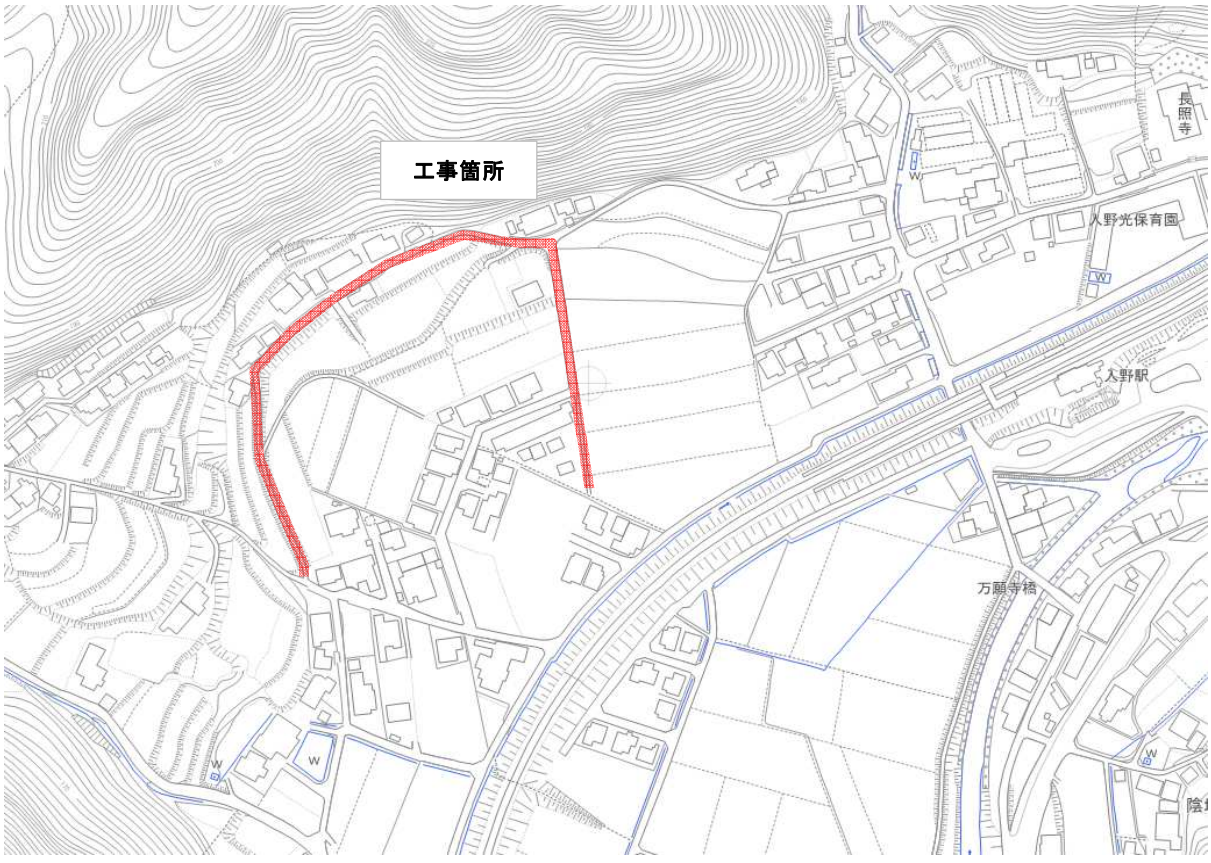

特　記　仕　様　書

（令和8年度　生活市道整備事業　道面郷線道路改良工事）

第1章　総則

1. 適用
2. 前払金
3. 債務負担
4. 現場代理人の兼務
5. 現場作業終期日
6. 履行報告
7. 官公庁等への手続き等
8. 工事中情報共有システム（発注者指定型）
9. 熱中症対策に資する現場管理費の補正
10. 遠隔地からの建設資材を調達する場合の積算方法
11. 主任(監理)技術者及び現場代理人の配置について
12. 法定外の労災保険の付保
13. 週休２日適用工事等　週休２日
14. 建設副産物の取り扱いについて
15. 猛暑時間の施工回避
16. 猛暑日等を考慮した工期延長について
17. 熱中症による健康障害発生時の対応計画

第2章　工事材料

1. 見本・品質証明資料
2. 品質規格証明資料等
3. 六価クロム溶出試験(及びタンクリーチング試験)
4. 溶融スラグを利用した資材の使用
5. 路床安定処理

第3章　施工条件

1. 工程
   (1) 施工時期・時間の制限
   (2) 地下埋設物・埋蔵文化財の事前調査
2. 安全対策
   (1) 交通誘導警備員・警戒船・保安要員
   (2) 架空線の防護管に要する費用について
3. 盛土・埋戻土
   (1) 流用土(工事内流用)
   (2) 購入土(搬入)(建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土)
4. 建設副産物
   (1) 建設発生土（建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地への搬出)
   (2) コンクリート殻（無筋）(搬出)
   (3) アスファルト殻(搬出)
5. 工事支障物件
   (1) 地下・地上障害物
   (2) 試掘調査
6. その他
   (1) 支給・貸与品

第4章　施工管理
1.　出来形管理
(1) 表層工及び道路面に天端が接する構造物
第5章　その他
1.　工事関係書類
2.　工事写真
3.　疑義の解決等
4.　仮設工
5.　現場内作業（農地）
6.　工事の確認（農地）
7. 工事車両の通行について
8. 隣接地権者との協議

特　記　仕　様　書

第1章　総則

1.　適用

本工事の施工にあたっては、「土木工事共通仕様書（令和８年８月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）」及び東広島市制定の第15編下水道編(最新版)に基づいて実施しなければならない。

この場合においては、次のとおりとする。

(1)　「広島県」とあるのは「東広島市」と読み替える。(ただし、第1編第1章第1節1-1-1-27第10項、第1編第1章第2節1-1-2-1第3項、1-1-2-8第1項、1-1-2-9第1項、1-1-2-10第1項、1-1-2-11第1項、第6項、第8項、1-1-2-14第2項、1-1-2-16第1項、第3項、第2編第1章第3節2-1-3-1、第3編第1章第2節3-1-2-3第2項においては読み替えない。)

(2)　「建設工事請負契約約款」とあるのは「東広島市の建設工事請負契約約款」と読み替える。

(3)　「土木工事監督規程」とあるのは「東広島市建設工事監督事務取扱要綱」と読み替える。

(4)　「土木工事検査規程」とあるのは「東広島市建設工事検査規程」と読み替える。

(5)　「建設工事執行規則第19条の1」とあるのは「東広島市建設工事執行規則第19条第1項」と、「建設工事執行規則第41条の2」とあるのは「東広島市建設工事執行規則第41条第2項」と読み替える。

(6)　「広島県契約規則第2条の1」とあるのは「東広島市契約規則第2条第1項」と読み替える。

(7)　「土木工事検査技術基準」とあるのは「東広島市の「土木工事検査技術基準」」と読み替える。

(8)　「低入札価格調査制度事務取扱要綱」とあるのは「東広島市低入札価格調査制度事務取扱要領」と読み替える。

(9)　「広島県の建設工事入札参加資格」とあるのは「東広島市の競争入札参加資格」と読み替える。

(10) 広島県の「建設業者等指名除外要綱」とあるのは東広島市の「建設業者等指名除外基準要綱」と「建設業者等指名除外要綱別表第18号」とあるのは東広島市の「建設業者等指名除外基準要綱別表第22号」と読み替える。

(11)　「建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱」とあるのは「東広島市低入札価格調査制度事務取扱要領」と、「建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱第10条」とあるのは「東広島市低入札価格調査制度事務取扱要領第11条」と読み替える。

(12)　「県発注工事等における暴力団排除のための契約制限要綱」とあるのは「東広島市建設工事暴力団等排除要綱」と読み替える。

(13) その他

編	章	節	条	見　出　し	項	特記及び追加仕様事項
1	1	2	5	工事の下請負	3から6まで	適用しない。
1	1	2	14	施工管理	1	適用しない。
1	1	2	16	環境対策	4	適用しない。
1	1	3	3	現場代理人及び主任技術者又は監理技術者	5から6まで	適用しない。
1	1	3	4	下請負及び契約の制限	1(2)	適用しない。
1	1	3	5	主要資材の購入		適用しない。
1	1	3	7	契約後VE工事		適用しない。
1	1	3	9	県産材の活用	(2)	適用しない。
1	1	3	10	工事現場の現場環境改善等		適用しない。
1	1	3	11	現場環境改善（ウィークリースタンス）の実施	(4)[2]から[7]まで	適用しない。
3	1	1	1	請負代金内訳書		適用しない。
3	1	1	2	工程表		適用しない。
3	1	1	7	工事完成図書の納品	2から6まで	適用しない。
3	1	1	8	技術検査	3から5まで	適用しない。
3	1	2	1	請負代金内訳書		適用しない。
3	1	2	2	工程表		適用しない。
3	1	2	5	工事完成図書の納品		適用しない。
3	1	2	6	提出書類	2	適用しない。
3	1	3	1	工事完成図書の納品		適用しない。
3	1	3	2	技術検査	2	適用しない。

2.　前払金

契約金額が50万円以上の建設工事の場合は前払金を請求することができる。前払金は請負代金の40%以内とする。また、契約に当たって契約約款特約事項第22項により中間前払金を選択するものにあっては、中間前払金は請負代金の20%以内とする。その他、前金払・中間前金払の適用は次の要領による。

・建設工事請負代金前金払実施要領
・建設工事請負代金中間前金払実施要領
・東広島市余裕期間制度適用工事に係る事務取扱要領

3. 債務負担

各会計年度における請負代金の支払い限度額は次のとおりとする。

令和8年度　90,000,000円
令和9年度　残額

出来高予定額

令和8年度　54,000,000円
令和9年度　残額

発注者は、予算の都合その他の必要があるときは、支払い限度額及び出来高予定額を変更することができる。

支払い方法について、次のとおりとする。

前金払い　　請求可

契約会計年度において契約会計年度及び翌会計年度の出来高予定額の40%を請求できるものとする。なお、余裕期間制度適用工事においては「契約会計年度」を「工期の始期の属する年度」とする。

中間前金払・部分払い

契約約款特約事項22項により、契約締結時にいずれかを選択するものとする。ただし、中間前金払いを選択した場合においても、契約会計年度は、出来高予定額に係る当該年度末の出来高に対する部分払いを請求できるものとする。

4. 現場代理人の兼務

1　現場代理人の兼務については、「技術者等の適正配置について」によるものとする。

2　発注者は、受注者からの申請に基づき、兼務する各工事の内容、工程等を勘案し、現場代理人の兼務について承認の適否を決定し、承認する場合は現場代理人兼務承認書により、承認しない場合は現場代理人兼務非承認書に承認しない理由を記載の上、速やかに受注者に通知する。

3　発注者は現場代理人の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、現場代理人兼務承認取消書により、その承認を取消すものとする。

⑴ 兼務を予定する工事の発注者が兼務を承認しないことが明らかになったとき
⑵ 兼務を承認した日から起算して14日(東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第6号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。)を経過した後においても、兼務先の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しが提出されないとき
⑶ 兼務申請において、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明したとき
⑷ 兼務の承認後、重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠ったことが判明したとき
⑸ 著しい状況の変化により、兼務を承認することが適当でなくなったとき
⑹ その他、発注者が兼務を承認することが適当でなくなったとき

4　重要な事項について虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務の承認後に重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠った者に対しては、請負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を行うことがある。

※ 同一町内における町とは西条町、八本松町、志和町又は高屋町にあっては昭和49年4月20日前の町の区域とし、黒瀬町、福富町、豊栄町、河内町又は安芸津町にあっては平成17年2月7日前の町の区域とする。

5.　現場作業終期日

本工事の施工に当たっては、工期末の30日前までに、下記の作業を終了しなければならない。

・直積工事費に係る現場作業

なお、現場作業終期日までに適時、速やかに「土木工事共通仕様書（令和８年８月）広島版」第1編1-1-1-24第2項第3号に記載してある出来高が確認できる資料を監督職員に提出しなければならない。

6.　履行報告

履行報告の提出にあたっては、実施工程表と平面図（施工済み箇所を着色）又は、進捗状況が確認できる写真を添付すること。なお、月締め報告とし、翌月７日までに提出すること。

7.　官公庁等への手続き等

受注者は、関係官公庁及びその他の関係機関との諸手続きにおいて許可、承諾等を得た場合はその書面(写し)を提出するものとし、更新手続き(許可内容が同じもの)の場合は、届出等の鑑のみとする。

8.　工事中情報共有システム（発注者指定型）

（１）本工事は、工事中情報共有システムの対象（発注者指定型）である。

（２）工事中情報共有システムを利用するにあたり、発注者に連絡の上、利用申込すること。

（３）本工事で使用する情報共有システムは次のとおり。

広島県工事中情報共有システム（一般社団法人　広島県土木協会）

http://www.hdobokuk.or.jp/koujijyouhoushisutemu2.html

（４）工事中情報共有システム利用に必要な費用は設計金額に含まれている。

（５）利用にあたっては「東広島市発注工事における広島県工事中情報共有システム利用実施要領」に基づくこと。

（６）運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」に基づくこと。

この場合においては、次のとおりとする。

１）「1.3.適用する基準」のうち、「土木工事監督規程（広島県）」および「土木工事監督実施要領（広島県）」は「東広島市建設工事監督事務取扱要綱」と、「土木工事検査規程（広島県）」とあるのは「東広島市建設工事検査規程」と、「土木工事検査技術基準（広島県）」とあるのは「土木工事検査技術基準（東広島市）」と読み替えるものとする。

２）「CAD製図基準（国土交通省）」および「CAD製図基準に関する運用ガイドライン（国土交通省）」は適用しない。

３）「4.検査」は適用しない。

４）検査は、発注者と協議のうえ、紙媒体による検査と電子検査の併用とすることができるものとする。

５）受注者は、工事中情報共有システムにより処理した工事完成図について、電子成果品として納品するほか、紙の成果品も納品すること。

9.　熱中症対策に資する現場管理費の補正

（１）　本工事は、工事現場の熱中症対策に資する経費に関して、現場管理費の補正を行う工事である。

（２）　工期(工事の始期日から工事の終期日までの期間で、準備期間、施工に必要な実日数、不稼働日、後片付け期間の合計をいう。なお、検査期間13日、年末年始6日間（12月29日～1月3日）、夏季休暇3日間（国民の祝日である山の日の次の日から土曜日、日曜日、振替休日を除く3日間とする。）、工場制作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。）期間中の真夏日の状況に応じて、変更契約時に現場管理費の補正を行うものとする。

（３）　真夏日とは、日最高気温が30度以上の日をいう。また、日最高暑さ指数（WBGT）が25度以上の日をいう。

ただし、夜間工事のみの場合は、作業時間帯の最高気温または最高暑さ指数　(WBGT) を対象とする。

（４）　気温の計測箇所及び結果は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温または環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）を用いることを標準とする。

（５）　受注者は、工事期間中における気温の計測箇所、用いる計測値及び計測期間（計測開始日、計測終了予定日）を明記した施工計画書を工事着手前に提出し、計測結果を工事完成時までに監督職員に提出すること。

（６） 受注者は、計測終了日について、工事完成時までに監督職員と協議するものとする。
（７） 積算方法は次のとおりとする。
１）補正方法
ア 受注者より提出された計測結果の資料を基に、補正値を算出し現場管理費率に加算する。なお、現場管理費率の補正は「積雪寒冷地域で施工時期が冬期となる場合の補正」、「緊急工事の場合」及び本補正値を合計し、2%を上限とする。
イ 真夏日率＝工期期間中の真夏日÷工期
ウ 補正値（%）＝真夏日率×1.2
２）補正値の計算結果は、パーセント表示で小数点3位を四捨五入して2位止めとする。
（８） 受注者より、熱中症対策に資する現場管理費の補正が不要である旨の協議があった場合は、補正を行う工事から対象外とすることができる。
（９） 検査職員から修補の指示があった場合、修補期間は対象外とする。

10. 遠隔地からの建設資材を調達する場合の積算方法

建設資材及び仮設材については、調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達をせざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票の写し等）を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。

「調達地域等」とは、建設資材にあっては、広島県土木工事設計資材単価表及び広島県農林土木用資材単価表で示す地区、又は地区の指定がない場合は広島県内を言い、仮設材にあっては、土木工事標準積算基準書（広島県）第X編 参考資料 第2章 工事費の積算 1)間接工事費 1)-1共通仮設費 1 運搬費 (4)リース器材 の運搬で示す仮設材が所在すると推定される場所又は大手リース業者基地等をいう。

11. 主任(監理)技術者及び現場代理人の配置について

東広島市発注工事における主任(監理)技術者及び現場代理人の配置についての取り扱いは、「技術者等の適正配置について」によるものとする。

12. 法定外の労災保険の付保

１ 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
２ 受注者は、建設工事請負契約約款第４７条に基づき、法定外の労災保険の契約締結をしたときは、その証券又はこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。
３ 法定外の労災保険は、政府の労働者災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）全国建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、契約を締結しているものとする。

13. 週休２日適用工事等 週休２日

本工事は、週休２日適用工事（発注者指定型）であり、「東広島市週休２日適用工事等実施要領（最新版）」に従うこと。

なお、実施要領に基づき提出する必要のある様式「休日取得計画表」は「検査課HP＞施工関連資料＞週休２日適用工事等の実施について」に掲載している。

14. 建設副産物の取り扱いについて

本工事における建設副産物の取扱いについては、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

１ 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画（５の確認結果票を含む）を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。

2　計画の掲示及び公表

受注者は、１の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

3　実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から５年間保存しなければならない。

4　工事現場の管理体制

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

5　建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。

※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

なお、対象となる工事は請負代金額が100万円以上、または建設発生土の搬出が500m3以上の工事を対象とする。

(1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第３条第７項又は第４条第１項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

(2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項

(1) 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第１項、第16条第１項、第30条第１項又は第35条第１項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。

(2) 当該行為が盛土規制法第21条第１項、第27条第１項、第28条第１項又は第40条第１項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

(3) 上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項

6　運搬業者への通知

受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。

7　確認結果票の掲示及び公表

受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

8　確認結果票の保管

受注者は、確認結果票を建設工事の完成後５年間保存するものとする。

9　建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。

(1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地

(2) 建設発生土の搬出先の受注者の商号、名称又は氏名

(3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地

(4) 建設発生土の搬出量

(5) 建設発生土の搬出が完了した日

10　建設発生土の搬入元への受領書の交付

受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。

11　受領書の内容確認

受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。

12　受領書の保管

受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後５年間保存するものとする。

13　建設発生土の最終搬出先までの確認

受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先（次の(1)から(4)のいずれかに該当する搬出先を除く。）から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する９（1）～（5）に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後５年間保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。

(1) 国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合
(2) 受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合
(3) ストックヤード運営事業者登録規定により国に登録されたストックヤード
(4) ９の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地（再搬出しないもの）

15.　猛暑時間の施工回避

１　本工事は、現場環境に応じて猛暑時間帯の現場作業を回避し、作業の開始時間や終了時間を発注者と協議し設定できる工事である。

２　実施方法は次のとおりとする。

(1)　内容

ア　受注者は、現場環境に応じて猛暑時間帯の現場作業を回避し、作業の開始時間や終了時間を監督職員と協議し設定できる。

イ　作業時間を短縮した場合は、短縮時間に応じて、工期を延長することができるものとする。

ウ　工事における現地の立会等については、監督職員の勤務時間に合わせるものとする。

エ　対象期間は、６月１日から９月３０日までとする。

(2)　工期延長日数の算出方法

工期の延長日数※1(日)＝短縮時間(時間)×対象期間※2(日)÷８(時間)

なお、猛暑日等による作業不能日とは、別に考慮できるものとする。

※１　小数第１位を切り上げるものとする。

※２　現場閉所日を含む。

３　作業時間の変更に伴う工事費の増額については、設計変更の対象としない。

16.　猛暑日等を考慮した工期延長について

１　本工事は、工期に「猛暑日等による作業不能日」として、休日(土日、祝日、年末年始休暇及び夏期休暇)、降雨降雪日及び猛暑日日数を72日見込んでいる。

「猛暑日等による作業不能日」＝施工に必要な実日数×雨休率

雨休率(休日、降雨降雪日及び猛暑日日数による作業不能日を見込むための係数)：　0.78

雨休率に見込んでいる作業不能日は、次のとおりである。(過去５年間の気象庁及び環境省のデータより年間の平均発生日数を算出)

(1)　１日の降雨・降雪量が10㎜/日以上の日：　31日/年

(2)　８時から１７時までのWBGT値が31以上の時間を足し合わせた日数：　5日/年

２　・著しい悪天候や気象状況より「猛暑日等による作業不能日」が当初見込んでいる日数と著しく乖離し、かつ作業を休止せざるを得なかった場合には、受注者は監督職員へ工期の延長変更を協議することができる。

・受注者は、協議の際に気象庁及び環境省の計測データ等を監督職員へ提出すること。計測データは、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所及び環境省が公表している観測地点を用いることを標準とする。

なお、提出する必要のある様式「猛暑日等による作業不能日算出表」は「広島県の調達

情報HP＞公共工事等の情報_様式集＞建設工事関係_その他契約関係様式」に掲載している。

・費用は、工期延長日数に応じて「工事における工期の延長等に伴う増加費用の積算」（土木工事標準積算基準書(共通編)第Ⅰ編総則 第９章)に基づき増加費用を積算し、変更契約において計上する。

17.　熱中症による健康障害発生時の対応計画

1　猛暑による厳しい環境下での現場作業※が見込まれる工事を対象とする。

※WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で、連続１時間以上又は１日４時間を超える作業

2　受注者は、熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断ができるよう、「緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先や所在地」及び「作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等の熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順」などを施工計画書の「緊急時の体制及び対応」項目に記載するとともに、工事関係者へ周知すること。

第2章　工事材料

1.　見本・品質証明資料

受注者は、次に示す材料又は監督職員が指示する材料について、見本又は品質を証明する資料を、材料を使用するまでに監督職員に提出するものとする。また、材料の購入は監督職員の確認を受けた後に行うものとする。

区　分	材　料　名	摘　要
鋼材	異形棒鋼	
プレキャスト製品	セメントコンクリート製品一般	ＪＩＳ製品以外
その他	レディーミクストコンクリート	
	アスファルト混合物	事前審査制度の認定混合物を除く

2.　品質規格証明資料等

受注者は、工事に使用した次に示す材料又は監督職員が指示する材料の品質を証明する試験成績表、性能試験結果、ミルシート等の品質規格証明書を監督職員に提出するものとする。

区　分	材　料　名	摘　要
鋼材	異形棒鋼	
プレキャスト製品	セメントコンクリート製品一般	ＪＩＳ製品以外
	コンクリートブロック	ＪＩＳ製品以外
その他	レディーミクストコンクリート	
	アスファルト混合物	事前審査制度の認定混合物を除く

3.　六価クロム溶出試験(及びタンクリーチング試験)

本工事は「六価クロム溶出試験(及びタンクリーチング試験)」の対象工事であり、次の工種について、六価クロム溶出試験(及びタンクリーチング試験)を実施し、試験結果(計量証明書)を提出するものとする。なお、試験方法は、セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)によるものとする。また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

・六価クロム溶出試験対象工種名及び検体数

路床安定処理工：　　配合設計段階　1検体

4.　溶融スラグを利用した資材の使用

1.　溶融スラグを利用した資材の使用

再生加熱アスファルト混合物、プレキャストコンクリート製品、再生路盤材及び埋戻材等については、広島中央環境衛生組合が製造する溶融スラグ（以下「溶融スラグ」という。）を利用した資材を使用するよう努めるものとする。溶融スラグ利用及び使用する資材にあたっては「溶融スラグの有効利用促進等に関する方針」「溶融スラグ有効利用ガイドライン【品質編】、【運用編】」に準拠するものとする。なお、これにより難い場合は、監督職員と協議すること。

2.　品質管理及び確認

1.で示したもののほか、溶融スラグを利用した資材の使用における品質の管理及び確認は、広島版「土木工事共通仕様書(令和８年８月)」及び広島版「施工管理基準(令和８年８月)」による

ものとする。ただし、書類により品質が確保できる項目においても、監督職員が必要と認めるものは現場検収を実施できるものとする。

3. 再生加熱アスファルト混合物への使用

溶融スラグを再生加熱アスファルト混合物に使用する場合、広島版「土木工事共通仕様書（令和８年８月）」の「1-1-2-16　環境対策」に示す登録リサイクル製品の使用は適用しないものとする。

4. 適合規格

溶融スラグの適合規格については、広島版「土木工事共通仕様書(令和８年８月)」に記載の適合規格（「2-2-3-1 一般事項　1.」）ではなく、「JIS A 5031　一般廃棄物，下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したコンクリート用溶融スラグ骨材」を適用するものとする。

5. 路床安定処理

路床安定処理工は、セメント系固化材配合量を5.2t/100m2を見込んでいる。路床安定処理工に際し、試料を採取し、配合試験を行い報告すること。また、配合試験により配合量が変更となる場合には、請負代金額の変更対象とする。

第3章　施工条件

1. 工程

(1) 施工時期・時間の制限

施工内容　　S路線（排水構造物工、擁壁工）
時期　　農繁期（3月中旬）まで
施工方法・理由　地元協議により、構造物設置については当該箇所から行うこと。

(2) 地下埋設物・埋蔵文化財の事前調査

調査項目　　地下埋設物　（上水道等）
調査時期　　必要により工事施工前に試堀を行うこと。（支障物件が発見された場合は、監督職員と協議することとし、設計変更の対象とする。）

2. 安全対策

(1) 交通誘導警備員・警戒船・保安要員

交通誘導警備員　・交通誘導警備員の配置人数は、工事着手後、規制を要する日から6人を見込んでいる。ただし、現場条件の変更等により、交通誘導警備員の人数変更が必要となった場合には、事前に監督職員と協議を行った上で変更対象とする。

工　種	配置場所	配置人数	施工時間	備　考
舗装工	―	2人	―	

(2) 架空線の防護管に要する費用について

工事区域上空の架空線の防護管に要する費用については、現在見込んでいない。

架空線に近接した工事の施工に当たって、架空線管理者又は防護管施工会社（以下、「架空線管理者等」という）との協議により、架空線管理者等から防護管に要する費用負担を求められた場合、工事打合せ簿により監督職員と協議し、設計変更の対象とする。

設計変更の対象として認められる場合は、架空線管理者等からの見積書を提出すること。

3. 盛土・埋戻土

(1) 流用土(工事内流用)

本工事の施工により発生する土のうち、　1,342m3(地山土量)　については当該工事の施工に流用するものと見込んでいる。

(2) 購入土(搬入)(建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土)

本工事では、　437m3(ほぐし)　の土砂購入を見込んでいる。

① 当該工事に使用する購入土は、建設発生土処分先一覧表に掲載された建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土（改良土を含む。）を使用するものとする。積算にあたっては、運搬費と処理土購入費(工場渡し)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き購入土に要する費用(単価)は変更しない。

② ①により使用することとしている処理土について、何らかの事情によりその使用が困難である場合は、設計図書の内容について監督職員と協議すること。

③ 使用する処理土がセメント及びセメント系固化材を使用した改良土の場合、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)」に基づき、建設発生土リサイクルプラントから試験結果の提示を受けるとともに、施工後に六価クロム溶出試験を実施し、試験結果(計量証明書)を提出するものとする。

4. 建設副産物

(1) 建設発生土（建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地への搬出）

当該工事により発生する建設発生土は、広島県制定の建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地に搬出するものとする。

また、積算上の搬出先として、建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地のうち、運搬費と受入費の合計が最も経済的になる次の施設を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、広島県制定の建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議の上、設計変更の対象とする。

ただし、災害復旧工事において、市が公募により決定した「災害発生土民間受入先」と受入について土質や搬出スケジュール等の協議が整えば、搬出先を「災害発生土民間受入先」に変更する場合がある。

当該工事で見込んでいる再資源化施設、運搬距離

粘性土

（名称）　株式会社大地リサイクルセンター第9残土処分場

（所在地）　東広島市河内町入野字大内原987-1

（運搬距離）　5.8ｋｍ

(2) コンクリート殻（無筋）(搬出)

当該工事により発生するコンクリート殻（無筋）は、広島県制定の再資源化施設一覧表に掲載されている施設に搬出するものとする。

搬出先として、運搬費と受入費(平日の受入費用)の合計が最も経済的になる再資源化施設を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き処分に要する費用(単価)は変更しない。

また、運搬距離は　14.1ｋｍ　を見込んでいる。

(3) アスファルト殻(搬出)

当該工事により発生するアスファルト殻は、広島県制定の再資源化施設一覧表に掲載されている施設に搬出するものとする。

搬出先として、運搬費と受入費(平日の受入費用)の合計が最も経済的になる再資源化施設を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き処分に要する費用(単価)は変更しない。

また、運搬距離は　3.4ｋｍ　を見込んでいる。

5. 工事支障物件

(1) 地下・地上障害物

支障物件名	水道（配水管,給水管）設備
管理者	広島県水道広域連合企業団
位置	SBP～SEP付近
確認方法	試掘等により詳細確認を実施
工事方法	－
防護方法	－

(2) 試掘調査

1)試掘調査

ア　受注者は、掘削影響範囲内の公益占用物件の埋設位置の確認のため、本工事の施工に先立ち、次のとおり試掘調査を行うものとする。

なお、詳細な掘削箇所及び掘削範囲については、監督職員と協議のうえ、決定するものとし、契約変更の対象とする。

イ　試掘調査は、原則人力施工とし、発生土等の運搬車積込み作業は、機械施工とする。

ウ　埋設位置、深さ等を確認するため、監督職員を経由して、公益占用物件所有者等に立会を求めるものとする。

2)調査計画書（試掘調査を含む。）

受注者は、事前に監督職員から提供のあった公益占用物件台帳等を基に、事前調査を実施し、公益占用物件の実態を把握するとともに、試掘調査の必要性を含め、監督職員と協議のうえ、掘削箇所及び調査方法等（安全管理等を含む。）を記載した試掘調査計画書を提出するものとする。

3)試掘調査報告書

受注者は、試掘調査実施後に埋設位置、深さ等を報告するものとし、公益占用物件に防護対策等の安全処置が必要となるときは、監督職員及び公益占用物件所有者等と協議し、その対策及び維持管理方法についても記載するものとする。

6. その他

(1) 支給・貸与品

次のとおり支給品を使用すること。

品名、数量　　1)重圧管φ300　：24m
　　2)グレーチング桝蓋　500×500　：3組
　　3)グレーチング桝蓋　600×600　：1組

引渡し場所　　高屋町白市

第4章　施工管理

1. 出来形管理

(1) 表層工及び道路面に天端が接する構造物

本工事において、路面に天端が接する構造物の出来高管理は下記のとおり行うこと。

なお、下記以外の項目については、広島県制定「土木工事施工管理基準(令和８年８月)」に基づいて実施しなければならない。

工　種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘　要
表層工	基準高さ▽	±30	40m毎に1箇所の割とし、道路中心線および端部で測定。		
道路面に天端が接する構造物(コンクリートブロック工、コンクリート擁壁工、側溝工等)	基準高さ▽	±30	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。		

第5章　その他

1. 工事関係書類

⑴ 工事関係書類の作成は、東広島市建設工事関係書類作成要領 -土木工事編-によるものとする。

⑵ 工事関係書類の提出は、「契約関係書類」1部、「施工管理書類」は、工事打合せ簿による場合は2部、その他による場合は1部とする。

2. 工事写真

工事写真の撮影に当っては、広島県制定「写真管理基準（令和８年８月）」によるものとし、納品に当っては、電子媒体又は紙媒体、情報共有システム登録のいずれかとする。

なお、電子納品物は「広島県電子納品実施要領」に準拠し、作成すること。

3. 疑義の解決等

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員と協議し決定すること。

4. 仮設工

仮設工（任意）については、事前に設置方法を施工計画書にまとめ、監督職員へ提出すること。

なお、仮設方法については、正当な理由がある場合は、請負代金額の変更対象とする。

5. 現場内作業（農地）

SBP～SNo.2付近の工事施工に当たっては、3月中旬頃から耕作が見込まれているため、耕作開始までに

作業を終了すること。

6.　工事の確認（農地）

当該農地の施工箇所及び仮設箇所、作業ヤード等は、現場作業完了後に地権者等による立会確認を行うこと。また、確認結果を監督職員に提出すること。

7. 工事車両の通行について

SIP.1西側の道路については工事車両の通行を行わないこと。

8. 隣接地権者との協議

隣接する民有地への進入路等の施工にあたっては、施工前に丁張等を設置の上、地権者等による立会確認を行ってからとすること。

特記仕様書（中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について）

１　本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材（以下、「調達検討資材」という）の調達に必要となる経費（以下、「別途調達経費」という）について、設計変更により計上できる工事である。

２　調達検討資材

ナフサを由来とする主要な建設資材の一覧

資材カテゴリ	主成分・性質
ジオテキスタイル	ＰＰ、ＰＥＴ
防草シート	ＰＰ、ＰＥＴ
排水材・フィルター	ＰＰ、ＰＥＴ
パイプ・配線管	塩ビ、ＰＥ、ＰＰ
ケーブル・配線管	塩ビ、ＰＥ
接着剤	ポリウレタン、エポキシ樹脂
塗料・シンナー	トルエン・キシレン等
止水材・シーリング材	ポリウレタン、アクリル
防水シート（トンネル）	塩ビ、合成ゴム
コンクリート混和材	ポリカルボン酸エーテル
仮設資材（ブルーシート、土のう）	ＰＥ、ＰＰ、ＰＶＣ
断熱材	ポリウレタン、ポリスチレン

※代表的なナフサ由来の資材の一例であり、この一覧にない場合でも協議することができる。
ただし、ナフサ由来の資材であることを確認すること。

３　内容

（１）　受注者は、調達検討資材について、別途調達経費が必要となる場合には、事前に「(様式１) 調達検討資材に関する協議書」を提出し、監督職員と協議するものとする。ただし、調達検討資材を直ちに購入契約する必要がある等、迅速な対応が求められる場合には、口頭、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。

なお、別途調達経費が必要となる場合とは、次のとおり想定している。

①　調達検討資材の代替資材を調達した場合
（例：塩化ビニル管を鉄管やコンクリート管に変更して施工する場合）

②　調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合
（例：通常より遠方から調達する必要があり、運搬費が追加で必要な場合）

③　調達検討資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む）
（例：通常より調達ロットを小さくせざるを得なくなり、単価が高くなる場合）

（２）　受注者は、設計変更に際し、「(様式２）調達検討資材に関する実施報告書」及び実際の取引伝票、請求書等（調達時期、購入数量、購入単価が記載された資料）を監督職員に提出すること。

（３）　妥当性が確認された別途調達経費については、設計変更の対象とする。ただし、受注者の責めに帰すべき事由により生じた増加費用については、設計変更の対象としない。

（４）　受注者は、代替資材を調達する場合には、当該代替資材が設計図書で求める機能や品質等を満足していることが確認できる資料（カタログ等）を作成し、監督職員に提出しなければならない。

※ 様式については、契約課ホームページに掲載

4　積算方法

（1）　設計変更は、精算変更時（指定部分がある場合には、その指定部分の精算変更時）に行うことを基本とする。

（2）　設計変更を行う対象数量の考え方は、次のとおりとする。

既済部分について出来高部分払いを行っている場合は、当該既済部分払いの対象となった出来高部分に係る数量を除いた数量を設計数量とする。

証明された数量と対象数量の考え方
証明数量＜設計図書の数量 → 設計変更不可。 設計図書の数量≦証明数量≦設計数量 → 設計変更可。対象数量は証明数量 設計数量＜証明数量 → 設計変更可。対象数量は設計数量 （設計図書の数量：設計図書（数量総括表や図面等）に記載されている数量 設計数量：設計図書の数量にロスを加えた数量（積算上の数量） 証明数量：受注者から証明された数量）

※精算変更見込み数量を考慮すること。

換算値などを用いて明示した調達数量については、受発注者間で合意した換算値等や実際の使用量などを基に、受発注者間で協議して最終的な設計数量を決定すること。

（3）　設計変更に用いる単価は、実際の取引伝票、請求書等で確認出来た実際の購入価格とする。

（4）　別途調達経費は、直接工事費に計上するものとする。

材料費が個別に設定されている場合は、実際の購入価格に入れ替えて設計変更を行うこと。土木工事標準単価など材料費が分離できない場合は、調達検討資材の当初積算時点での実勢価格（物価資料等）と実際の購入価格の差分を計上して設計変更を行うこと。なお、当初積算時点の実勢価格（物価資料等）が掲載されていない場合は、受注者に当初積算時点の取引価格を確認の上、差分を算出すること。

（5）　本運用に基づく設計変更内容は、建設工事請負契約約款第 25 条（スライド条項）の対象外とする。

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
道路改良		式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	土砂 上記以外(小規模) 標準	m3		640	レベル4
路体盛土工		式		1	レベル3
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m3		20	レベル4
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3		340	レベル4
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3		250	レベル4
路床盛土工		式		1	レベル3
路床盛土	施工幅員2.5m未満	m3		10	レベル4
路床盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3		110	レベル4
路床盛土	施工幅員4.0m以上	m3		330	レベル4
土材料	処理土　ほぐし	m3		440	レベル4
法面整形工		式		1	レベル3
法面整形(切土部)	切土部 現場制約無し	m2		90	レベル4
法面整形(盛土部)	盛土部 法面締固め無し 現場制約無し	m2		200	レベル4
防草コンクリート		式		1	レベル3

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
張りコンクリート	防草コンクリート Co厚さ70mm	m2		361	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
土砂等運搬	小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		90	レベル4
残土等処分	粘性土	m3		90	レベル4
法面工		式		1	レベル2
植生工		式		1	レベル3
植生マット	[規]250m2未満	m2		90	レベル4
擁壁工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
床掘り	土砂 上記以外(小規模)	式		1	レベル4
埋戻し	土砂	式		1	レベル4
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1	レベル3
重力式擁壁（1号）	擁壁平均高さ1m超2m未満	m3		65	レベル4
重力式擁壁（W1-S-25-C-1）	擁壁平均高さ1m超2m未満	m3		22	レベル4
重力式擁壁（SGW42）	擁壁平均高さ1m超2m未満	m3		4	レベル4
嵩上工	σck=18N/mm2	m		17	レベル4
石・ブロック積(張)工		式		1	レベル2
Coブロック工(Coブロック積)		式		1	レベル3

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
コンクリートブロック基礎	σck=18N/mm2	m		64	レベル4
2号ブロック積	滑面ブロック σck=18N/mm2	m2		164	レベル4
胴込・裏込材(砕石)	RC-40	m3		126	レベル4
天端コンクリート	σck=18N/mm2	m		65	レベル4
排水構造物工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
床掘り	土砂 上記以外(小規模)	式		1	レベル4
埋戻し	土砂	式		1	レベル4
側溝工		式		1	レベル3
プレキャストU型側溝	落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300A[300×300×2000]	m		308	レベル4
プレキャストU型側溝	鉄筋コンクリートU形(JIS_A_5372) 300B[300×300×600]	m		69	レベル4
自由勾配側溝	B300　土留型	m		6	レベル4
自由勾配側溝	B500	m		72	レベル4
自由勾配側溝	B300	m		40	レベル4
埋戻コンクリート	σck=18N/mm2	m3		9	レベル4
側溝蓋	落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた 300[412×95×500]	枚		79	レベル4
側溝蓋	自由勾配側溝用　Co,Gr蓋	枚		105	レベル4
管渠工		式		1	レベル3

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
ヒューム管(B形管)	基礎砕石有り 外圧管1種 固定基礎90°巻き	m		9	レベル4
暗渠排水管	据付　硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径150m	m		9	レベル4
暗渠排水管	据付　硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200m	m		10	レベル4
鉄筋コンクリート台付管	据付 管径200㎜ 台付鉄筋コンクリート管(重圧管)	m		8	レベル4
鉄筋コンクリート台付管	据付 管径300㎜ 台付鉄筋コンクリート管(重圧管)	m		41	レベル4
管接続工	σck=18N/㎜2	箇所		1	レベル4
集水桝・マンホール工		式		1	レベル3
現場打ち集水桝	1号集水桝 σck=18N/㎜2	箇所		4	レベル4
現場打ち集水桝	2号集水桝 σck=18N/㎜2	箇所		1	レベル4
現場打ち集水桝	3号集水桝(1) σck=18N/㎜2	箇所		1	レベル4
現場打ち集水桝	4号集水桝(1) σck=18N/㎜2	箇所		1	レベル4
現場打ち集水桝	4号集水桝(2) σck=18N/㎜2	箇所		1	レベル4
現場打ち集水桝	5号集水桝 σck=18N/㎜2	箇所		1	レベル4
現場打ち集水桝	7号集水桝　H=500 σck=18N/㎜2	箇所		4	レベル4
現場打ち集水桝	7号集水桝　H=600 σck=18N/㎜2	箇所		1	レベル4
現場打ち集水桝	8号集水桝 σck=18N/㎜2	箇所		1	レベル4
現場打ち集水桝	9号集水桝 σck=18N/㎜2	箇所		1	レベル4
現場打ち集水桝	13号集水桝 σck=18N/㎜2	箇所		1	レベル4

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
プレキャスト集水桝	AS桝　300×600×600	箇所		1	レベル4
場所打水路工		式		1	レベル3
現場打水路	1号L型水路 σck=18N/mm2	m		1	レベル4
現場打水路	2号L型水路 σck=18N/mm2	m		77	レベル4
現場打水路	U2(GL)-B300-H300 σck=18N/mm2	m		3	レベル4
取水水路	B500 σck=24N/mm2	m		3	レベル4
運搬工		式		1	レベル3
現場発生品運搬	排水構造物　支給品	式		1	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し	機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)	m3		28	レベル4
舗装版切断	アスファルト舗装版厚15cm以下	式		1	レベル4
舗装版破砕	アスファルト舗装版厚15cm以下	m2		950	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	Co殻（無筋）	m3		28	レベル4
殻運搬	As殻	m3		38	レベル4
殻処分	Co殻（無筋）	m3		28	レベル4
殻処分	As殻	m3		38	レベル4

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
舗装		式		1	レベル1
地盤改良工		式		1	レベル2
路床安定処理工		式		1	レベル3
安定処理	混合深さ1m以下 5.2t/100m2 セメント系(一般軟弱土用)フレコン	m2		1,140	レベル4
舗装工		式		1	レベル2
アスファルト舗装工		式		1	レベル3
上層路盤(車道・路肩部)	RM-30 全仕上り厚120mm 1層施工	m2		1,700	レベル4
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物 平均幅員3.0m超 t=40mm	m2		1,640	レベル4
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物 平均幅員1.4m未満 t=40mm	m2		113	レベル4
コンクリート舗装工		式		1	レベル3
下層路盤(車道・路肩部)	RC-30　全仕上り厚100mm	m2		88	レベル4
コンクリート舗装	σck=18N/mm2　t=10cm	m2		88	レベル4
縁石工		式		1	レベル2
縁石工		式		1	レベル3
アスカーブ	細粒度アスコン(13) 断面積215cm2以上235cm2未満	m		70	レベル4
防護柵工		式		1	レベル2
路側防護柵工		式		1	レベル3
ガードレール	塗装品_Gr-C-4E	m		67	レベル4

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
ガードレール	塗装品_Gr-C-2B	m		75	レベル4
区画線工		式		1	レベル2
区画線工		式		1	レベル3
溶融式区画線	実線_15cm　白　t=1.5mm	m		550	レベル4
道路付属施設工		式		1	レベル2
境界工		式		1	レベル3
境界鋲	アルミ製　設置 [規]30枚以上	枚		87	レベル4
仮設工		式		1	レベル2
工事用道路工		式		1	レベル3
工事用道路土工	W=3.0m	式		1	レベル4
土材料	処理土　ほぐし	式		1	レベル4
交通管理工		式		1	レベル3
交通誘導警備員		人		6	レベル4
＊＊直接工事費＊＊					
技術管理費					
技術管理費		式		1	レベル2
技術管理費		式		1	レベル3
土質試験費		式		1	レベル4

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
共通仮設費率分					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊					
＊＊工事費計＊＊					
＊＊契約保証費計＊＊					

計画平面図　S=1:500

道路構造規格

種級区分・・・・・・・第3種第5級(小型道路)
設計速度・・・・・・・V=20km/h

基準値

最少曲線半径・・・・・R=15m(望ましい値30m)
最少曲線長・・・・・・L=40m(280/θ)
最急縦断勾配・・・・・i=12.00%
縦断曲線長・・・・・・L=20.00m(衝撃緩和に必要な最小長1.1i)
縦断曲線半径・・・・・凸=100m・凹100m

R8年度　施工延長　L=407m
(A路線：L=277m　S路線：L=130m)

N

S=1:500

※地下排水管理桝は、施工時に試掘調査を行い、
地下排水管の位置深さに合わせて調整を行う。

凡例

色別	種別	備考
	アスファルト舗装	
	切土法面	
	盛土法面	
	水路	
	管路	
	集水桝	
	重力式擁壁	
	ブロック擁壁	
	坂路	
	幅杭	

図面番号	1 /	縮尺	1：500
工種	市道整備事業		
種別	平面図	番号	1 / 1
路線名	道面郷線		
工事箇所	東広島市河内町入野		
東広島市			

縦　断　図（A 路 線）

V=1:100
H=1:500

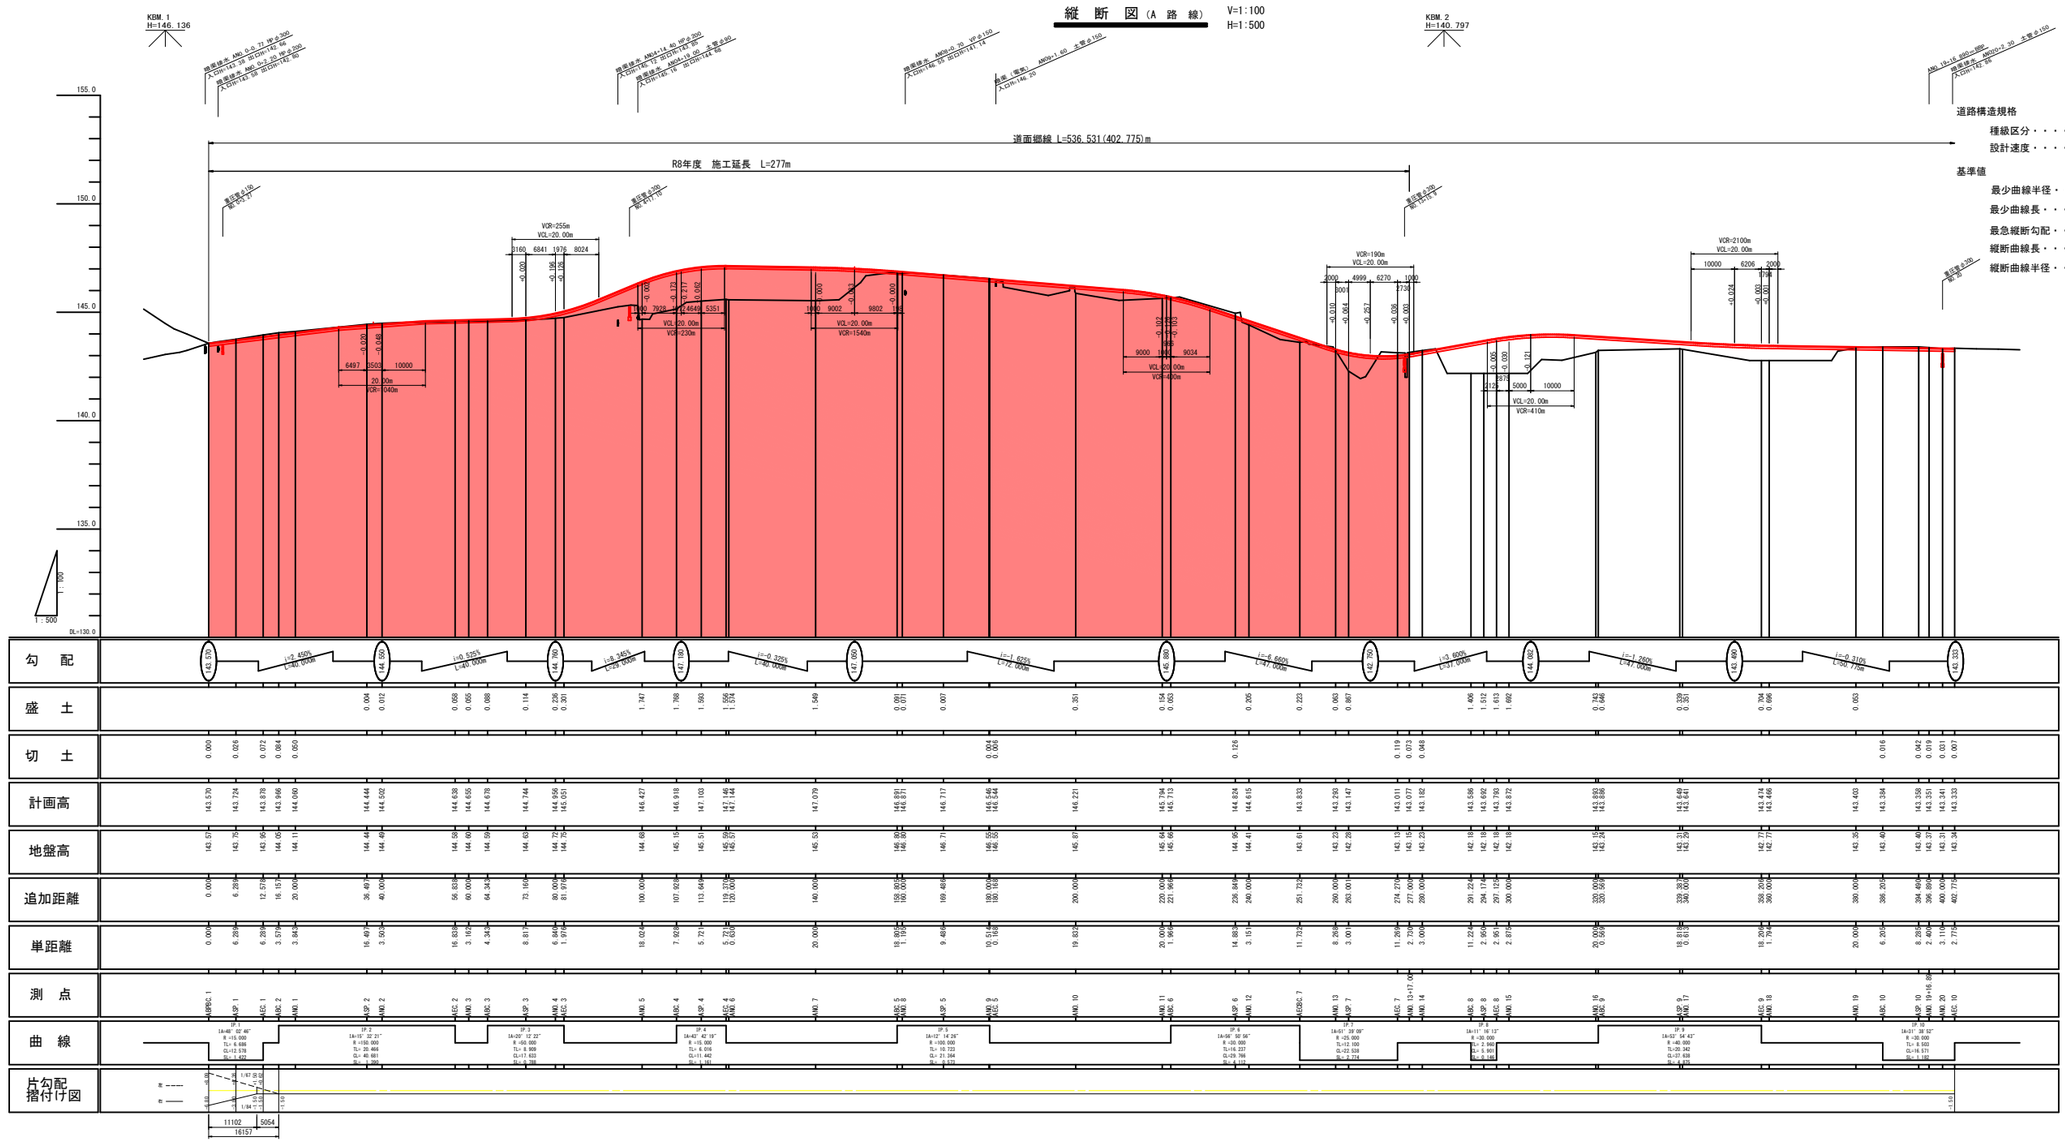

道路構造規格

種級区分・・・・・・・第3種第5級(小型道路)

設計速度・・・・・・・V=20km/h

基準値

最少曲線半径・・・・・R=15m(望ましい値30m)

最少曲線長・・・・・・L=40m(280/θ)

最急縦断勾配・・・・・i=12.00%

縦断曲線長・・・・・・L=20.00m(衝撃緩和に必要な最小長1.1i)

縦断曲線半径・・・・・凸=100m・凹100m

勾　配	i=2.450% L=40.000m ／ i=0.525% L=40.000m ／ i=8.345% L=29.000m ／ i=0.329% L=40.000m ／ i=-1.625% L=72.000m ／ i=-6.660% L=47.000m ／ i=3.600% L=31.000m ／ i=-1.260% L=47.000m ／ i=0.210% L=50.775m
盛　土	0.004 0.012 ／ 0.008 0.005 0.008 ／ 0.114 ／ 0.226 0.291 ／ 1.747 ／ 1.788 ／ 1.593 ／ 1.506 1.514 ／ 1.549 ／ 0.001 0.011 ／ 0.007 ／ 0.351 ／ 0.154 0.003 ／ 0.205 ／ 0.223 ／ 0.983 0.997 ／ 1.406 ／ 1.512 1.613 1.692 ／ 0.743 0.848 ／ 0.329 0.351 ／ 0.704 0.896 ／ 0.003
切　土	0.009 ／ 0.026 ／ 0.072 ／ 0.084 ／ 0.055 ／ 0.004 0.009 ／ 0.126 ／ 0.119 ／ 0.073 ／ 0.048 ／ 0.016 ／ 0.042 ／ 0.019 ／ 0.031 ／ 0.007
計画高	143.570 ／ 143.724 ／ 143.878 ／ 143.966 ／ 144.050 ／ 144.444 ／ 144.502 ／ 144.638 ／ 144.655 ／ 144.678 ／ 144.744 ／ 144.656 145.051 ／ 146.427 ／ 146.918 ／ 147.103 ／ 147.146 147.144 ／ 147.079 ／ 146.891 146.871 ／ 146.717 ／ 146.546 146.544 ／ 146.221 ／ 145.794 145.713 ／ 144.624 144.615 ／ 143.833 ／ 143.593 143.147 ／ 143.011 143.077 143.182 ／ 143.586 143.692 143.793 143.972 ／ 143.893 143.886 ／ 143.649 143.641 ／ 143.474 143.466 ／ 143.403 ／ 143.384 ／ 143.358 143.351 143.341 143.333
地盤高	143.57 ／ 143.79 ／ 143.96 ／ 144.05 ／ 144.11 ／ 144.44 144.49 ／ 144.09 ／ 144.09 ／ 144.09 ／ 144.63 ／ 144.72 144.72 ／ 144.69 ／ 145.15 ／ 145.51 ／ 145.85 145.85 ／ 145.63 ／ 146.08 146.08 ／ 146.71 ／ 146.95 146.95 ／ 145.87 ／ 145.94 145.99 ／ 144.95 144.41 ／ 143.61 ／ 143.22 142.28 ／ 143.13 143.10 143.22 ／ 142.18 142.18 142.18 142.18 ／ 143.35 143.24 ／ 142.29 ／ 142.77 142.77 ／ 143.35 ／ 143.40 ／ 143.37 143.34
追加距離	0.000 ／ 6.289 ／ 12.578 ／ 16.157 ／ 20.000 ／ 36.497 ／ 40.000 ／ 56.838 ／ 60.000 ／ 64.343 ／ 73.160 ／ 80.000 81.911 ／ 100.000 ／ 107.925 ／ 113.646 ／ 119.375 120.000 ／ 140.000 ／ 158.805 160.000 ／ 169.484 ／ 180.000 180.160 ／ 200.000 ／ 220.000 221.960 ／ 236.844 240.000 ／ 251.732 ／ 260.000 260.001 ／ 274.270 277.000 280.000 ／ 291.224 294.174 297.125 300.000 ／ 320.000 320.599 ／ 339.381 340.000 ／ 359.205 360.000 ／ 380.000 ／ 386.205 ／ 394.490 396.890 400.000 402.775
単距離	0.000 ／ 6.289 ／ 6.289 3.579 3.845 ／ 16.497 3.503 ／ 16.838 3.162 ／ 4.343 ／ 8.817 ／ 6.840 1.916 ／ 18.024 ／ 7.925 ／ 5.721 ／ 5.729 0.625 ／ 20.000 ／ 18.805 1.195 ／ 9.484 ／ 10.516 0.160 ／ 19.832 ／ 20.000 1.960 ／ 14.884 3.115 ／ 11.732 ／ 8.268 3.000 ／ 11.269 2.731 3.000 ／ 11.224 2.950 2.951 2.875 ／ 20.000 0.599 ／ 18.818 0.613 ／ 18.206 1.794 ／ 20.000 ／ 6.205 ／ 8.285 2.405 3.110 2.775
測　点	KBSC.1 ／ SP.1 ／ VCC.1 ／ VCC.2 ／ HKO.1 ／ IP.2 ／ HKO.2 ／ VCC.2 ／ HKO.3 ／ VCC.3 ／ SP.3 ／ HKO.4 HKO.3 ／ VCC.4 ／ SP.4 ／ VCC.4 HKO.6 ／ HKO.5 ／ HKO.7 ／ VCC.5 HKO.8 ／ SP.5 ／ HKO.9 HKO.5 ／ HKO.10 ／ HKO.11 VCC.6 ／ SP.6 ／ HKO.12 ／ KESBC.7 ／ HKO.13 ／ SP.7 ／ VCC.7 ／ HKO.13+17.000 ／ HKO.14 ／ VCC.8 ／ SP.8 ／ VCC.8 ／ HKO.15 ／ HKO.16 ／ VCC.9 ／ HKO.17 ／ SP.9 ／ VCC.9 ／ HKO.18 ／ HKO.19 ／ VCC.10 ／ SP.10 ／ HKO.19+16.689 ／ HKO.20 ／ VCC.10
曲　線	IP.1 1A=46° 02' 46" R =15.000 TL= 6.686 CL=12.578 SL= 1.422 ／ IP.2 1A=15° 32' 21" R =150.000 TL= 20.468 CL= 40.661 SL= 0.881 ／ IP.3 1A=20° 12' 22" R =60.000 TL= 8.908 CL=17.785 SL= 0.785 ／ IP.4 1A=42° 42' 19" R =15.000 TL= 6.016 CL=11.462 SL= 0.621 ／ IP.5 1A=12° 14' 26" R =100.000 TL= 10.723 CL= 21.359 SL= 0.359 ／ IP.6 1A=56° 50' 56" R =20.000 TL=10.237 CL=19.836 SL= 0.766 ／ IP.7 1A=51° 39' 09" R =25.000 TL=12.100 CL=23.538 SL= 0.774 ／ IP.8 1A=11° 16' 13" R =30.000 TL= 2.965 CL= 5.901 SL= 0.482 ／ IP.9 1A=52° 54' 43" R =40.000 TL=20.342 CL=40.000 SL=4.638 ／ IP.10 1A=31° 38' 52" R =30.000 TL= 8.503 CL=16.571 SL= 1.429
片勾配 摺付け図	0.47 0.45 ／ 1/94 ／ 1/84 ／ 11102 16157 ／ 5054

図面番号	2 /	縮尺	図示
工種	市道整備事業		
種別	縦断図（A路線）	番号	1 / 2
路線名	道面郷線		
工事箇所	東広島市河内町入野		

東広島市

流末水路縦断図

V=1:100
H=1:500

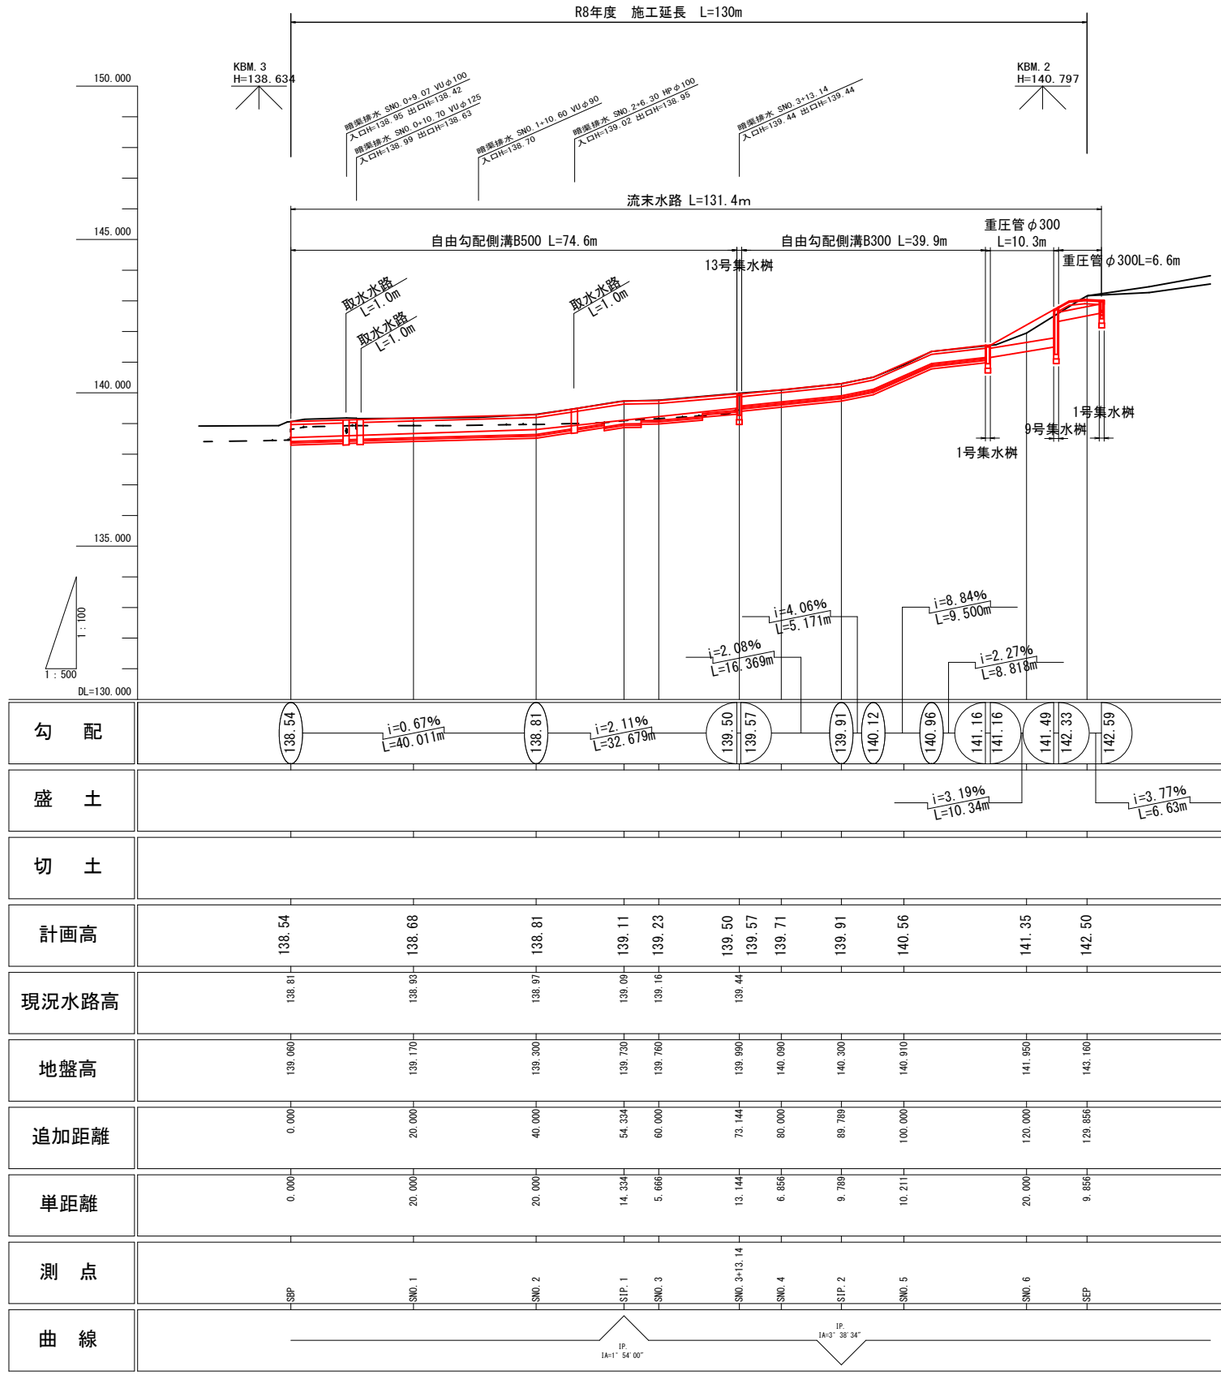

| | | |

道　路　区　分・・・・・・第3種5級
設　計　速　度・・・・・・20km/hr
交　通　区　分・・・・・・N1(40台/日未満)
設　計．CBR　・・・・・・4%

舗装設計条件

交通区分	N1(40台/日未満)(信頼度75%)				
工種＼区分	設計厚	種　別	換算係数	換算値	条　件
表　層	4	再生密粒度アスコン	1.00	4.00	
上層路盤	12	粒度調整砕石	0.35	4.20	
合　計	40				
設計 C.B.R= 4 %		合計舗装厚 (H)=16cm		TA = 8.20≧8.0(目標値)	

標準断面図

S=1:50

AEC.4付近

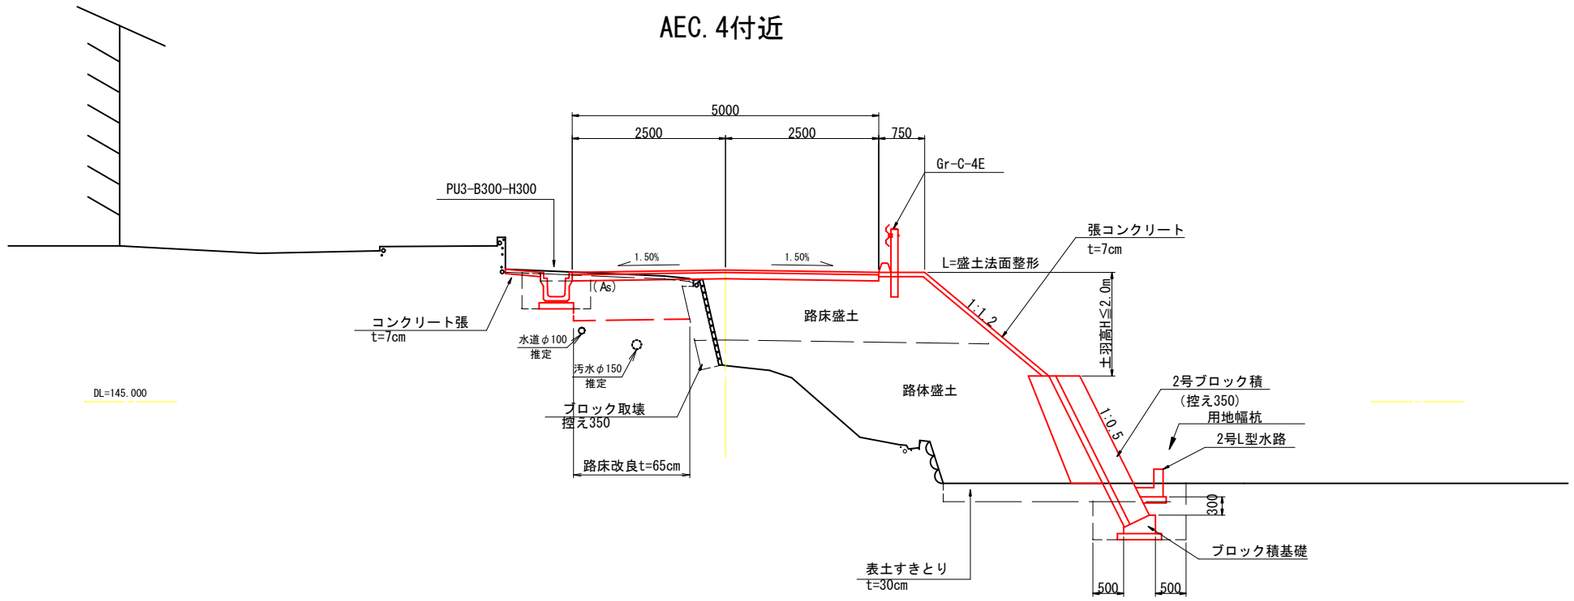

ABC.3付近

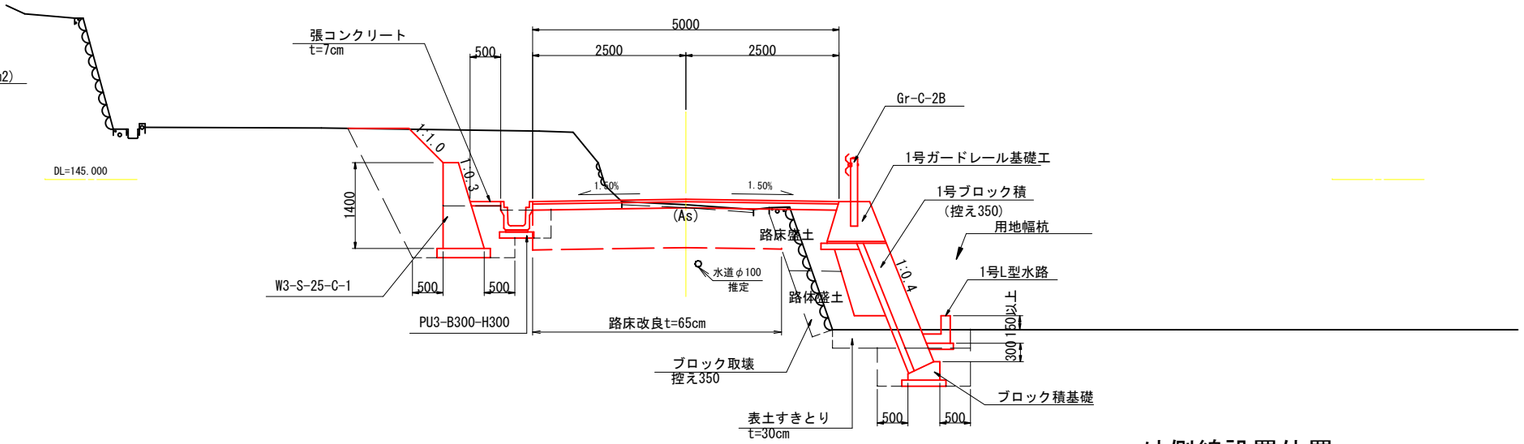

コンクリート張

S=1:10



アスファルト舗装

(現況道路拡幅部)　S=1:10

(舗装計画交通量 N1(15台未満,設計CBR4)

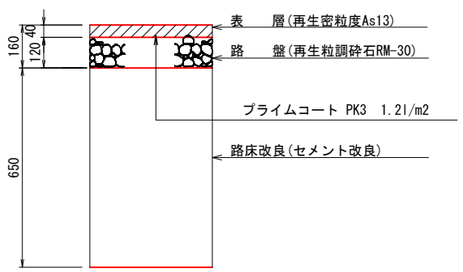

コンクリート舗装

S=1:10



外側線設置位置

S=1:50



凡　例

記　号	工　種	色別
C(SE)	掘削(土砂)	
C(M)	掘削(粘性)	
B1-1～4	路床盛土	
B2-1～4	路体盛土	
E(SE)	床掘(土砂)	
Fu(C,D)	発生土埋戻	
Fu(Co)	埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ	
K(SE)	基面整正	
L	切土法面整形	
L	盛土法面整形	
As	舗装版取壊	
Co	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊	
W1	舗装(表層)	
W2	舗装(路盤)	
W3	舗装(路床改良)	

図面番号	4 /	縮　尺	1：50
工　種	市道整備事業		
種　別	標準断面図	番号	1/2
路線名	道面郷線		
工事箇所	東広島市河内町入野		

東　広　島　市

横 断 面 図

（A路線）　　S=1:100

D=3.579

AEC. 1

GH=143.95
FH=143.878

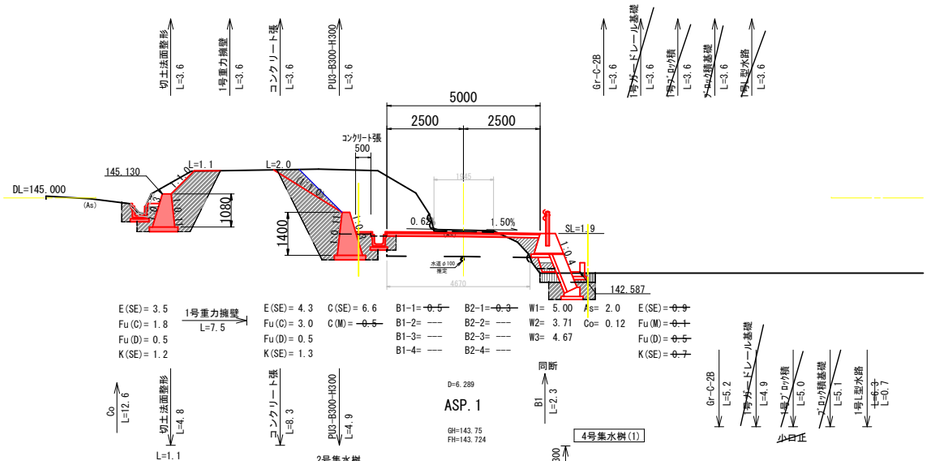

E(SE)= 3.5
Fu(C)= 1.8
Fu(D)= 0.5
K(SE)= 1.2

1号重力擁壁 L=7.5

E(SE)= 4.3
Fu(C)= 3.0
Fu(D)= 0.5
K(SE)= 1.3

C(SE)= 6.6
C(M)= ~~0.5~~

B1-1= ~~0.5~~
B1-2= ----
B1-3= ----
B1-4= ----

B2-1= ~~0.3~~
B2-2= ----
B2-3= ----
B2-4= ----

W1= 5.00 As= 2.0
W2= 3.71 Co= 0.12
W3= 4.67

E(SE)= ~~0.9~~
Fu(M)= ~~0.1~~
Fu(D)= ~~0.5~~
K(SE)= ~~0.7~~

Co L=12.6
切土法面整形 L=4.6
L=1.1
コンクリート張 L=8.3
PUG-B300-H300 L=4.9
2号集水桝
PUG-B300-H300 L=3.6
1号集水桝

D=6.289

ASP. 1

GH=143.75
FH=143.724



Gr-C-2B L=5.2
ガードレール基礎 L=4.9
ブロック積基礎 L=5.0
1号U型水路 L=6.2
L=0.7
少白正

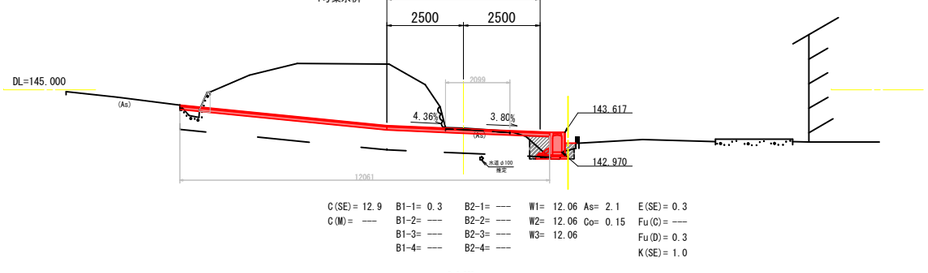

C(SE)= 12.9
C(M)= ----

B1-1= 0.3
B1-2= ----
B1-3= ----
B1-4= ----

B2-1= ----
B2-2= ----
B2-3= ----
B2-4= ----

W1= 12.06 As= 2.1
W2= 12.06 Co= 0.15
W3= 12.06

E(SE)= 0.3
Fu(C)= ----
Fu(D)= 0.3
K(SE)= 1.0

D=6.289

ABPBC. 1

GH=143.57
FH=143.570

自由勾配側溝B300 L=4.6

AS桝



E(SE)= ----
Fu(C)= ----
Fu(D)= ----
K(SE)= ----

C(SE)= 0.5
C(M)= ----

B1-1= ----
B1-2= ----
B1-3= ----
B1-4= ----

B2-1= ----
B2-2= ----
B2-3= ----
B2-4= ----

W1= 4.95 As= 5.0
W2= 4.95 Co= ----
W3= 4.95

E(SE)= ----
Fu(C)= ----
Fu(D)= ----
K(SE)= ----

D=20.341

ASP. 2

GH=144.44
FH=144.444

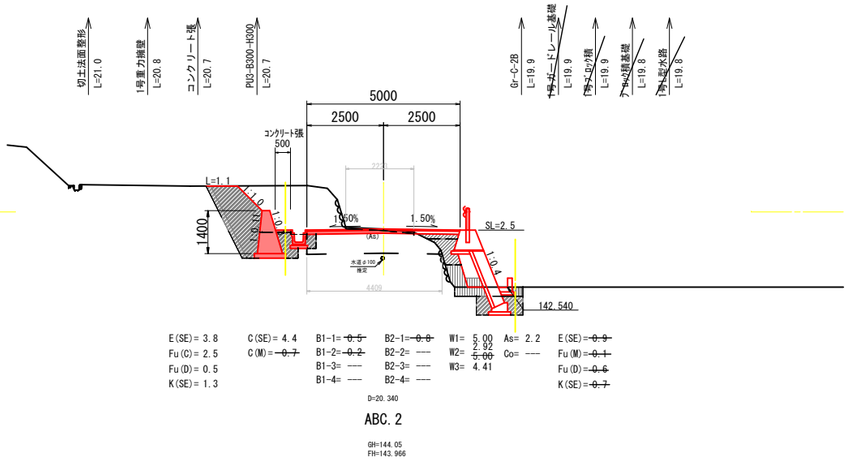

E(SE)= 3.8
Fu(C)= 2.5
Fu(D)= 0.5
K(SE)= 1.3

C(SE)= 4.4
C(M)= ~~0.7~~

B1-1= ~~0.5~~
B1-2= ~~0.2~~
B1-3= ----
B1-4= ----

B2-1= ~~0.8~~
B2-2= ----
B2-3= ----
B2-4= ----

W1= 5.00 As= 2.2
W2= 2.92 Co= ----
W3= 4.41

E(SE)= ~~0.9~~
Fu(M)= ~~0.1~~
Fu(D)= ~~0.6~~
K(SE)= ~~0.7~~

D=20.340

ABC. 2

GH=144.05
FH=143.966



E(SE)= 4.3
Fu(C)= 2.9
Fu(D)= 0.5
K(SE)= 1.3

C(SE)= 6.4
C(M)= ~~0.6~~

B1-1= ~~0.5~~
B1-2= ----
B1-3= ----
B1-4= ----

B2-1= ~~0.4~~
B2-2= ----
B2-3= ----
B2-4= ----

W1= 5.00 As= 2.0
W2= 3.77 Co= ----
W3= 4.53

E(SE)= ~~0.9~~
Fu(M)= ~~0.1~~
Fu(D)= ~~0.6~~
K(SE)= ~~0.7~~

ABPBC. 1～ASP. 2

図面番号	5 /	縮 尺	1 : 100
工 種	市道整備事業		
種 別	横 断 図	番号	1 / 7
路線名	道面郷線		
工事箇所	東広島市河内町入野		

東 広 島 市

横 断 面 図

（A路線）　　S=1:100

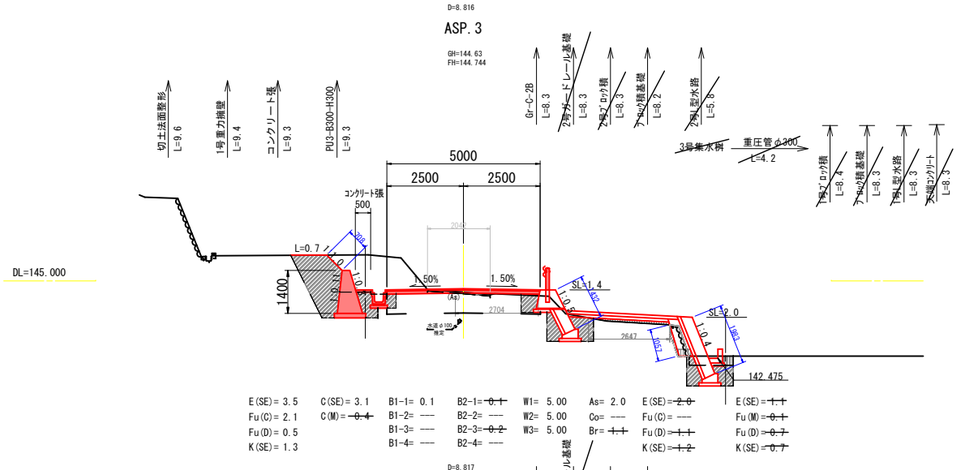

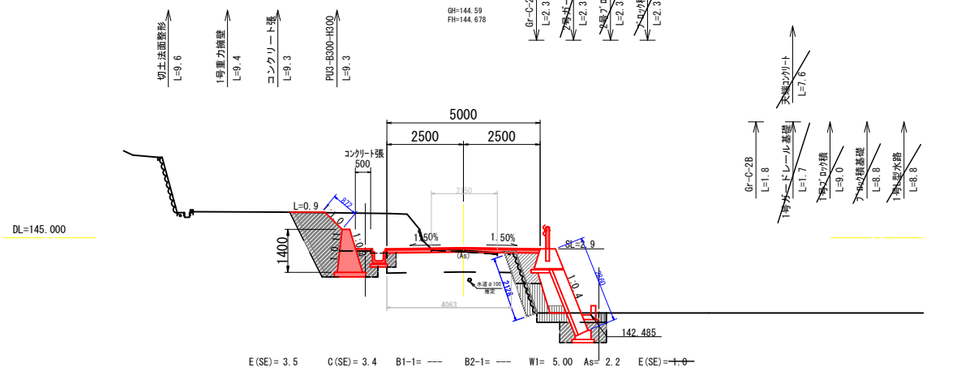

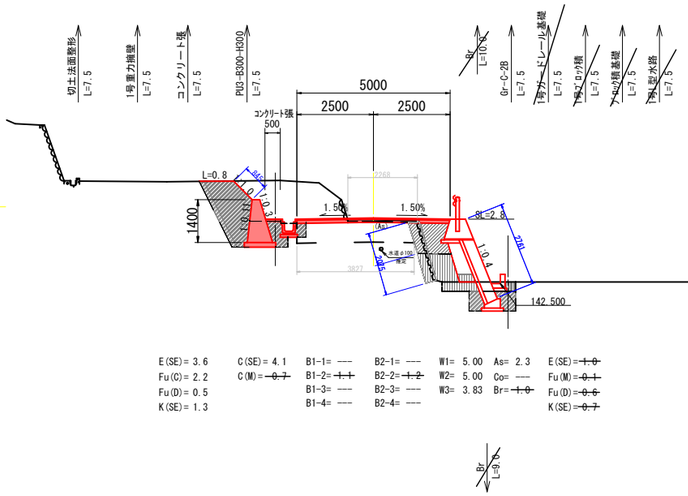

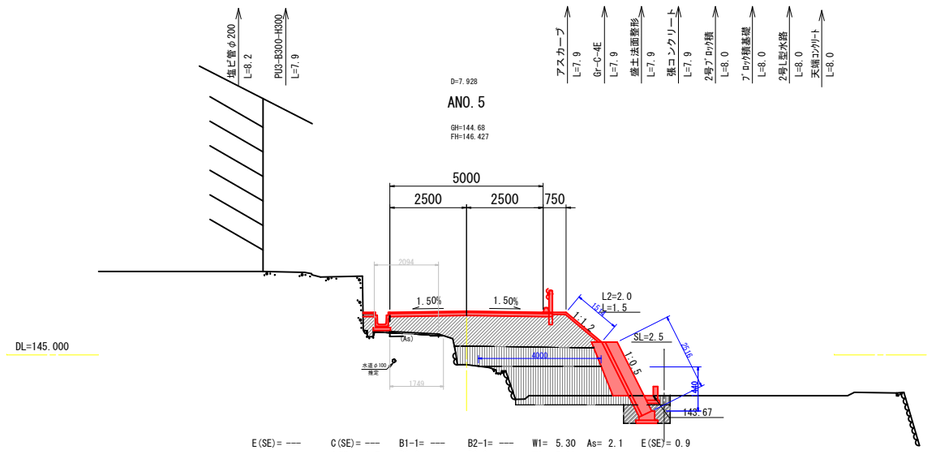

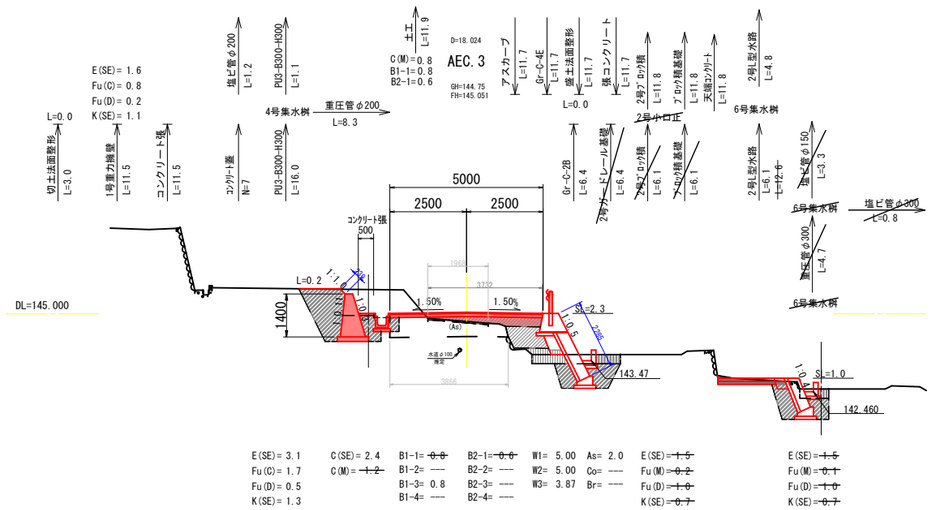

AEC. 2～ANO. 5

図面番号	6 /	縮 尺	1 : 100
工 種	市 道 整 備 事 業		
種 別	横 断 図	番号	2 / 7
路 線 名	道 面 郷 線		
工事箇所	東 広 島 市 河 内 町 入 野		

東 広 島 市

横 断 面 図

（A路線）　S=1:100

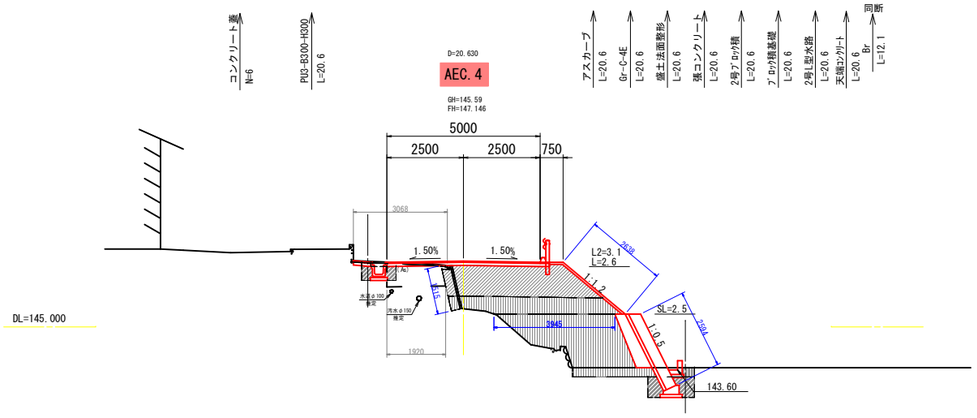

E(SE)= 0.5　C(SE)= 0.2　B1-1= ----　B2-1= ----　W1= 5.30　As= 3.1　E(SE)= 1.0
Fu(C)= ----　C(M)= 1.2　B1-2= ----　B2-2= ----　W2= 5.30　Co= ----　Fu(M)= 0.1
Fu(D)= 0.3　B1-3= ----　B2-3= 6.0　W3= 1.92　Br= 1.52　Fu(D)= 0.6
K(SE)= 0.6　B1-4= 4.6　B2-4= 2.8　K(SE)= 0.7

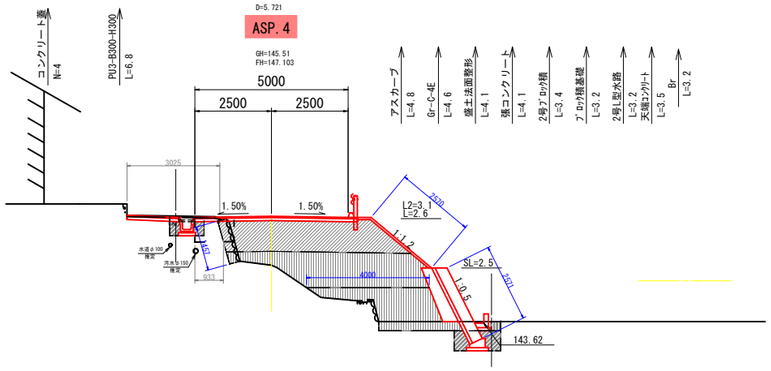

E(SE)= 0.5　C(SE)= 0.3　B1-1= ----　B2-1= ----　W1= 5.30　As= 3.0　E(SE)= 1.0
Fu(C)= ----　C(M)= 1.2　B1-2= ----　B2-2= ----　W2= 5.30　Co= ----　Fu(M)= 0.1
Fu(D)= 0.3　B1-3= ----　B2-3= 3.7　W3= 0.93　Br= 1.46　Fu(D)= 0.6
K(SE)= 0.6　B1-4= 5.6　B2-4= 5.8　K(SE)= 0.7

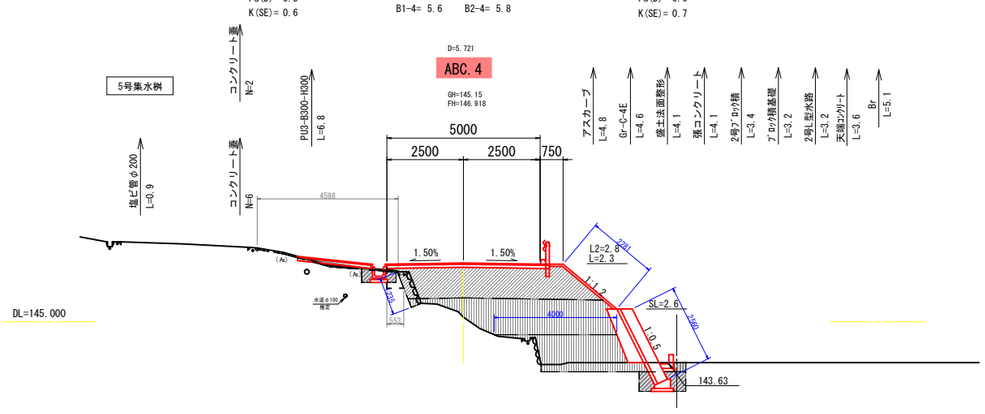

E(SE)= 0.4　C(SE)= 0.1　B1-1= ----　B2-1= ----　W1= 5.30　As= 4.6　E(SE)= 1.0
Fu(C)= ----　C(M)= 1.4　B1-2= ----　B2-2= 0.2　W2= 5.30　Co= ----　Fu(M)= 0.1
Fu(D)= 0.3　B1-3= ----　B2-3= 3.7　W3= 0.55　Br= 1.24　Fu(D)= 0.6
K(SE)= 0.6　B1-4= 6.0　B2-4= 5.8　K(SE)= 0.7

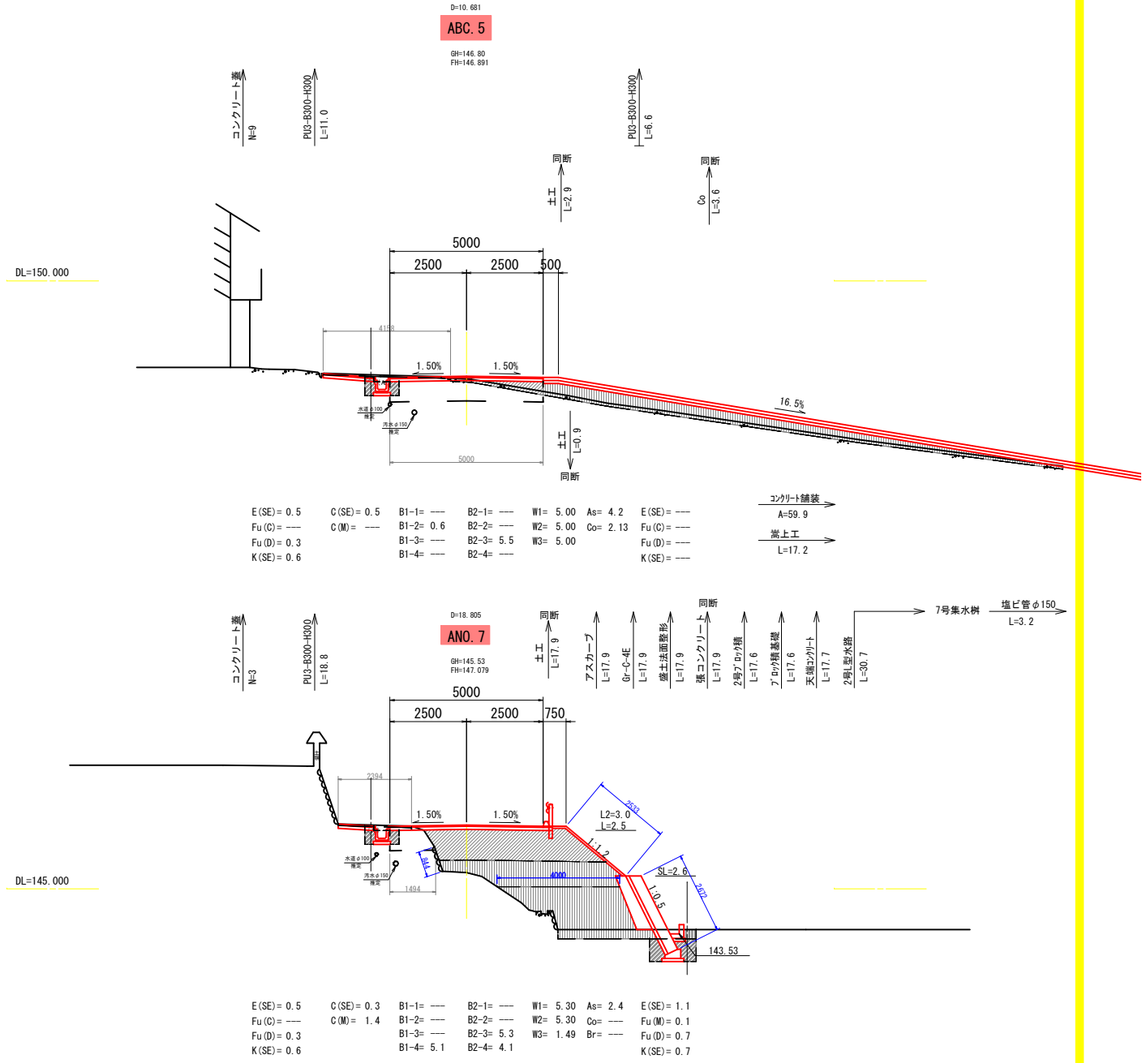

E(SE)= 0.5　C(SE)= 0.5　B1-1= ----　B2-1= ----　W1= 5.00　As= 4.2　E(SE)= ----
Fu(C)= ----　C(M)= ----　B1-2= 0.6　B2-2= ----　W2= 5.00　Co= 2.13　Fu(C)= ----
Fu(D)= 0.3　B1-3= ----　B2-3= 5.5　W3= 5.00　Fu(D)= ----
K(SE)= 0.6　B1-4= ----　B2-4= ----　K(SE)= ----

E(SE)= 0.5　C(SE)= 0.3　B1-1= ----　B2-1= ----　W1= 5.30　As= 2.4　E(SE)= 1.1
Fu(C)= ----　C(M)= 1.4　B1-2= ----　B2-2= ----　W2= 5.30　Co= ----　Fu(M)= 0.1
Fu(D)= 0.3　B1-3= ----　B2-3= 5.3　W3= 1.49　Br= ----　Fu(D)= 0.7
K(SE)= 0.6　B1-4= 5.1　B2-4= 4.1　K(SE)= 0.7

ABC. 4～ABC. 5

図面番号	7 /	縮 尺	1：100
工 種	市 道 整 備 事 業		
種 別	横 断 図	番号	3／7
路 線 名	道 面 郷 線		
工事箇所	東 広 島 市 河 内 町 入 野		

東 広 島 市

横 断 面 図

（A路線）　S=1:100

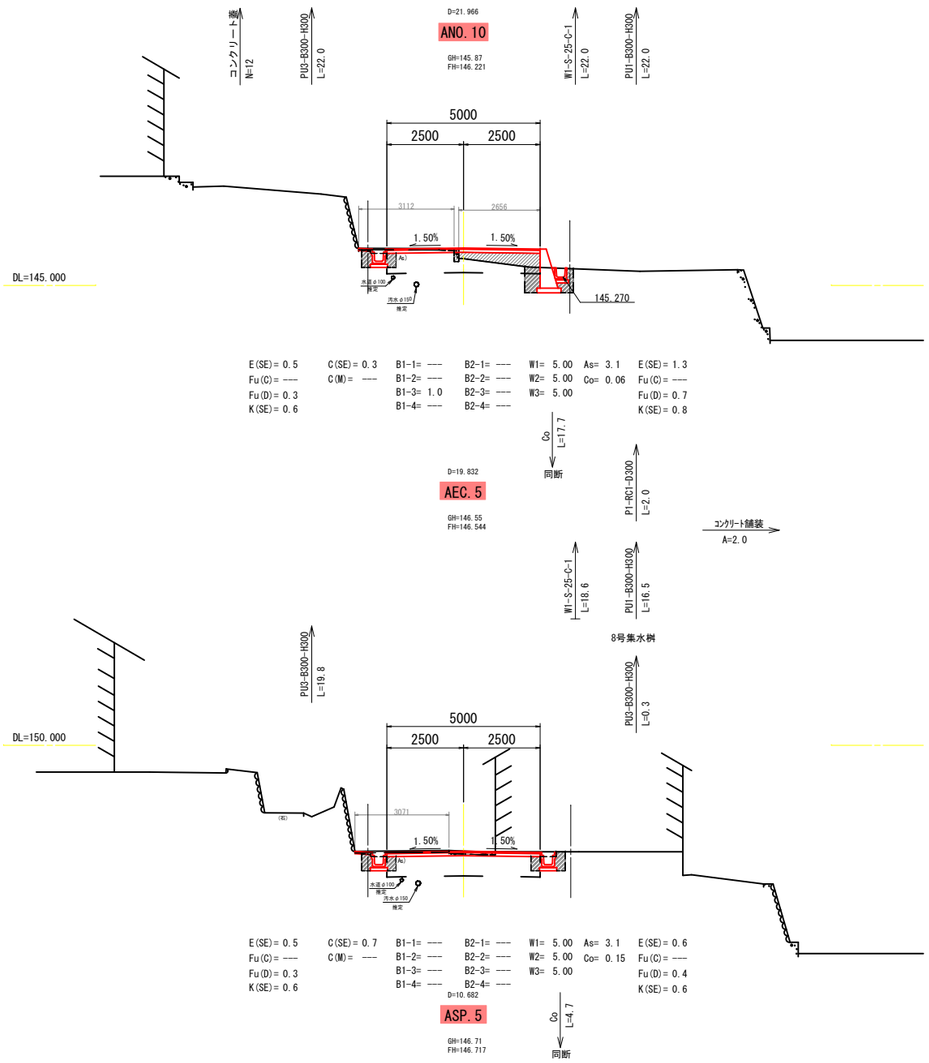

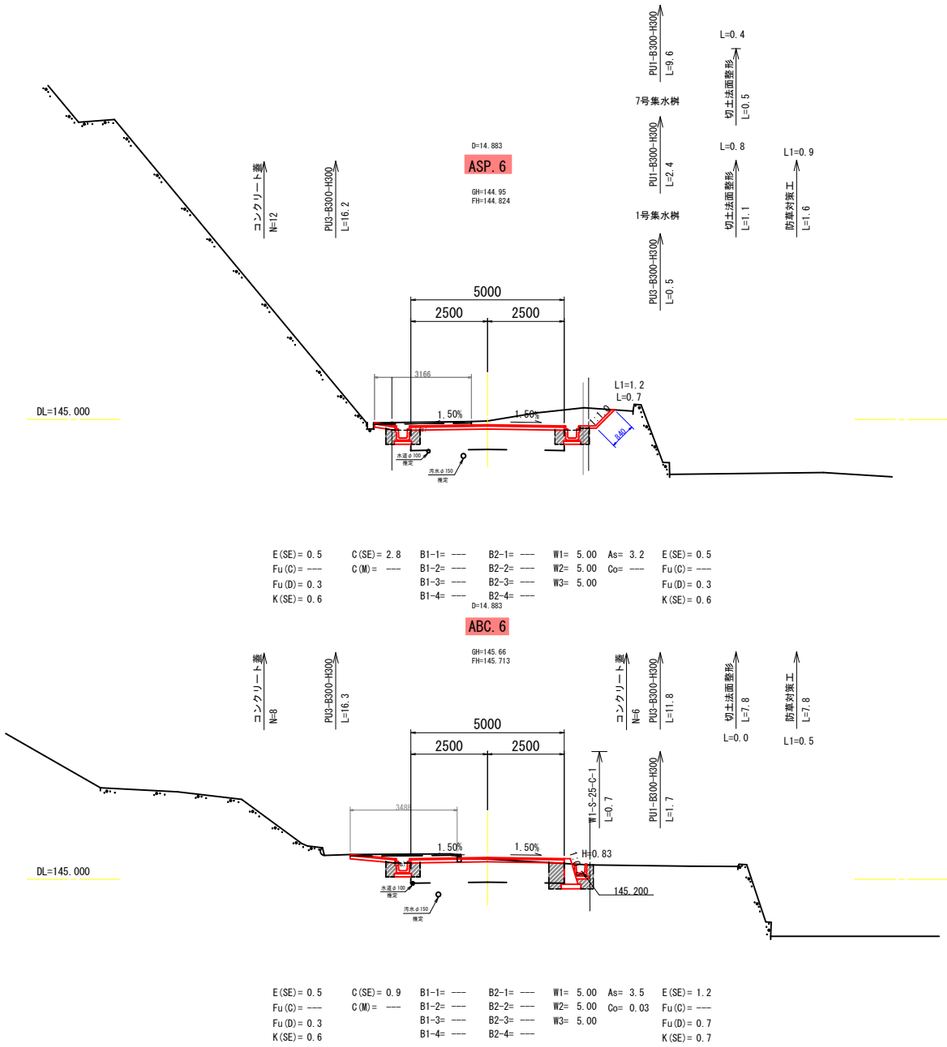

ASP.5～ASP.6

図面番号	8 /	縮　尺	1：100
工　種	市道整備事業		
種　別	横　断　図	番号	4／7
路線名	道面郷線		
工事箇所	東広島市河内町入野		

東　広　島　市

横 断 面 図

（A路線）　　S=1:100

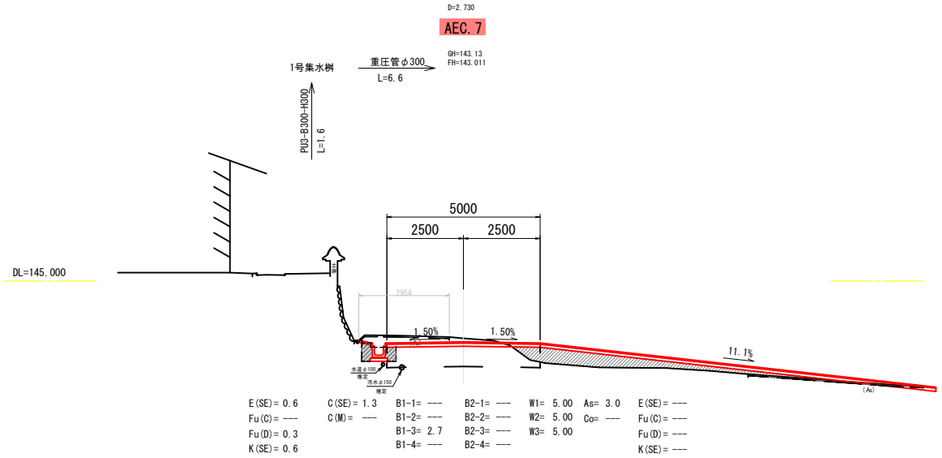

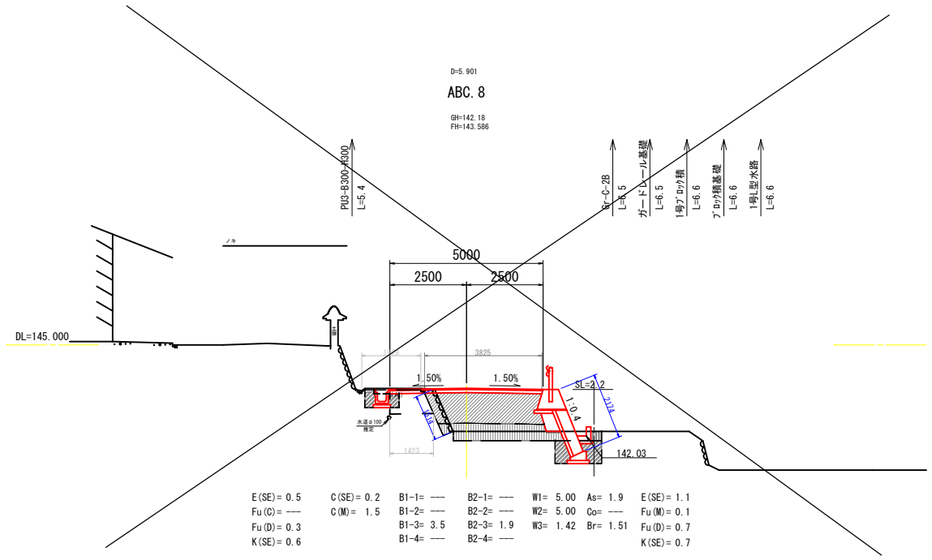

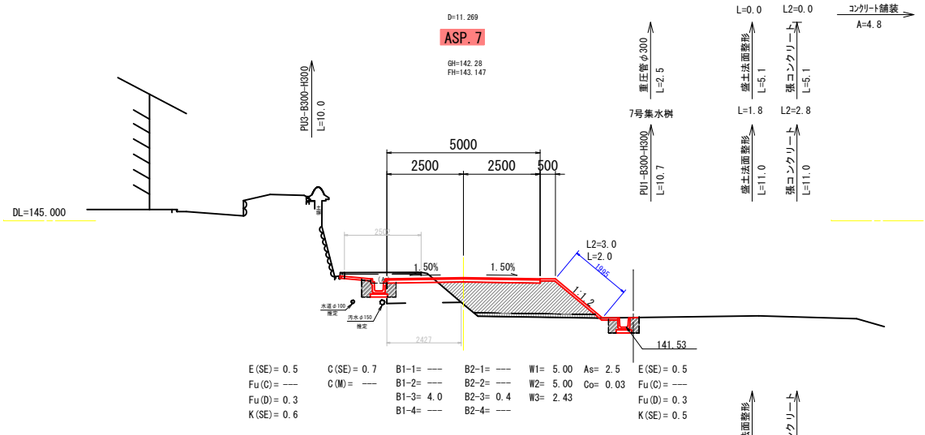

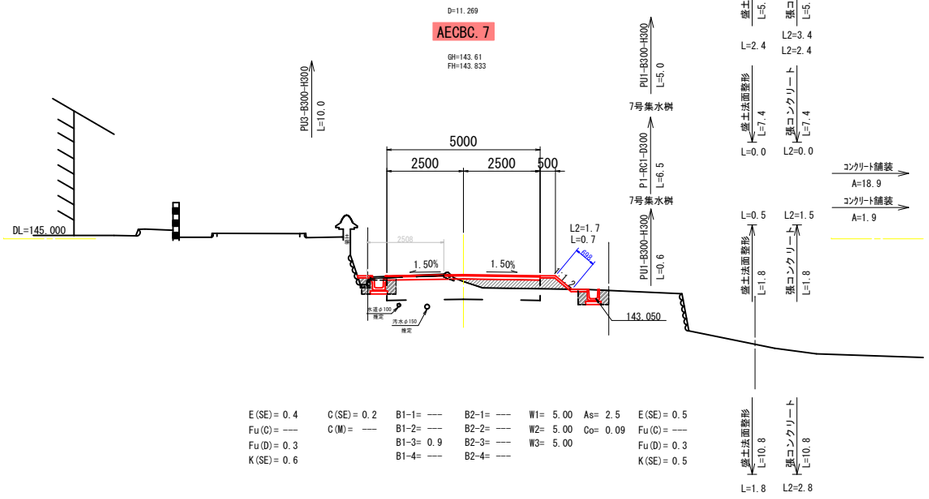

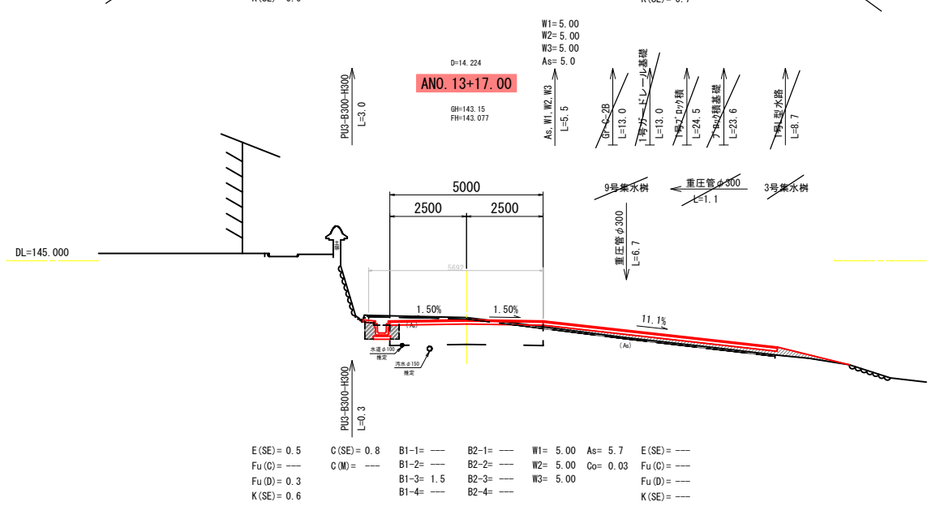

AECBC.7～ABC.8

図面番号	9 /	縮　尺	1：100
工　種	市道整備事業		
種　別	横　断　図	番号	5／7
路線名	道面郷線		
工事箇所	東広島市河内町入野		

東　広　島　市

横 断 面 図

（流末水路）　S=1：100





Fu(Co)= 0.1　As= 0.9　E(SE)= 0.9　W1= 0.30
Co= ----　Fu(C)= ----　W2= 0.30
Fu(D)= 0.3
K(SE)= 0.8

D=20.000
SNO.1
GH=139.170



Fu(Co)= 0.1　As= 0.8　E(SE)= 1.1　W1= 0.30
Co= 0.0　Fu(C)= ----　W2= 0.30
Fu(D)= 0.4
K(SE)= 0.9

D=20.000
SBP
GH=139.060

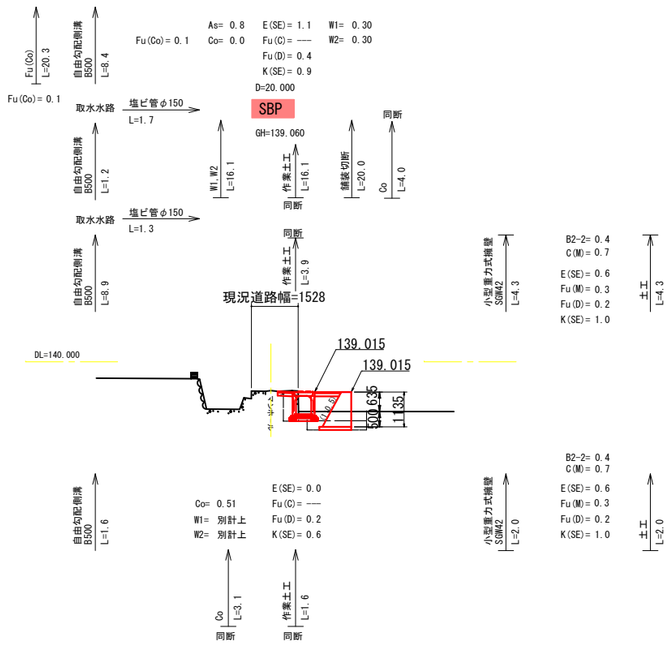



As= 1.4　E(SE)= 0.6　W1= 0.87
Co= ----　Fu(C)= ----　W2= 0.87
Fu(D)= 0.3
K(SE)= 0.7

D=6.856
SNO.3+13.14
GH=139.990

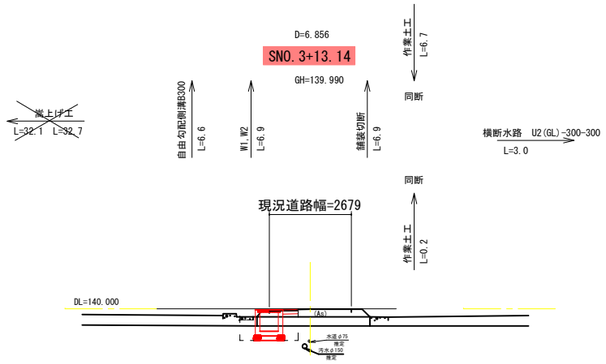

As= 0.9　E(SE)= 1.7　W1= 0.50
Co= ----　Fu(C)= ----　W2= 0.50
Fu(D)= 0.8
K(SE)= 1.0

D=13.144
SNO.3
GH=139.760

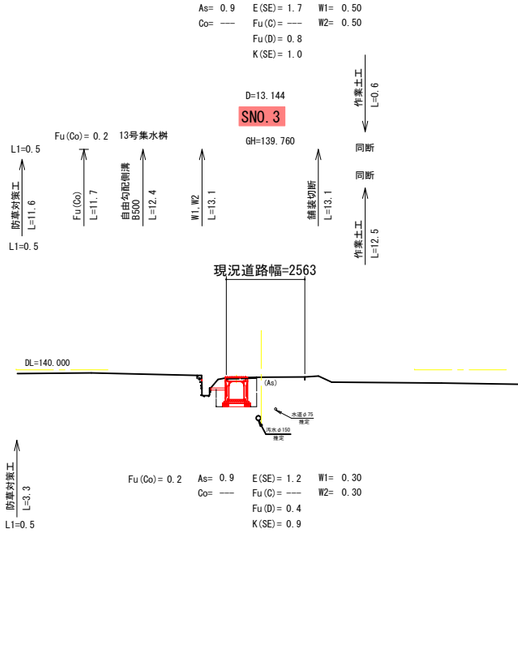

Fu(Co)= 0.2　As= 0.9　E(SE)= 1.2　W1= 0.30
Co= ----　Fu(C)= ----　W2= 0.30
Fu(D)= 0.4
K(SE)= 0.9

As= ----　E(SE)= 0.7
Co= ----　Fu(C)= ----
Fu(D)= 0.4
K(SE)= 0.5

9号集水桝　As= 3.1
重圧管φ300 L=4.4
As L=7.3
D=9.856
SNO.6
GH=141.950



As= 3.1　E(SE)= 0.8　B1-3= 0.6　E(SE)= 1.9　W1= ----
Co= ----　Fu(C)= ----　Fu(C)= ----　W2= ----
Fu(D)= 0.6　Fu(D)= 0.8
K(SE)= 0.5　K(SE)= 0.7

重圧管φ300 L=5.9
As L=5.1
As= 3.1

1号集水桝　As= 1.3　W1= 0.77　W2= 0.77
D=20.000
SNO.5
GH=140.910

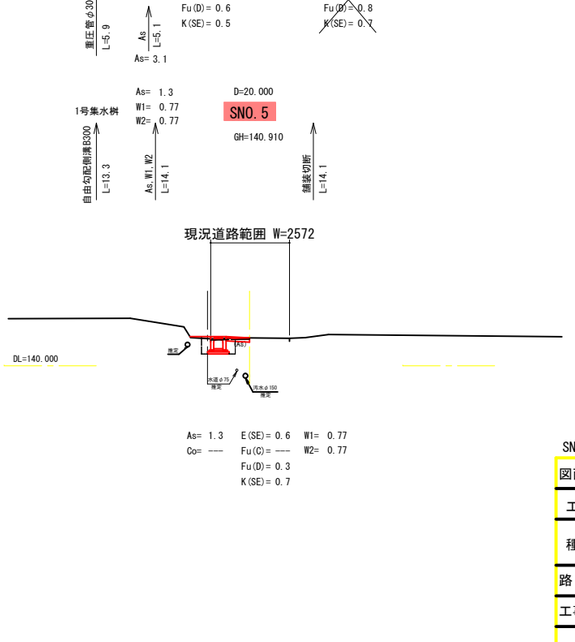

As= 1.3　E(SE)= 0.6　W1= 0.77
Co= ----　Fu(C)= ----　W2= 0.77
Fu(D)= 0.3
K(SE)= 0.7

SNO.0～SEP

図面番号	10 /	縮　尺	1：100
工　種	市道整備事業		
種　別	流末水路横断図	番号	1／1
路線名	道面郷線		
工事箇所	東広島市河内町入野		

東　広　島　市

構造図(1)

W1-S-20-C-1

S=1:20

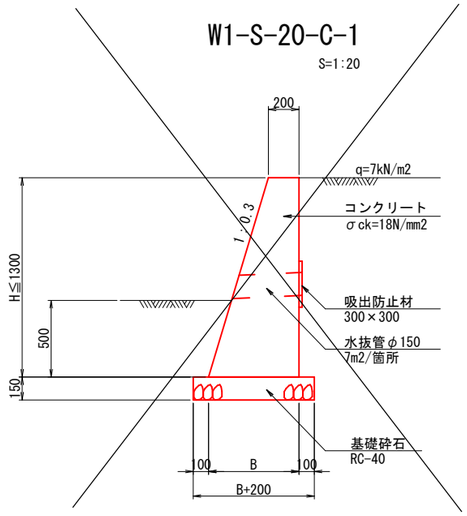

W1-S-25-C-1

S=1:20

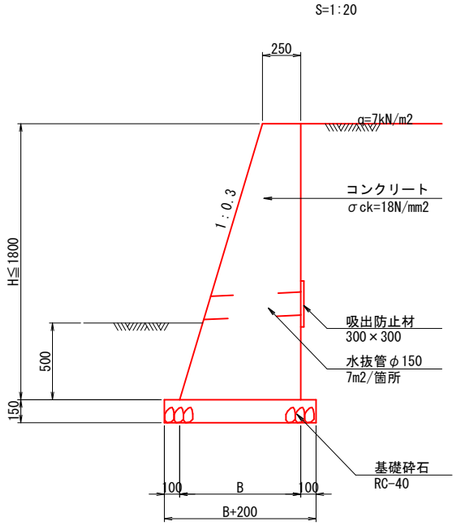

設計条件表（東広島市標準設計）

背面土の種類			備　考
土　　質		S（砂質土）	
せん断抵抗角φ		φ＝30度	
単位体積重量	土	γ＝19kN/m3	
	ｺﾝ	γ＝23kN/m3	
載荷荷重			
載荷重		路肩擁壁 q＝7kN/m2	土留擁壁 q＝0kN/m2
安定条件			
転　　倒		|e|≦B/6(m)	
滑　　動		1.5≦FS	滑動摩擦係数0.6
支　　持		q≦qa(kN/m2)	

※地震時の検討は行わない。

1号重力擁壁

S=1:20

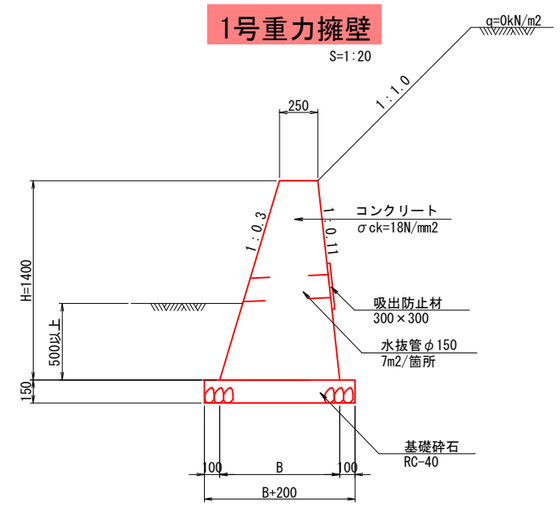

1号ガードレール基礎工

（基礎長L≧10.0m　裏コン100）

S=1:20

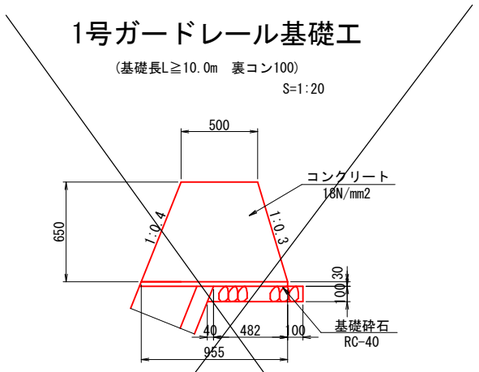

※目地材間隔は10m以上とし、厚さを10mmを標準とする。（ブロック積の目地材とは別）

数量表　　10m当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
基礎砕石	RC-40　t=10cm	m2 m3	6.020 0.602
敷モルタル	1：3	m3	0.290
コンクリート	18N/mm2	m3	4.730
型　　枠	小　型	m2	13.790
目地材	エラスタイト10mm	m2	0.473

2号ガードレール基礎工

（基礎長L≧10.0m　裏コン100）

S=1:20

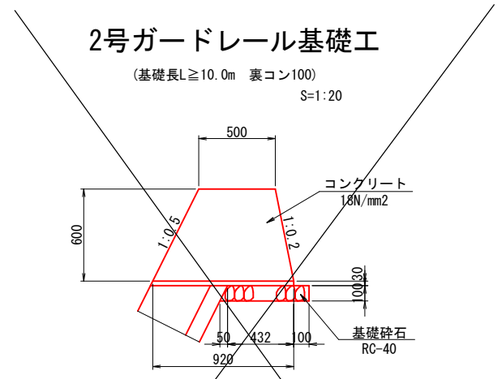

数量表　　10m当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
基礎砕石	RC-40　t=10cm	m2 m3	5.570 0.557
敷モルタル	1：3	m3	0.280
コンクリート	18N/mm2	m3	4.260
型　　枠	小　型	m2	12.827
目地材	エラスタイト10mm	m2	0.426

支柱基礎詳細

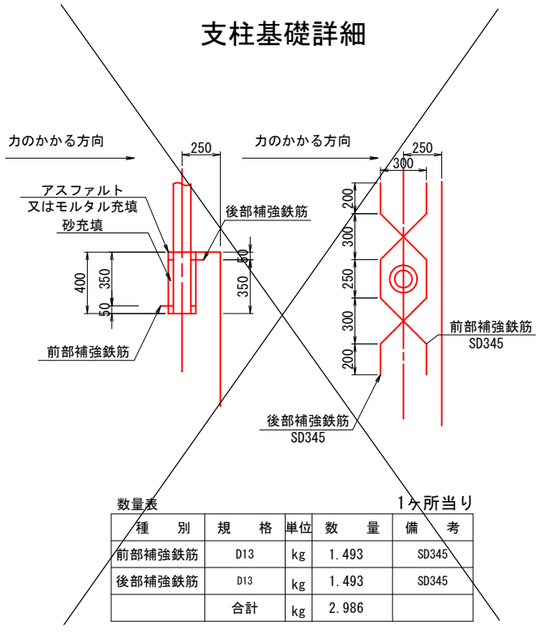

数量表　　1ヶ所当り

種　別	規　格	単位	数　量	備　考
前部補強鉄筋	D13	kg	1.493	SD345
後部補強鉄筋	D13	kg	1.493	SD345
	合計	kg	2.986	

嵩上工

S=1:20

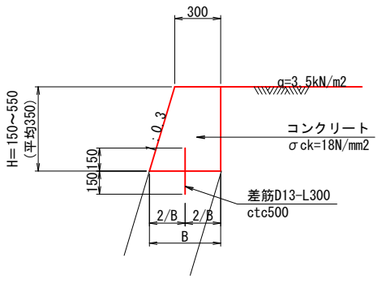

図面番号	11 /	縮　尺	図　示
工　種	市道整備事業		
種　別	構造図(1)	番号	1/10
路線名	道面郷線		
工事箇所	東広島市河内町入野		

東　広　島　市

構造図(2)

1号ブロック積擁壁

S=1:20

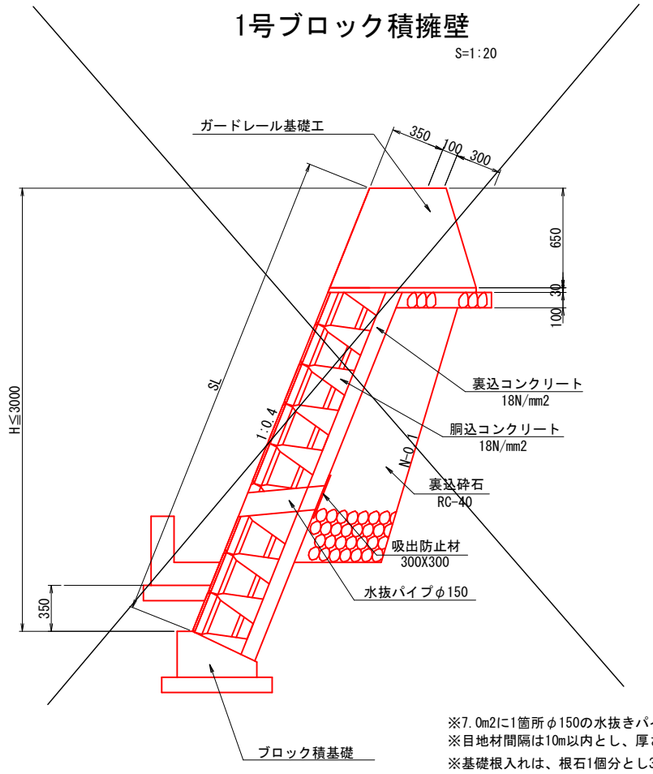

2号ブロック積擁壁

S=1:20

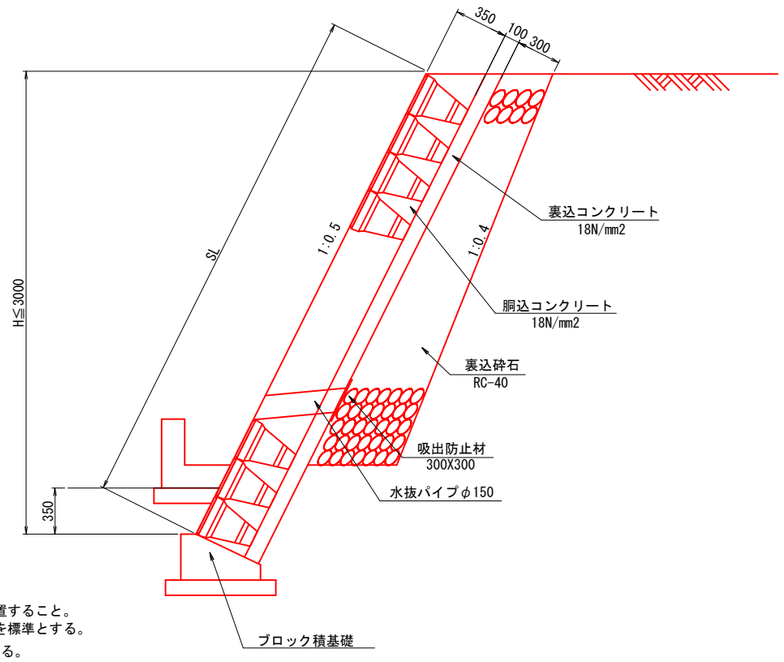

※7.0m2に1箇所φ150の水抜きパイプを設置すること。
※目地材間隔は10m以内とし、厚さを10mmを標準とする。
※基礎根入れは、根石1個分とし350mmとする。

張コンクリート

S=1:20

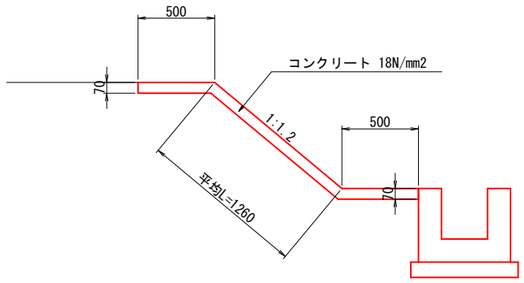

防草対策工

S=1:20



ブロック積基礎

S=1:20

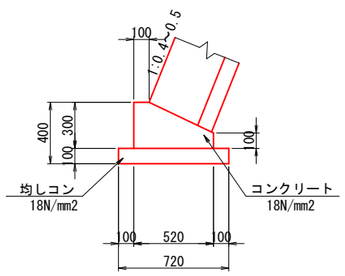

数量表　　10m当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18N/mm2　t=10cm	m2 m3	7.200 0.720
型　枠	均し型枠	m2	2.000
コンクリート	18N/mm2	m3	1.140
型　枠	小　型	m2	4.000
目　地　材	エラスタイト10mm	m2	0.114

1号小口止

S=1:50

NO.0+8.64

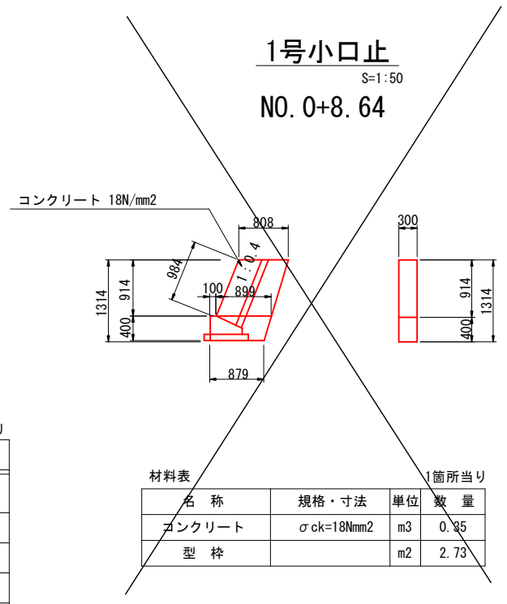

材料表　　1箇所当り

名　称	規格・寸法	単位	数　量
コンクリート	σck=18Nmm2	m3	0.35
型　枠		m2	2.73

2号小口止

S=1:50

NO.4+8.30

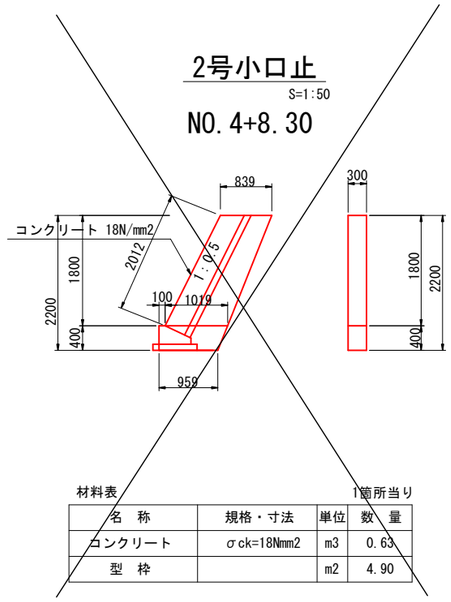

材料表　　1箇所当り

名　称	規格・寸法	単位	数　量
コンクリート	σck=18Nmm2	m3	0.63
型　枠		m2	4.90

天端コンクリート

S=1:20



数量表　　10m当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
コンクリート	18N/mm2	m3	1.15
型　枠	均し型枠	m2	2.24
目　地　材	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m2	0.11

図面番号	12 /	縮　尺	図　示
工　種	市道整備事業		
種　別	構造図(2)	番号	2/10
路線名	道面郷線		
工事箇所	東広島市河内町入野		

東　広　島　市

構造図(3)

S=1:20

PU3-B300-H300



数量表　　10m当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
側　溝	B300-H300-L2000	個	5.000
基礎砕石	RC-40　t=10cm	m2 m3	5.600 0.560
敷モルタル	1:3	m3	0.108

1号U型水路

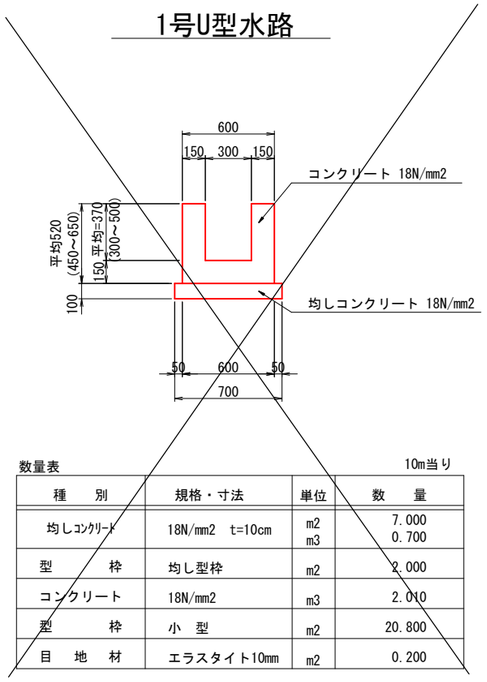

数量表　　10m当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18N/mm2　t=10cm	m2 m3	7.000 0.700
型　枠	均し型枠	m2	2.000
コンクリート	18N/mm2	m3	2.010
型　枠	小　型	m2	20.800
目　地　材	エラスタイト10mm	m2	0.200

2号U型水路

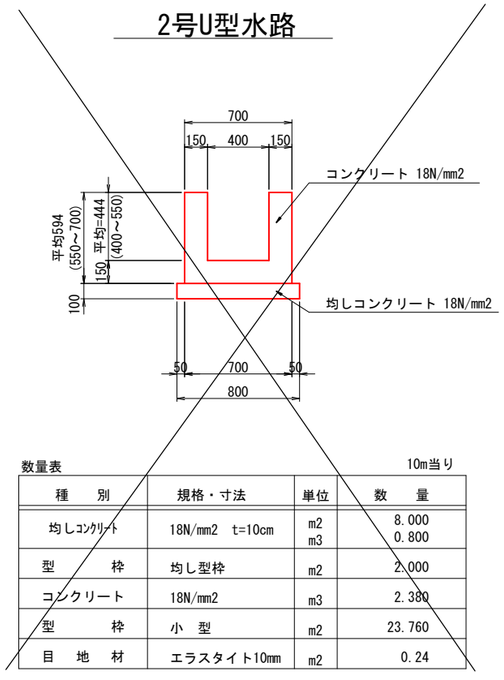

数量表　　10m当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18N/mm2　t=10cm	m2 m3	8.000 0.800
型　枠	均し型枠	m2	2.000
コンクリート	18N/mm2	m3	2.380
型　枠	小　型	m2	23.760
目　地　材	エラスタイト10mm	m2	0.24

PU1-B300-H300



数量表　　10m当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
側　溝	PU1-B300-H300	個	16.500
基礎砕石	RC-40　t=10cm	m2 m3	5.000 0.500
敷モルタル	1:3	m3	0.090

1号U型水路(蓋設置部)

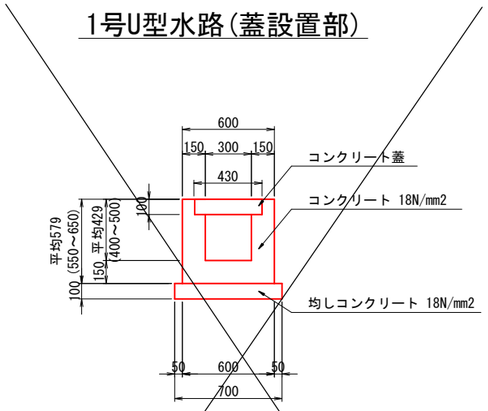

数量表　　10m当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18N/mm2　t=10cm	m2 m3	7.000 0.700
型　枠	均し型枠	m2	2.000
コンクリート	18N/mm2	m3	2.190
型　枠	小　型	m2	23.160
目　地　材	エラスタイト10mm	m2	0.220
コンクリート蓋	B300用	枚	20.0

2号U型水路(蓋設置部)

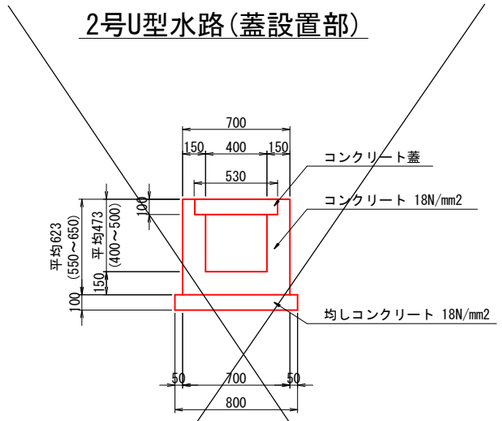

数量表　　10m当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18N/mm2　t=10cm	m2 m3	8.000 0.800
型　枠	均し型枠	m2	2.000
コンクリート	18N/mm2	m3	2.470
型　枠	小　型	m2	24.920
目　地　材	エラスタイト10mm	m2	0.250
コンクリート蓋	B400用	枚	20.0

図面番号	13 /	縮　尺	1:20
工　種	市道整備事業		
種　別	構造図(3)	番号	3/10
路線名	道面郷線		
工事箇所	東広島市河内町入野		

東　広　島　市

構造図(4)

S=1:20

1号L型水路

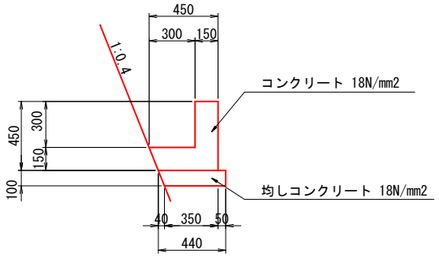

数量表　　10m当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18N/mm2　t=10cm	m2 m3	4.200 0.420
型　枠	均し型枠	m2	1.000
コンクリート	18N/mm2	m3	1.080
型　枠	小　型	m2	9.000
目　地　材	エラスタイト10mm	m2	0.108

横断用B300-H300

グレーチングボルト固定タイプ

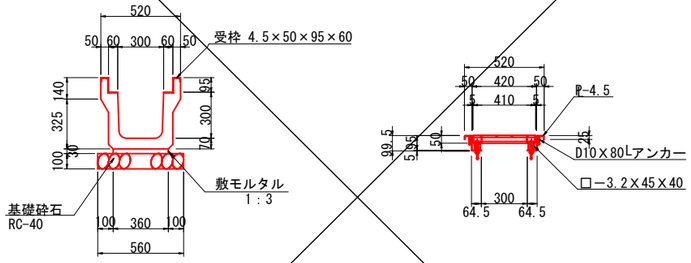

数量表　　10m当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
側　溝	B300-H300-L2000	個	5.000
基礎砕石	RC-40　t=10cm	m2 m3	5.600 0.560
敷モルタル	1：3	m3	0.108
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	B300用	枚	10.000

取水水路

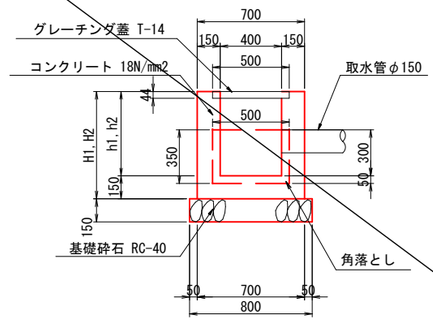

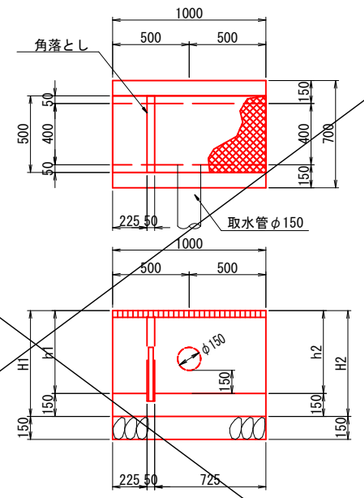

数量表　　1箇所当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
基礎砕石	RC-40　t=15cm	m2 m3	0.800 1.200
コンクリート	18N/mm2	m3	0.266
型　枠	小　型	m2	2.744
せ　き　板	500×350×30	枚	1.000
グレーチング	B400　T-14	枚	1.000

寸法表

測　点	h1	H1	h2	H2
SNO.0+9.1(左)	540	690	538	688
SNO.0+11.3(左)	537	687	535	635
SNO.2+6.3(左)	529	679	538	688
平　均	535	685	537	687

2号L型水路

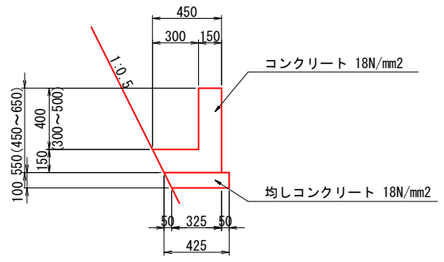

数量表　　10m当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18N/mm2　t=10cm	m2 m3	4.000 0.400
型　枠	均し型枠	m2	1.000
コンクリート	18N/mm2	m3	1.219
型　枠	小　型	m2	11.000
目　地　材	エラスタイト10mm	m2	0.122

田面排水ボックス

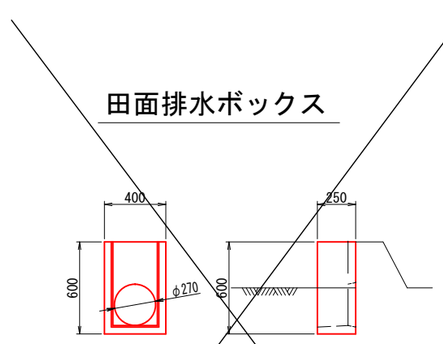

数量表　　1箇所m当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
田面排水ボックス	600型	個	1.000
止水板	150×330×25	枚	2.000

管接続工



数量表　　1箇所当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
コンクリート	18N/mm2	m3	0.227
型　枠	小　型	m2	1.646

図面番号	14 /	縮　尺	1：20
工　種	市道整備事業		
種　別	構造図(4)	番号	4/10
路線名	道面郷線		
工事箇所	東広島市河内町入野		

東　広　島　市

構造図(5)

S=1:20

1号集水桝

B500-L500-H600

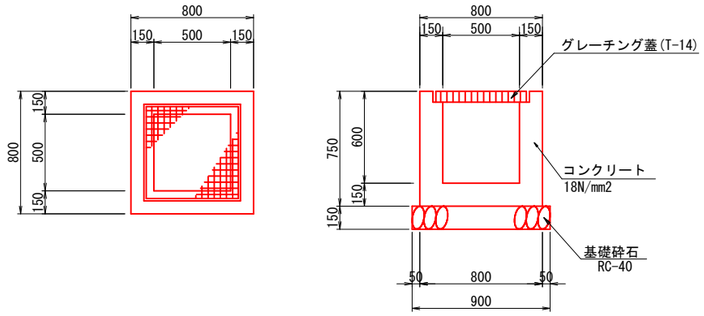

数量表　　1式当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
コンクリート	18N/mm2	m3	0.330
型　枠		m2	3.900
基礎砕石	RC-40　t=15cm	m2 m3	0.810 0.122
グレーチング蓋	T-14,並目	式	1.000

流出、流入状況

測　点	①	②	③	④
ANO.0+12.6(左)	現況水路	---	PU3-B300-H300	---

2号集水桝

B500-L1200-H600

ANO.0+6.9

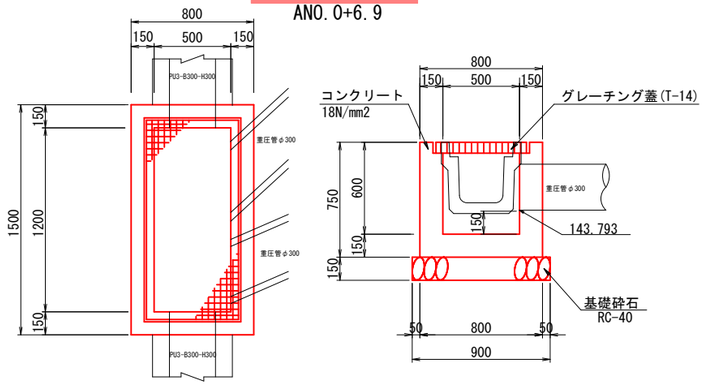

数量表　　1式当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
コンクリート	18N/mm2	m3	0.540
型　枠		m2	6.000
基礎砕石	RC-40　t=15cm	m2 m3	1.440 0.216
グレーチング蓋	T-14,並目,2分割	式	1.000

3号集水桝(2)

B500-L300-H500

(ブロック積1:0.4)

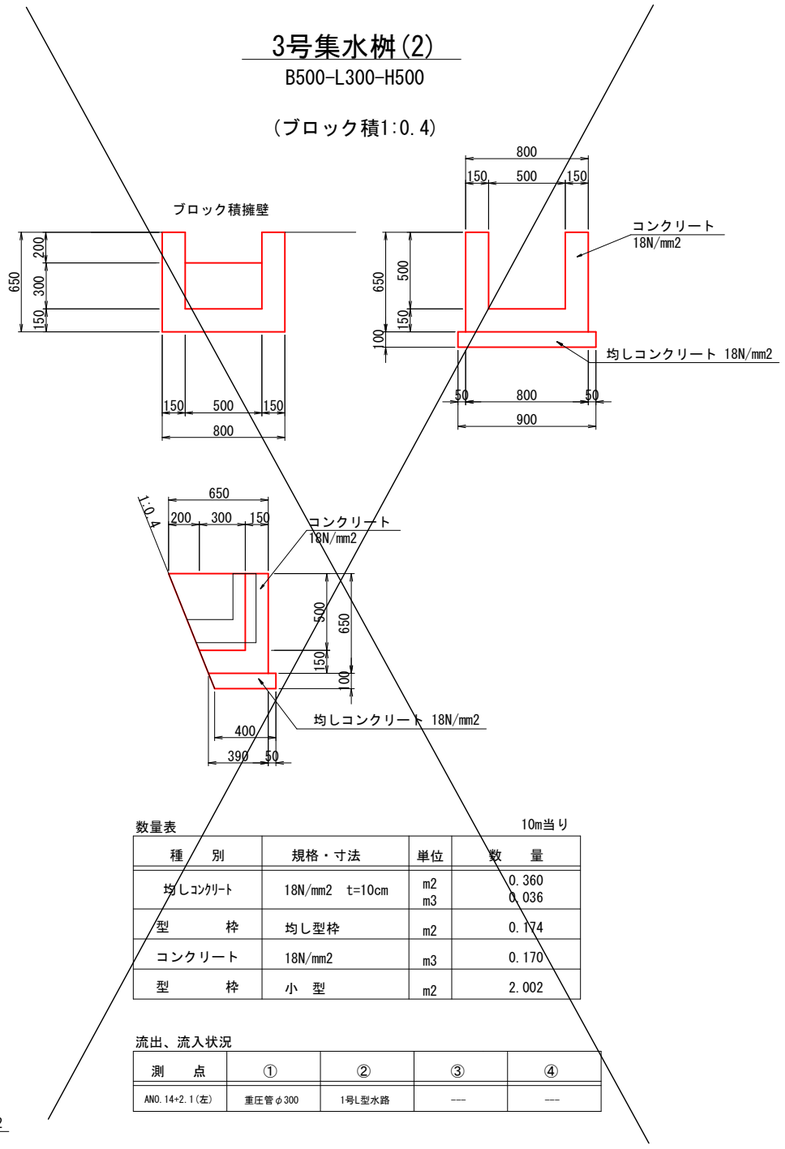

数量表　　10m当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18N/mm2　t=10cm	m2 m3	0.360 0.036
型　枠	均し型枠	m2	0.174
コンクリート	18N/mm2	m3	0.170
型　枠	小　型	m2	2.002

流出、流入状況

測　点	①	②	③	④
ANO.14+2.1(左)	重圧管φ300	1号L型水路	---	---

4号集水桝(1)

B500-L500-H1000

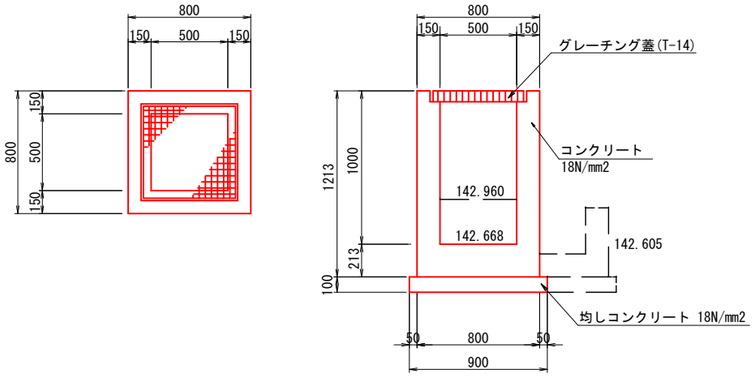

数量表　　1式当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
コンクリート	18N/mm2	m3	0.526
型　枠		m2	6.308
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18N/mm2　t=10cm	m3	0.081
型　枠		m2	0.360
グレーチング蓋	T-14,並目	式	1.000

3号集水桝(1)

B500-L300-H500

(ブロック積1:0.5)

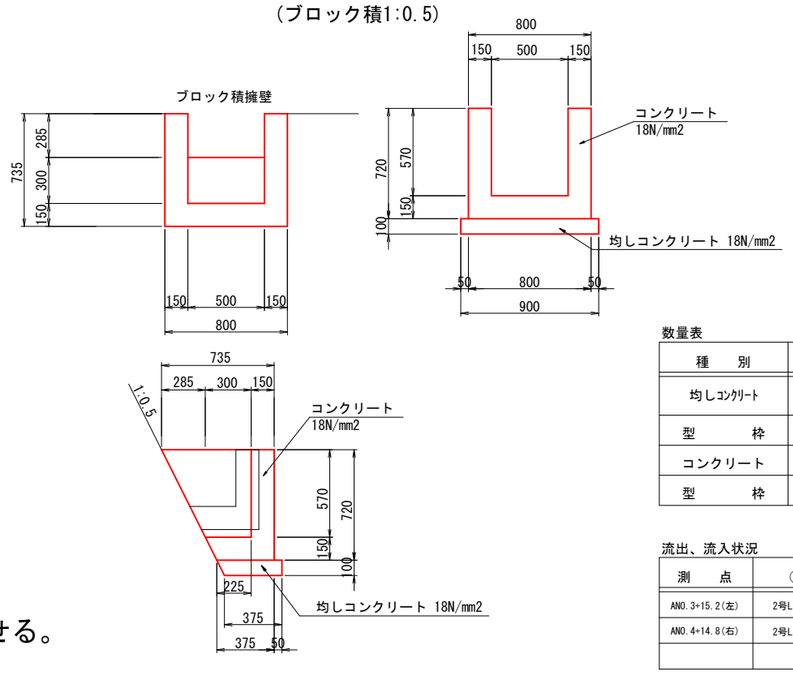

数量表　　1式当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18N/mm2　t=10cm	m2 m3	0.360 0.036
型　枠	均し型枠	m2	0.170
コンクリート	18N/mm2	m3	0.194
型　枠	小　型	m2	2.318

流出、流入状況

測　点	①	②	③	④
ANO.3+15.2(左)	2号L型水路	重圧管φ300	---	---
ANO.4+14.8(右)	2号L型水路	重圧管φ300	2号L型水路	---

※縦断勾配のある箇所に設置する桝は、天端を縦断勾配に合わせる。
（この時桝の高さは、桝中心での高さとする）

図面番号	15 /	縮　尺	1：20
工　種	市道整備事業		
種　別	構造図(5)	番号	5/10
路線名	道面郷線		
工事箇所	東広島市河内町入野		

東　広　島　市

構造図(6)

S=1:20

4号集水桝(2)
B500-L500-H1000

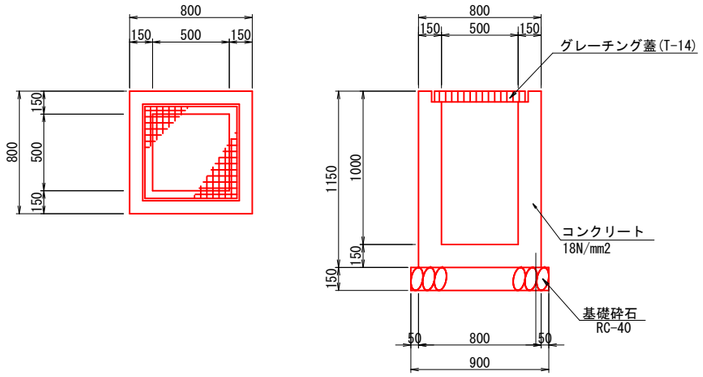

数量表　　1式当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
コンクリート	18N/mm2	m3	0.486
型　枠		m2	5.980
基礎砕石	RC-40　t=15cm	m2 m3	0.810 0.122
グレーチング蓋	T-14,並目	式	1.000

流出、流入状況

測　点	①	②	③	④
ANO.4+18.4(左)	PU3-B300-H300 塩ビ管φ200	重圧管φ200	PU3-B300-H300	塩ビ管φ100

5号集水桝
B600-L600-H900

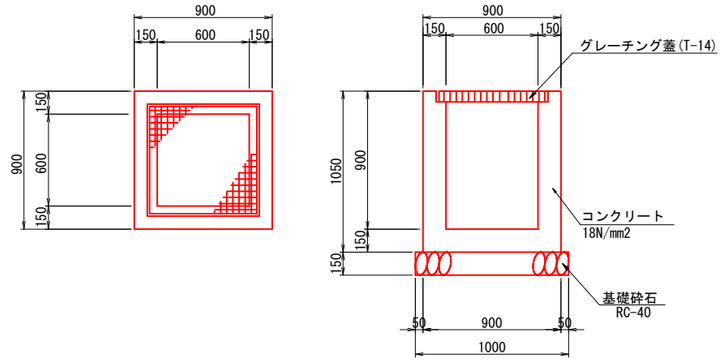

数量表　　1式当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
コンクリート	18N/mm2	m3	0.527
型　枠		m2	6.300
基礎砕石	RC-40　t=15cm	m2 m3	1.000 0.150
グレーチング蓋	T-14,並目	式	1.000

流出、流入状況

測　点	①	②	③	④
ANO.5+9.1(左)	---	---	塩ビ管φ200	---

※現況の流入管は全て接続する。

6号集水桝
B500-L500-H600

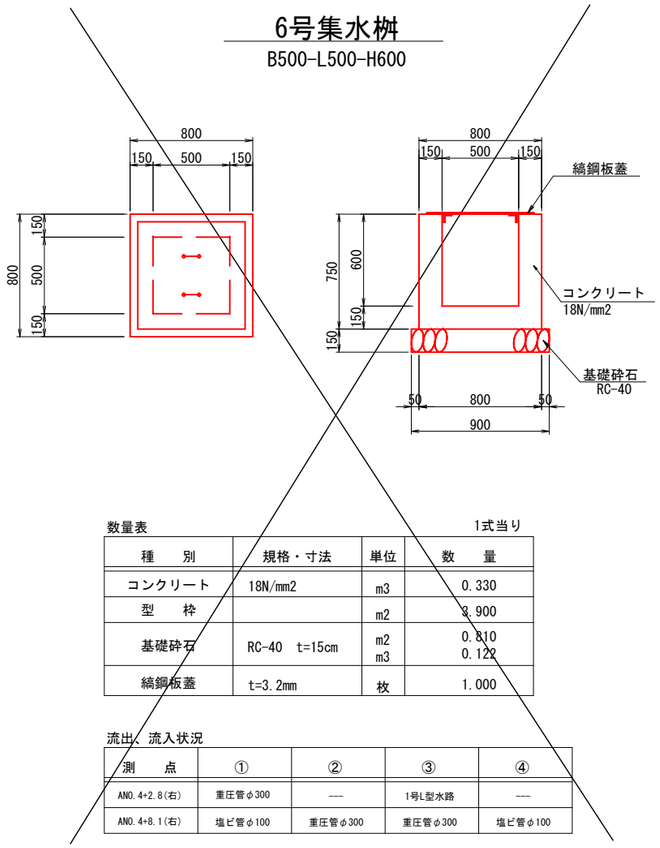

数量表　　1式当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
コンクリート	18N/mm2	m3	0.330
型　枠		m2	3.900
基礎砕石	RC-40　t=15cm	m2 m3	0.810 0.122
縞鋼板蓋	t=3.2mm	枚	1.000

流出、流入状況

測　点	①	②	③	④
ANO.4+2.8(右)	重圧管φ300	---	1号L型水路	---
ANO.4+8.1(右)	塩ビ管φ100	重圧管φ300	重圧管φ300	塩ビ管φ100

7号集水桝
B500-L500-H

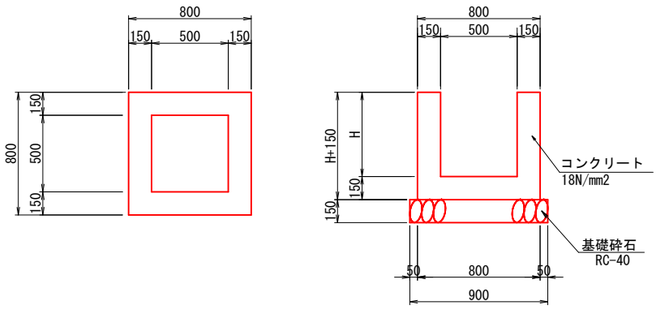

数量表(H=500)　　1式当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
コンクリート	18N/mm2	m3	0.291
型　枠		m2	3.380
基礎砕石	RC-40　t=15cm	m2 m3	0.810 0.122

数量表(H=600)　　1式当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
コンクリート	18N/mm2	m3	0.330
型　枠		m2	3.900
基礎砕石	RC-40　t=15cm	m2 m3	0.810 0.122

流出、流入状況

測　点	H	①	②	③	④
ANO.7+17.7(右)	600	---	塩ビ管φ150	---	2号L型水路
ANO.11+19.8(右)	500	PU1-B300-H300	1号U型水路	---	---
ANO.12+12.5(右)	500	---	重圧管φ300	---	1号U型水路
ANO.12+18.6(右)	500	---	1号U型水路	---	重圧管φ300
ANO.13+12.3(右)	500	---	重圧管φ300	---	1号U型水路
BNO.0+7.4(右)	600	重圧管φ300	1号U型水路	---	1号U型水路

8号集水桝
B500-L500-H1300

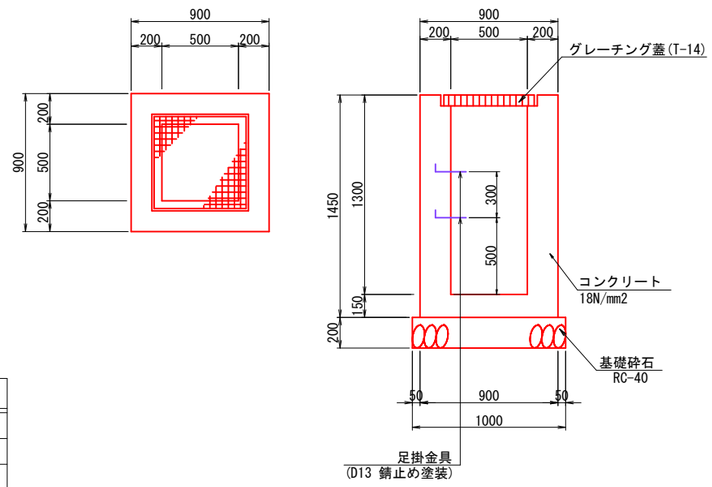

数量表　　1式当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
コンクリート	18N/mm2	m3	0.850
型　枠		m2	8.120
基礎砕石	RC-40　t=20cm	m2 m3	1.000 0.200
グレーチング蓋	T-14,並目	式	1.000
足掛金具	D13 錆止め塗装	個	2.000

流出、流入状況

測　点	①	②	③	④
ANO.9+1.4(右)	---	PU1-B300-H300	---	PU3-B300-H300

※縦断勾配のある箇所に設置する桝は、天端を縦断勾配に合わせる。
（この時桝の高さは、桝中心での高さとする）

図面番号	16 /	縮　尺	1 : 20
工　種	市道整備事業		
種　別	構造図(6)	番号	6/10
路線名	道面郷線		
工事箇所	東広島市河内町入野		

東　広　島　市

構造図(7)

S=1:20

9号集水桝

B600-L600-H1500

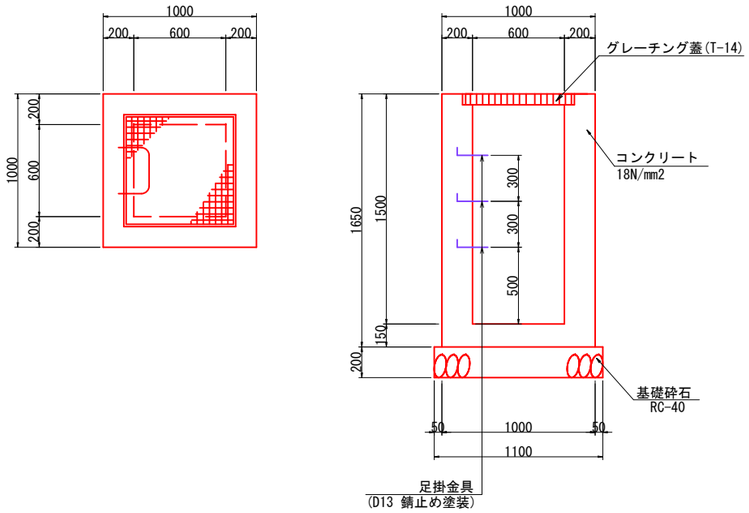

数量表　　1式当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
コンクリート	18N/mm2	m3	1.110
型　枠		m2	10.560
基礎砕石	RC-40　t=20cm	m2 m3	1.210 0.242
グレーチング蓋	T-14,並目	式	1.000
足掛金具	D13 錆止め塗装	個	3.000

流出、流入状況

測　点	①	②	③	④
ANO.13+15.2(右)	重圧管φ300	重圧管φ300	重圧管φ300	重圧管φ300
ANO.14+2.1(右)	重圧管φ300	---	重圧管φ300	---

10号集水桝

B500-L500-H700

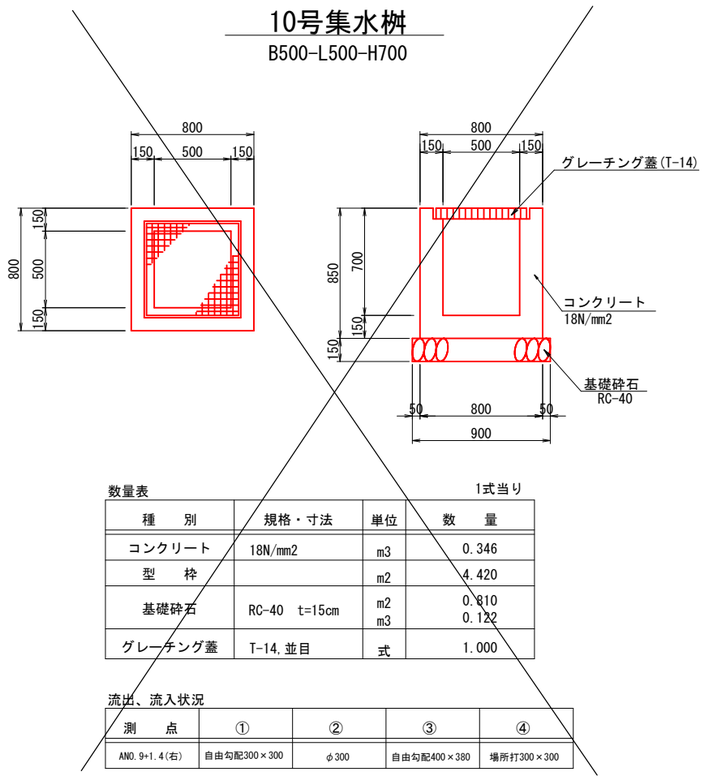

数量表　　1式当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
コンクリート	18N/mm2	m3	0.346
型　枠		m2	4.420
基礎砕石	RC-40　t=15cm	m2 m3	0.810 0.122
グレーチング蓋	T-14,並目	式	1.000

流出、流入状況

測　点	①	②	③	④
ANO.9+1.4(右)	自由勾配300×300	φ300	自由勾配400×380	場所打300×300

11号集水桝

B500-L500-H1100

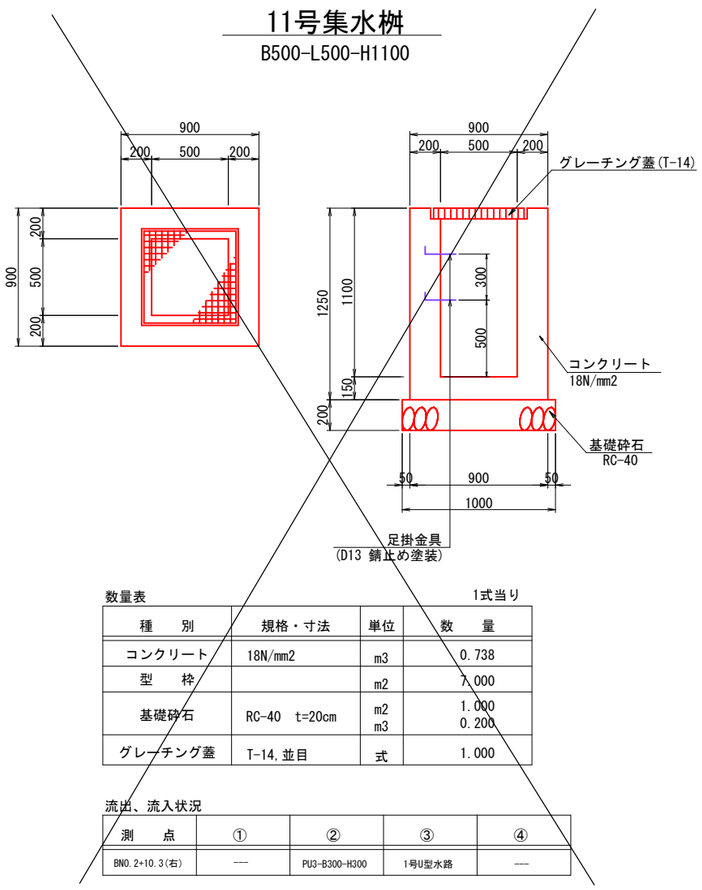

数量表　　1式当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
コンクリート	18N/mm2	m3	0.738
型　枠		m2	7.000
基礎砕石	RC-40　t=20cm	m2 m3	1.000 0.200
グレーチング蓋	T-14,並目	式	1.000

流出、流入状況

測　点	①	②	③	④
BNO.2+10.3(右)	---	PU3-B300-H300	1号U型水路	---

12号集水桝

B600-L600-H700

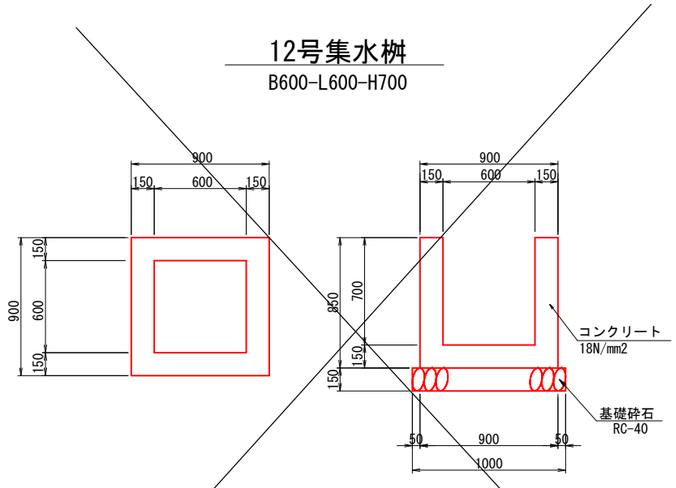

数量表　　1式当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
コンクリート	18N/mm2	m3	0.437
型　枠		m2	5.100
基礎砕石	RC-40　t=15cm	m2 m3	0.810 0.122

流出、流入状況

測　点	①	②	③	④
BNO.3　(右)	PU3-B300-H300	重圧管φ300	1号U型水路	場所打300×300

※縦断勾配のある箇所に設置する桝は、天端を縦断勾配に合わせる。
（この時桝の高さは、桝中心での高さとする）

図面番号	17 /	縮　尺	1：20
工　種	市道整備事業		
種　別	構造図(7)	番号	7/10
路線名	道面郷線		
工事箇所	東広島市河内町入野		

東　広　島　市

構造図(8)

S=1:20

13号集水桝

B600-L600-H700

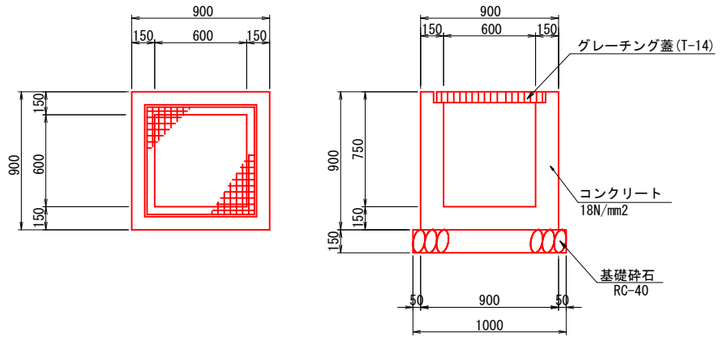

数量表　　1式当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
コンクリート	18N/mm2	m3	0.385
型　枠		m2	5.400
基礎砕石	RC-40　t=15cm	m2 m3	1.000 0.150
グレーチング蓋	T-14,並目	式	1.000

流出、流入状況

測　点	①	②	③	④
BNO.5+16.5(右)	2号U型400×421	横断溝400×552	1号U型300×546	---
BNO.5+16.5(左)	横断溝400×595	自由勾配300×300	自由勾配400×490	---

縞鋼板蓋

S=1/20

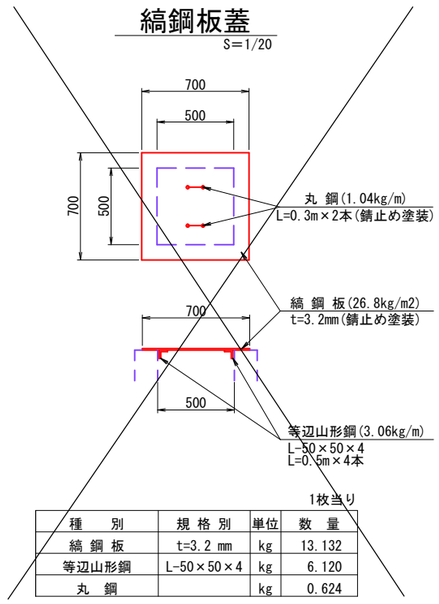

1枚当り

種　別	規 格 別	単位	数　量
縞　鋼　板	t=3.2 mm	kg	13.132
等辺山形鋼	L-50×50×4	kg	6.120
丸　鋼		kg	0.624

地下排水管理桝

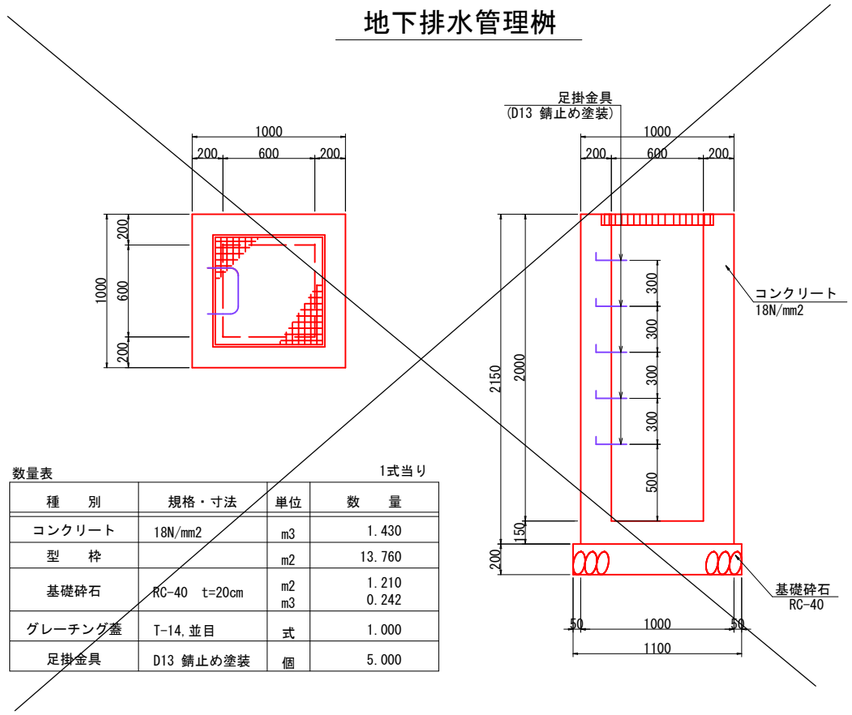

数量表　　1式当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
コンクリート	18N/mm2	m3	1.430
型　枠		m2	13.760
基礎砕石	RC-40　t=20cm	m2 m3	1.210 0.242
グレーチング蓋	T-14,並目	式	1.000
足掛金具	D13 錆止め塗装	個	5.000

U2(GL)-B300-H300

縮尺=1:20

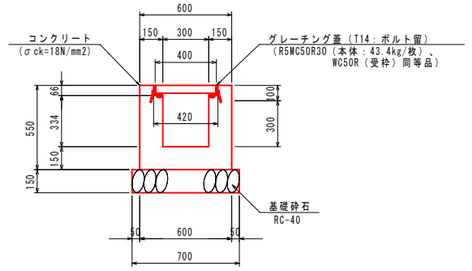

数量表　(U2(GL)-B300-H300)　　10m当り

名　称	規格寸法	単位	数　量	摘　要
コンクリート	18-8-40	m3	2.021	
型　枠	小　型	m2	22.00	
基礎砕石	RC-40　t=15cm	m2	7.00	
グレーチング蓋	T-14 R5WC50R30同等品	枚	10.00	

※縦断勾配のある箇所に設置する桝は、天端を縦断勾配に合わせる。
（この時桝の高さは、桝中心での高さとする）

AS桝

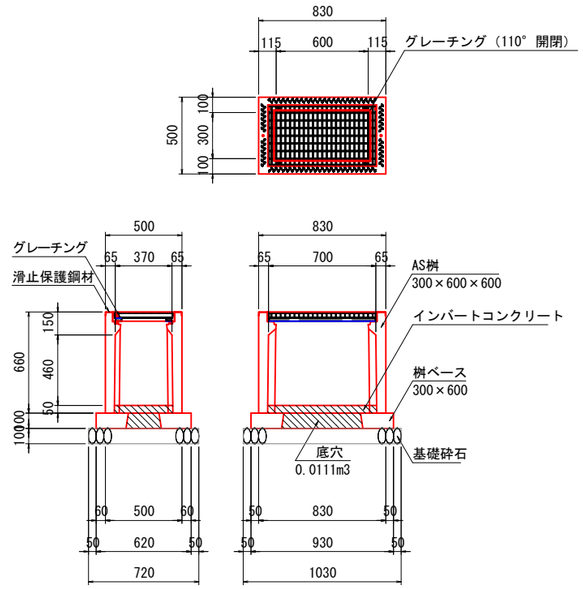

数量表　　1基当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
AS桝	300×600	個	1
グレーチング	普通目,110° 開閉	枚	1
桝ベース	300×600用	個	1
基礎砕石	RC-40	m2 m3	0.742 0.074
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	18N/mm2	m3	0.024

図面番号	18 /	縮　尺	1：20
工　種	市道整備事業		
種　別	構造図(8)	番号	8/10
路線名	道面郷線		
工事箇所	東広島市河内町入野		

東　広　島　市

構造図(9)

ガードレール

ガードレール Gr-C-4E

平面図・正面図 S=1:30

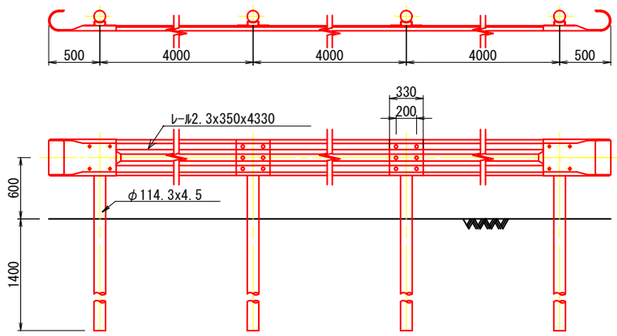

側面図 S=1:20

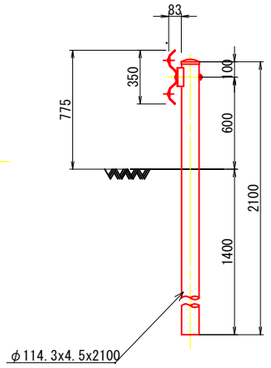

ガードレール Gr-C-2B

平面図・正面図 S=1:30

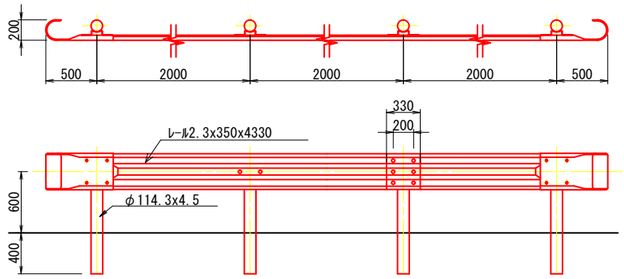

側面図 S=1:20

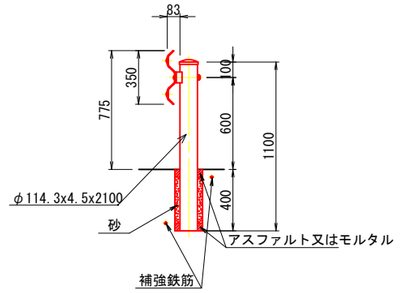

目隠しフェンス 参考図 S=1:20

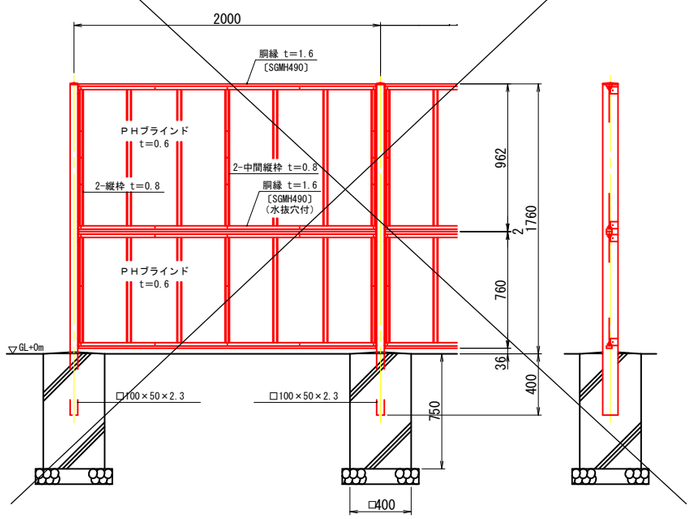

アスカーブ S=1:20



アスカーブ 10m当り

名　　称	規　　格	数　量
細粒度アスコン	13mm	0.225 m3
タックコート	PK-4　0.4 (L/m2)	2.000 ㎡

図面番号	19 /	縮尺	図示
工種	市道整備事業		
種別	構造図(9)	番号	9/10
路線名	道面郷線		
工事箇所	東広島市河内町入野		

東広島市

構造図(10)

S=1:20

重圧管D300 (参考図)

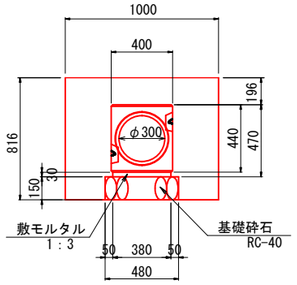

数量表　　10m当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
管	重圧管　φ300	個	5.000
基礎砕石	RC-40　t=15cm	m2 m3	4.800 0.720
敷モルタル	1：3	m3	0.114

流出、流入状況

測　点	施工延長	流入高	流出高	平均管底高	地盤高(平均)	平均土被り	平均土被り×延長
ANO.0+3.3(横断)	10.000	143.793	143.020	143.407	143.68	-0.097	-0.970
ANO.0+4.1(左)	4.600	143.800	143.380	143.590	143.60	-0.360	-1.656
ANO.13+15.9(横断)	6.600	142.590	142.330	142.460	143.16	0.330	2.178
ANO.13+13.5(縦断)	2.500	141.500	141.490	141.495	142.03	0.165	0.412
ANO.13+18.6(縦断)	6.700	141.900	141.490	141.695	142.87	0.805	5.394
SNO.6+14.1(縦断)	10.300	141.490	141.160	141.325	141.95	0.255	2.627
延長合計	L=40.70m	平均土被り＝7.985/40.70＝0.196m				合計	7.985

※地盤高は、平面地形高からの推定高さ。

重圧管D200 (参考図)



数量表　　10m当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
管	重圧管　φ200	個	5.000
基礎砕石	RC-40　t=15cm	m2 m3	4.000 0.600
敷モルタル	1：3	m3	0.090

流出、流入状況

測　点	施工延長	流入高	流出高	平均管底高	地盤高(平均)	平均土被り
ANO.4+17.2(横断)	8.300	145.310	143.670	144.490	144.55	-0.195

※地盤高は、平面地形高からの推定高さ。

重圧管D150 (参考図)

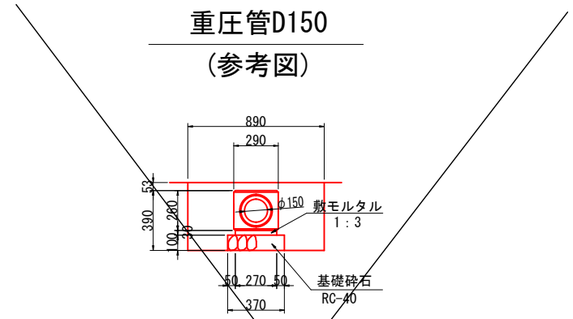

数量表　　10m当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
管	重圧管　φ150	個	5.000
基礎砕石	RC-40　t=10cm	m2 m3	3.700 0.370
敷モルタル	1：3	m3	0.081

流出、流入状況

測　点	施工延長	流入高	流出高	平均管底高	地盤高(平均)	平均土被り
ANO.0+3.3(横断)	10.000	143.793	143.050	143.422	143.68	0.053

※地盤高は、平面地形高からの推定高さ。

P1-RC1-D300



数量表　　10m当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
管	φ300	本	5.000
基礎砕石	RC-40　t=15cm	m2 m3	7.000 1.050
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.688
型　枠		m2	3.200

図面番号	20 /	縮　尺	1：20
工　種	市道整備事業		
種　別	構造図(10)	番号	10／10
路線名	道面郷線		
工事箇所	東広島市河内町入野		

東　広　島　市

取水水路構造図

S=1:20

1号取水水路

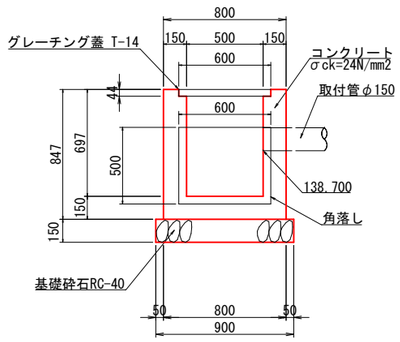

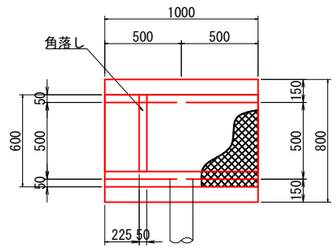

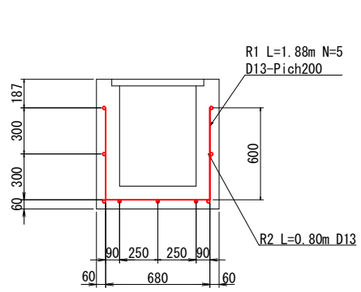

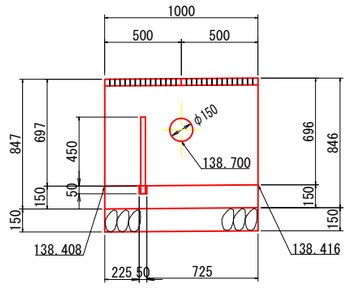

R1 D13 L=1880 N=5本

R2 D13 L=800 N=9本



数量表　　1箇所当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
基礎砕石	RC-40　t=15cm	m2 m3	0.900 0.135
コンクリート	24N/mm2	m3	0.329
型　枠	小　型	m2	3.086
鉄　筋	SD345 D13	kg	16.6
せ き 板	500×600×30	枚	1.000
グレーチング	B500 T-14 L=500	枚	2.000

2号取水水路

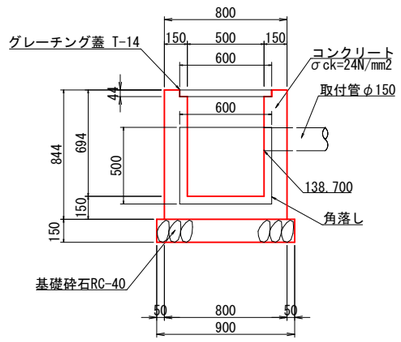

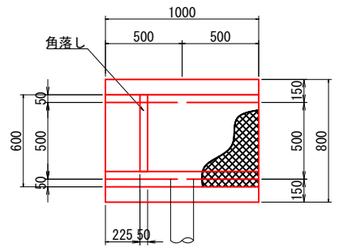

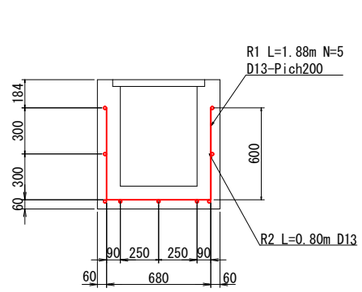

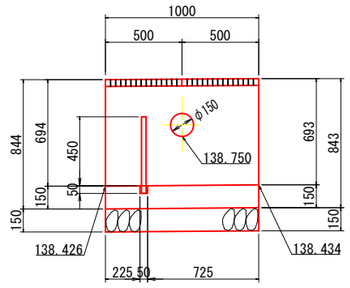

R1 D13 L=1880 N=5本

R2 D13 L=800 N=9本



数量表　　1箇所当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
基礎砕石	RC-40　t=15cm	m2 m3	0.900 0.135
コンクリート	24N/mm2	m3	0.328
型　枠	小　型	m2	3.074
鉄　筋	SD345 D13	kg	16.6
せ き 板	500×600×30	枚	1.000
グレーチング	B500 T-14 L=500	枚	2.000

3号取水水路

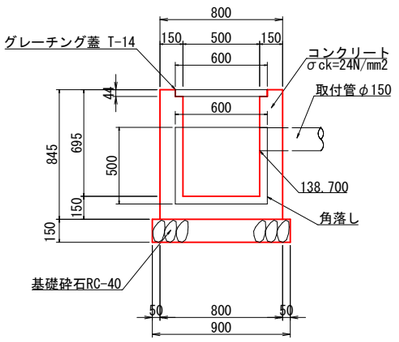

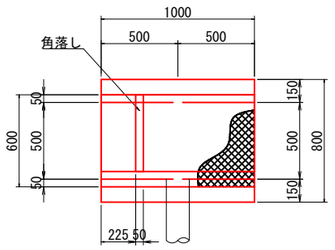

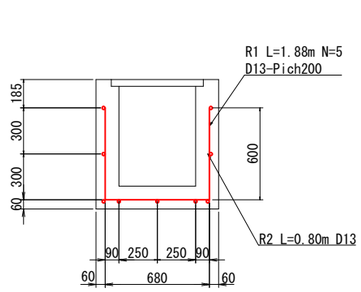

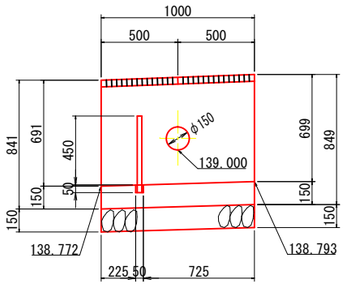

R1 D13 L=1880 N=5本

R2 D13 L=800 N=9本



数量表　　1箇所当り

種　別	規格・寸法	単位	数　量
基礎砕石	RC-40　t=15cm	m2 m3	0.900 0.135
コンクリート	24N/mm2	m3	0.329
型　枠	小　型	m2	3.080
鉄　筋	SD345 D13	kg	16.6
せ き 板	500×600×30	枚	1.000
グレーチング	B500 T-14 L=500	枚	2.000

図面番号	21 /	縮　尺	S=1:20
工　種	市道整備事業		
種　別	場所打ち水路構造図	番号	/
路線名	道面郷線		
工事箇所	東広島市河内町入野		

東　広　島　市

小型重力式擁壁一般図

正　面　図

S=1:50

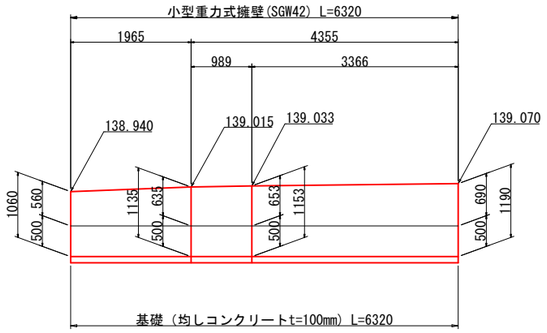

DL=135.000

断　面　図

S=1:20

SGW42

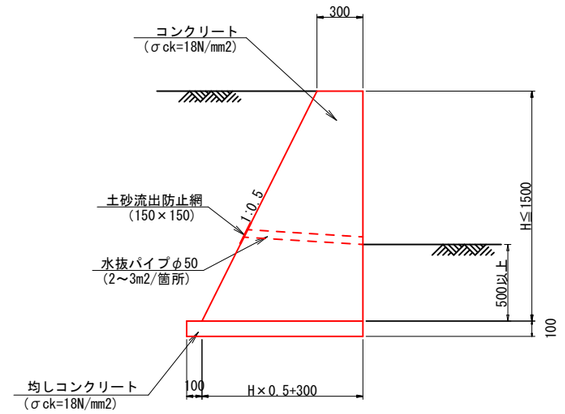

DL=135.000

平　面　図

S=1:50

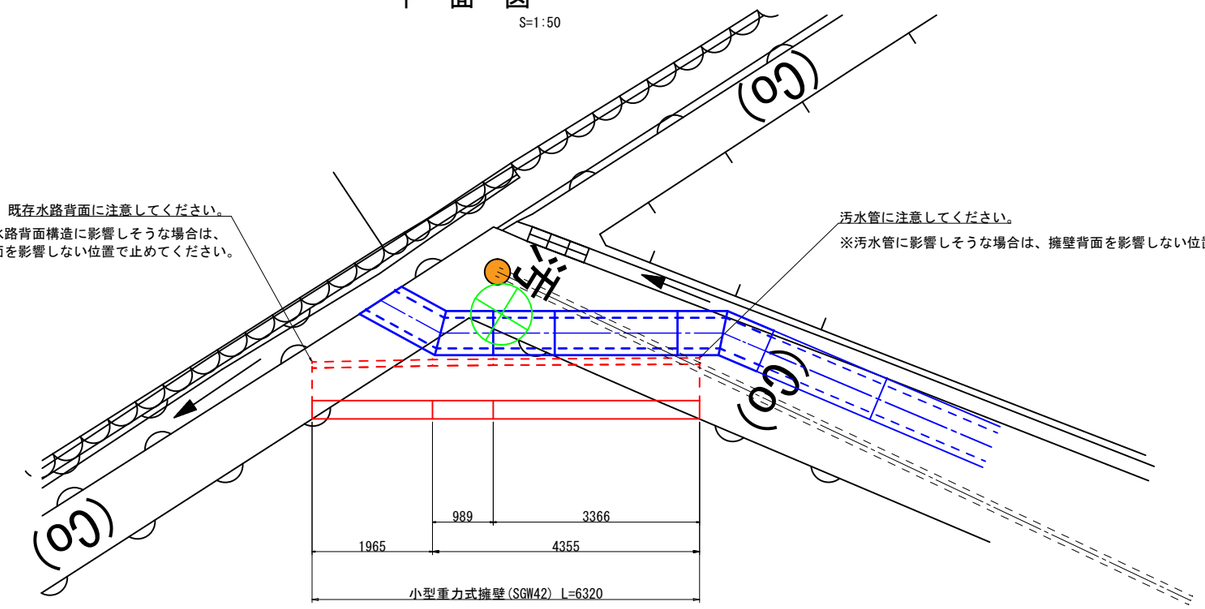

図面番号	22 /	縮　尺	図　示
工　種	市道整備事業		
種　別	小型重力式擁壁一般図	番号	1／1
路線名	道面郷線		
工事箇所	東広島市河内町入野		

東　広　島　市

自由勾配側溝参考割付図（参考図）
(1/5)

平　面　図　S=1：50

※施工時の伸びを製品1本当り3㎜見込みます。

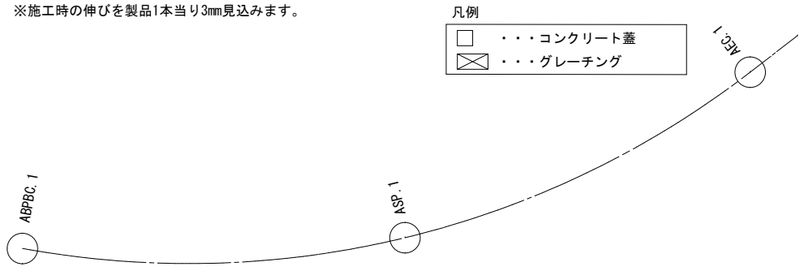

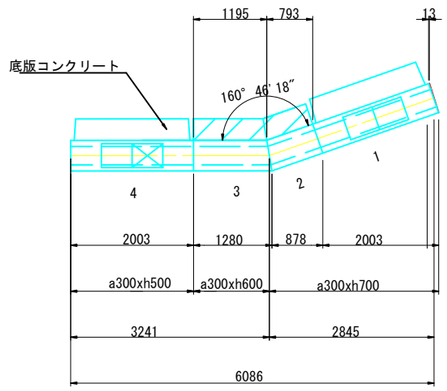

縦　断　図　S=1：50

※施工時の伸びを製品1本当り3㎜見込みます。

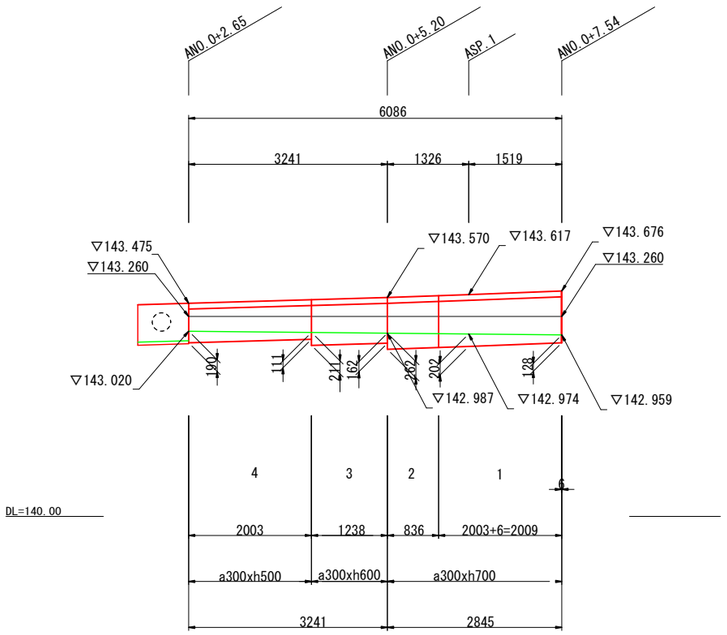

標準断面図　S=1:20
土留タイプ

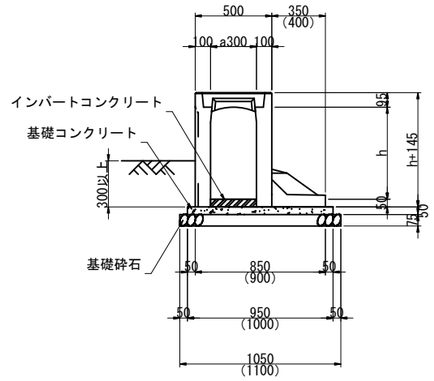

※（　）内寸法は、h700の場合を示します。

標準断面図　S=1:20
土留（暗渠）タイプ

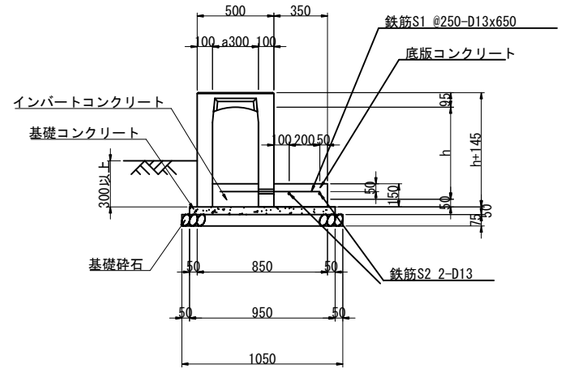

※（　）内寸法は、h700の場合を示します。

数　量　表

種　別	a	h	L	製品番号	数　量	備　考
土　留	300	500	2000	4	1	
		700	2000	1	1	
暗渠土留	300	600	1192/1277	3	1	斜　切
		700	875/790	2	1	斜　切
合　計					4	
コンクリート蓋		300用-L 500（車道用）			3	
グレーチング		300用-L 500（車道用）			1	

材　料　表　　施工延長当たり

名　称	規　格	数　量
インバートコンクリート	σck=18N／mm²	0.327　m³
基礎コンクリート	σck=18N／mm²	0.294　m³
同上型枠		0.609　m²
基礎砕石	RC-40 t=75mm	6.491　m²
底版コンクリート	σck=24N／mm²	0.109　m³
同上型枠		0.311　m²
鉄筋 S1	D13（SD345）	5.365　kg
鉄筋 S2	D13（SD345）	4.127　kg

図面番号	23 /	縮　尺	図示
工　種	市道整備事業		
種　別	自由勾配側溝参考割付図	番号	1／5
路線名	道面郷線		
工事箇所	東広島市河内町入野		
東　広　島　市			

自由勾配側溝参考割付図（参考図）
(2/5)

凡例
□ ・・・コンクリート蓋
⊠ ・・・グレーチング

平　面　図　S=1：100
※施工時の伸びを製品1本当り3mm見込みます。

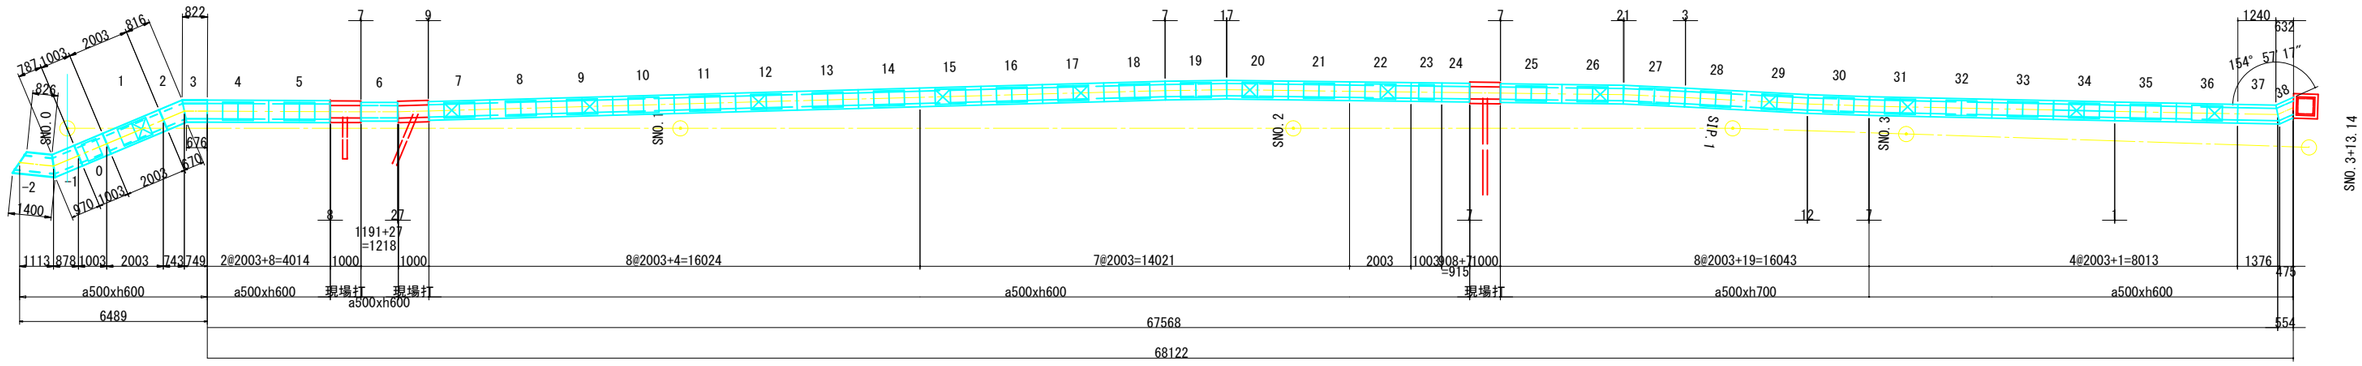

縦　断　図　S=1：100
※施工時の伸びを製品1本当り3mm見込みます。

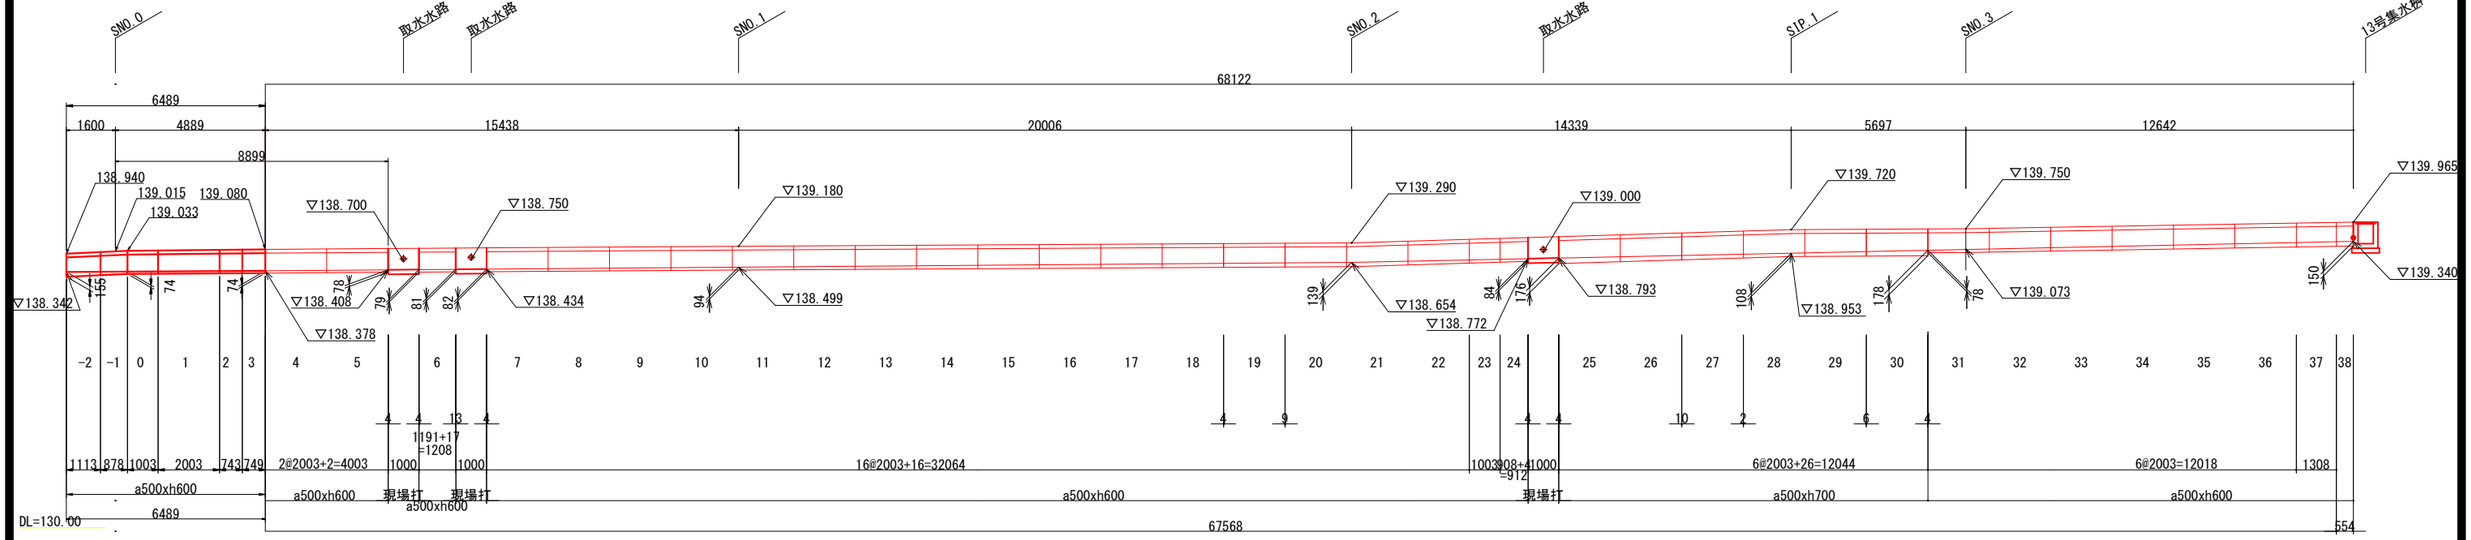

標準断面図　S=1:20
標準・暗渠タイプ

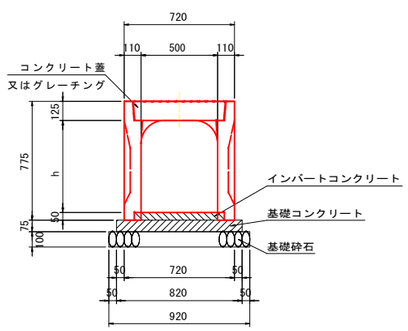

数　量　表

種　別	a	h	L	製品番号	数　量	備　考
標　準	500	600	2000	1,4-5,7-22,31-36	25	
			1000	0, 23	2	短　尺
		700	2000	25-30	6	
暗　渠	500	600	1237/1373	37	1	斜　切
			629/472	38	1	両斜切
			826/1400	-2	1	両斜切
			787/970	-1	1	斜　切
			816/670	2	1	斜　切
			822/676	3	1	斜　切
			1188	6	1	短　切
			905	24	1	短　切
合　計					41	
コンクリート蓋		500用-L 500（車道用）			51	
グレーチング		500用-L 500（車道用）			13	

材　料　表　　施工延長当たり

名　称	規　格	数　量
インバートコンクリート	σck=18N／mm²	4.192　m³
基礎コンクリート	σck=18N／mm²	4.404　m³
同上型枠		10.742　m²
基礎砕石	RC-40 t=75mm	65.882　m²

図面番号	24 /	縮　尺	図示
工　種	市道整備事業		
種　別	自由勾配側溝参考割付図	番号	2 / 5
路線名	道面郷線		
工事箇所	東広島市河内町入野		
東　広　島　市			

自由勾配側溝参考割付図（参考図）
(3/5)

平　面　図　S=1：100

※施工時の伸びを製品1本当り3㎜見込みます。

凡例

□　・・・コンクリート蓋
⊠　・・・グレーチング

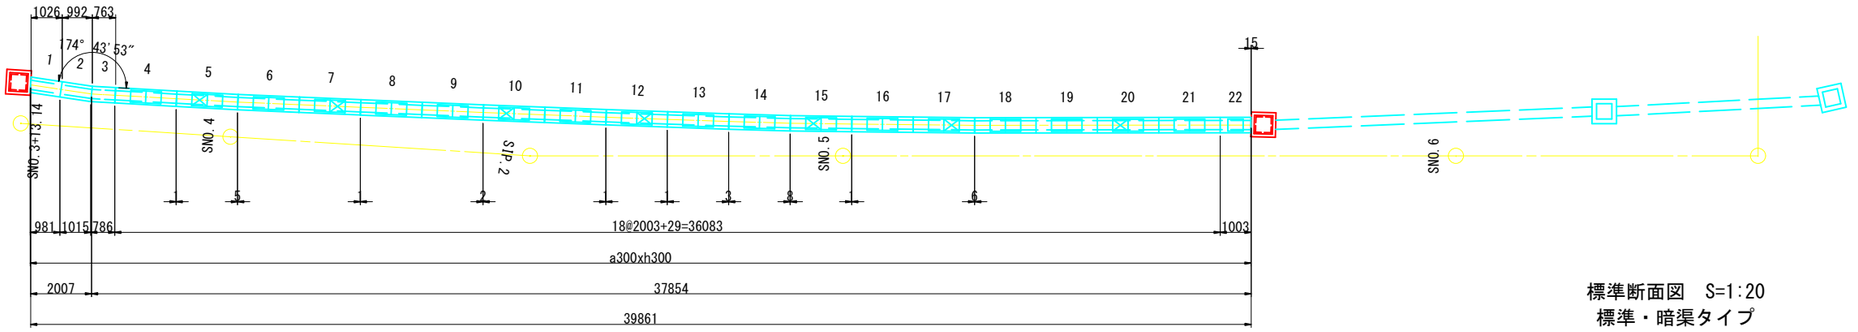

縦　断　図　S=1：100

※施工時の伸びを製品1本当り3㎜見込みます。

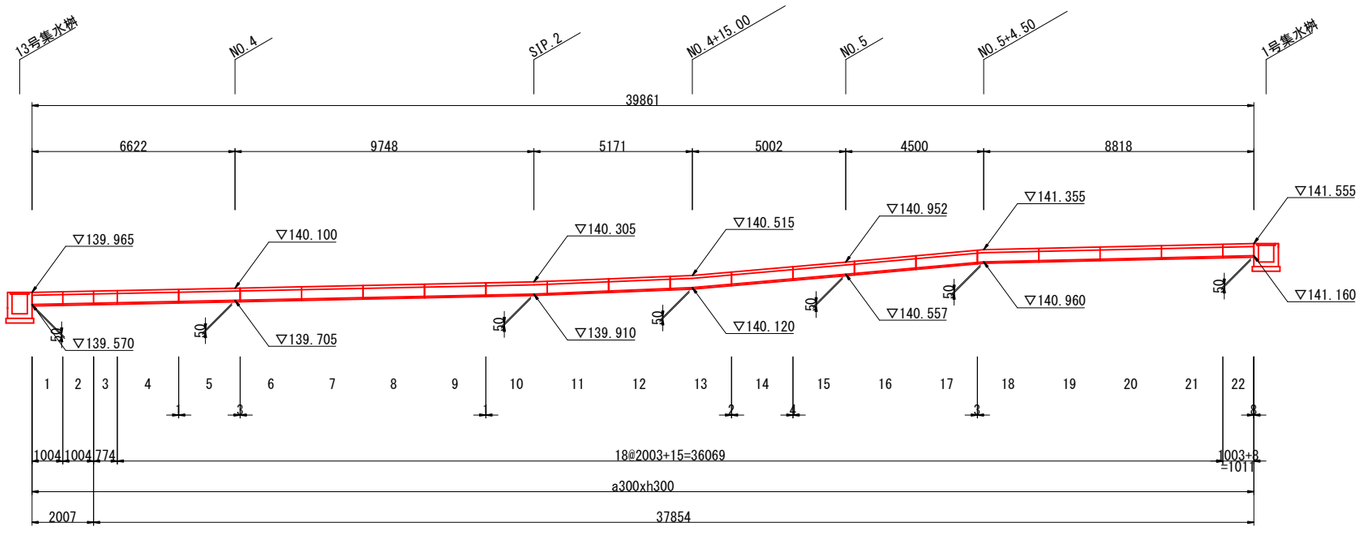

DL=130.00

標準断面図　S=1:20
標準・暗渠タイプ

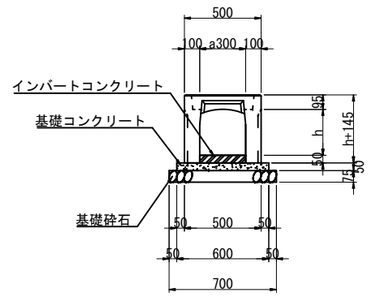

数　量　表

種　別	a	h	L	製品番号	数　量	備　考
標　準	300	300	2000	4-21	18	
			1000	22	1	短　尺
暗　渠	300	300	978/1023	1	1	斜　切
			989/1012	2	1	斜　切
			783/760	3	1	斜　切
合　計					22	
コンクリート蓋	300用-L 500（車道用）				30	
グレーチング	300用-L 500（車道用）				7	

材　料　表　　施工延長当たり

名　称	規　格	数　量
インバートコンクリート	σck=18N／mm²	0.598　m³
基礎コンクリート	σck=18N／mm²	1.196　m³
同上型枠		3.986　m²
基礎砕石	RC-40 t=75mm	27.903　m²

図面番号	25 /	縮　尺	図示
工　種	市道整備事業		
種　別	自由勾配側溝参考割付図	番号	3/5
路線名	道面郷線		
工事箇所	東広島市河内町入野		
東　広　島　市			

展開図(1)

S=1:100

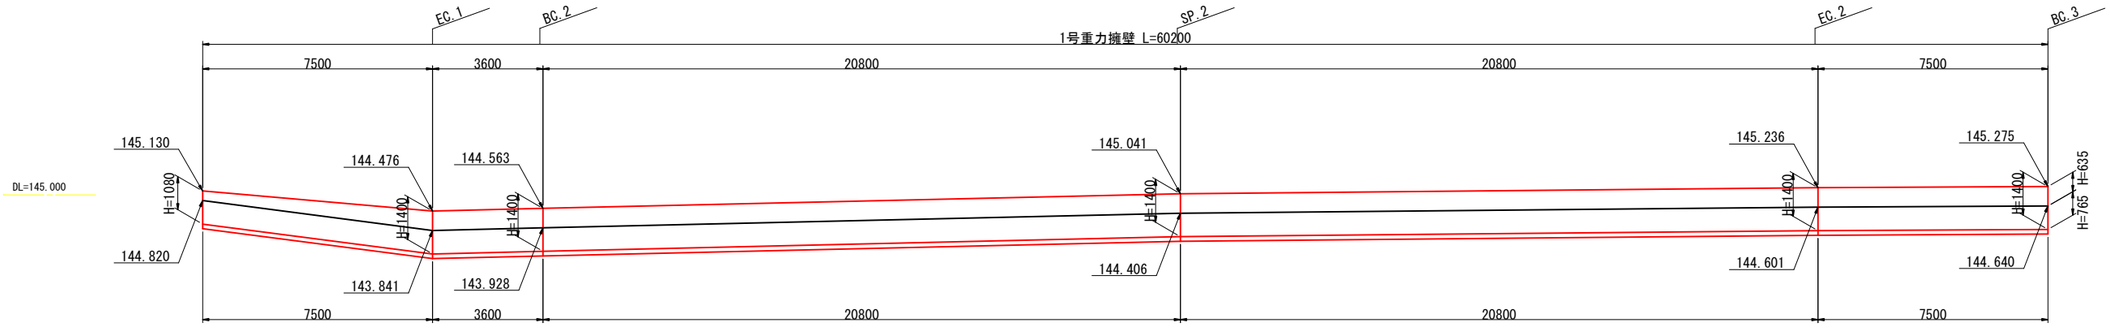

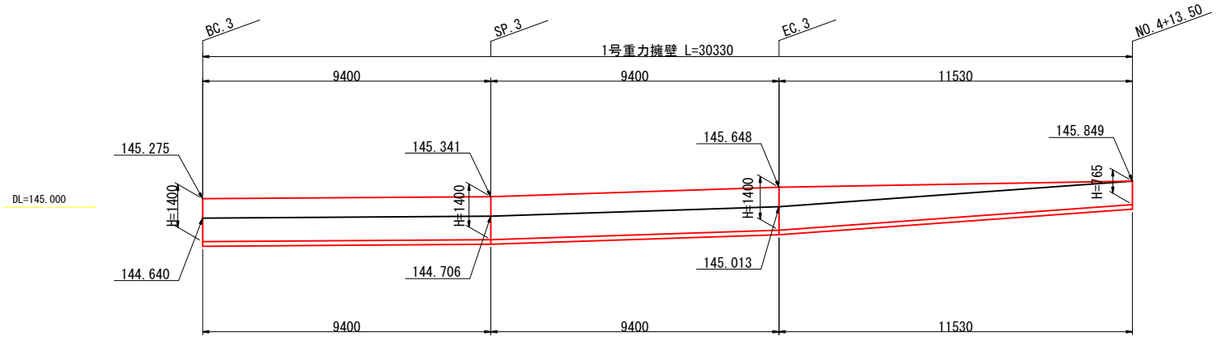

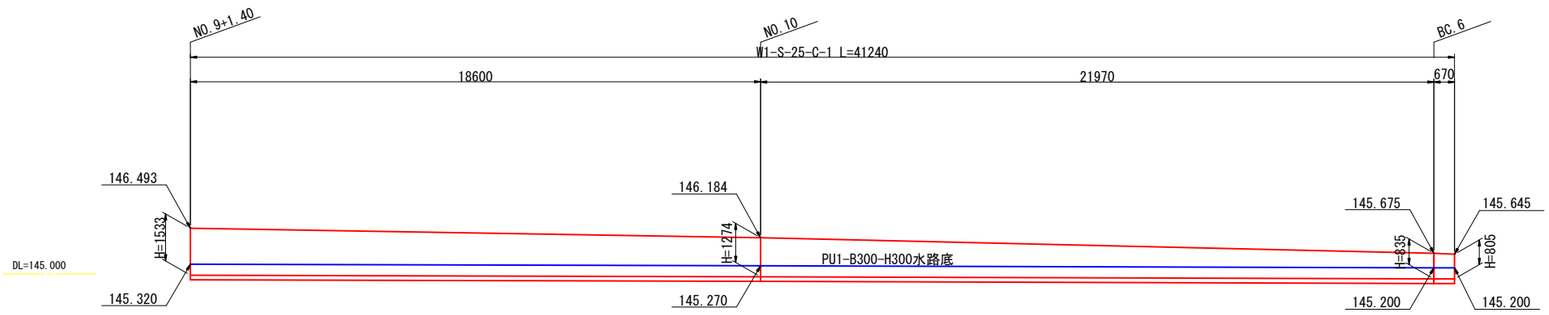

※擁壁には10m間隔ごとに目地材を設置する。

図面番号	26 /	縮　尺	1：100
工　種	市道整備事業		
種　別	展開図(1)	番号	1/3
路線名	道面郷線		
工事箇所	東広島市河内町入野		

東　広　島　市

展開図(3)

S=1:100

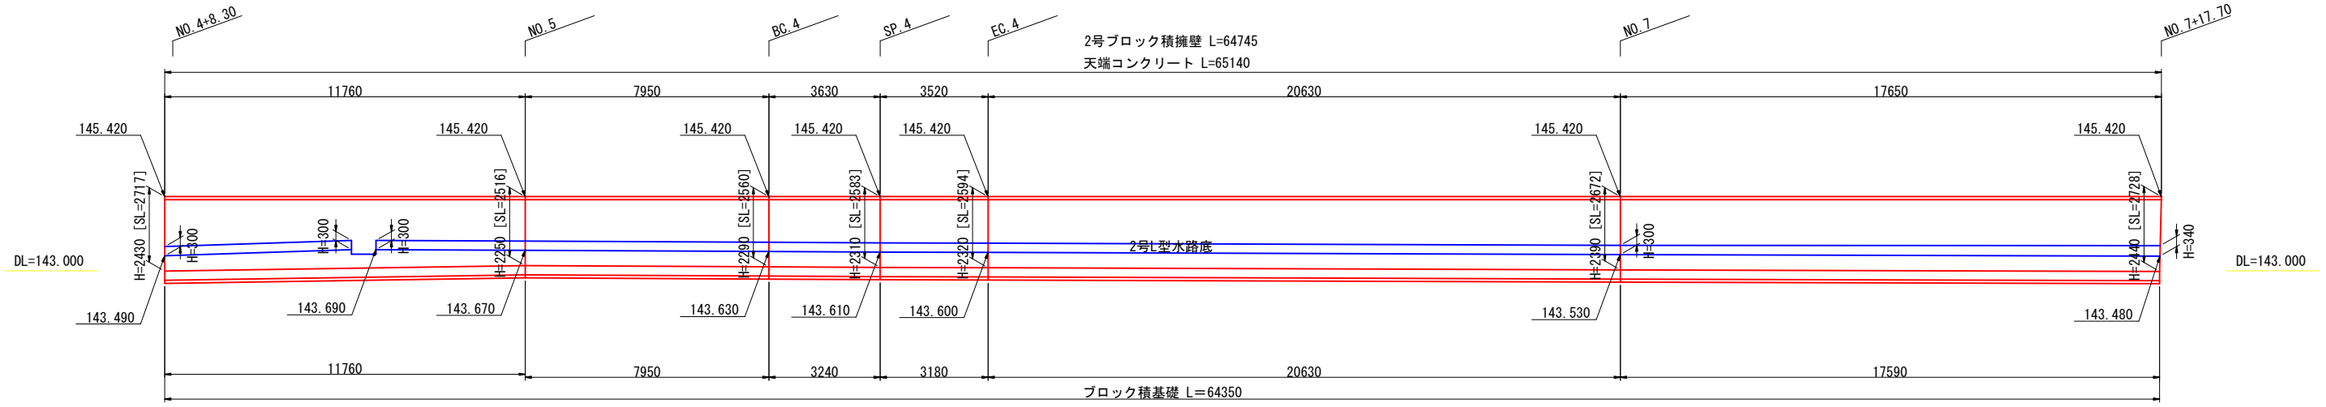

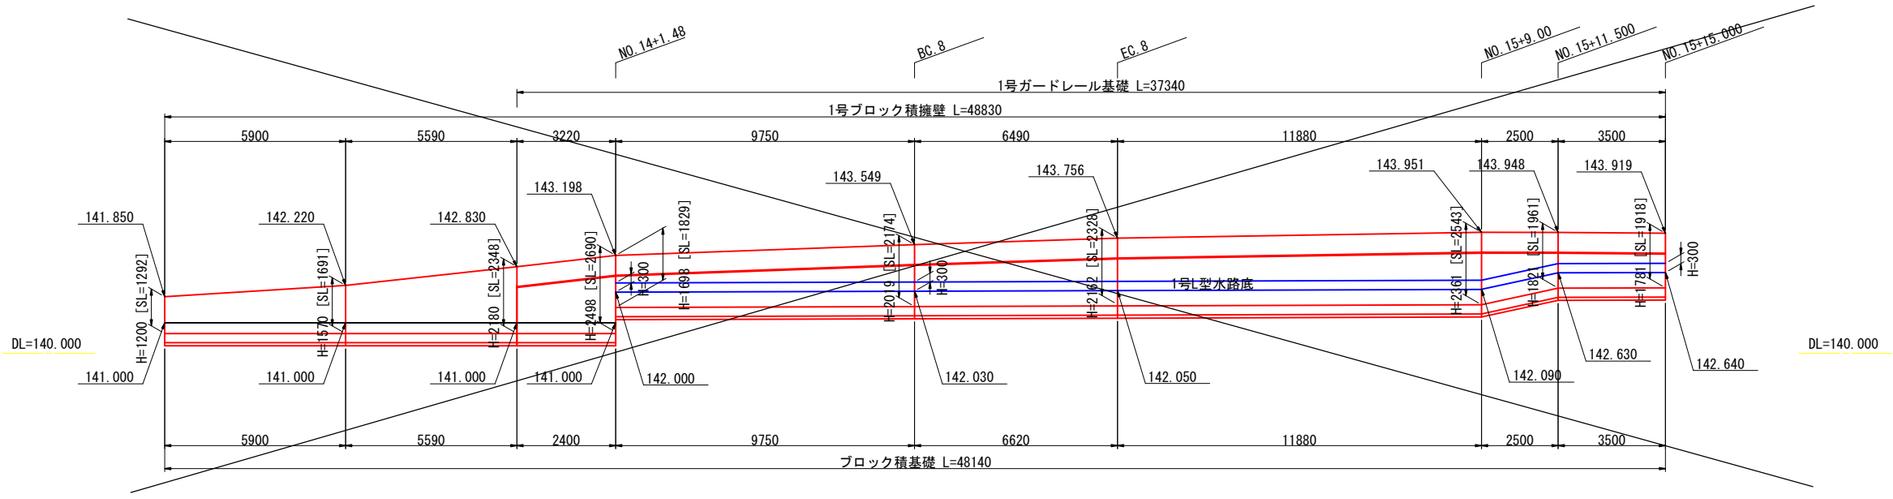

※擁壁には10m間隔ごとに目地材を設置する。

図面番号	27 /	縮 尺	1 : 100
工 種	市道整備事業		
種 別	展開図(3)	番号	3 / 3
路線名	道面郷線		
工事箇所	東広島市河内町入野		

東 広 島 市

排水系統図　S=1:500

N

S=1:500

現況桝改修（流入・流出は現況通り接続）

5号集水桝
①	――
②	――
③	146.620
④	――
⑤	146.350
⑥	147.250

4号集水桝
①	145.863(145.46)
②	145.310
③	145.863
④	145.310
⑤	145.158
⑥	146.258

1号集水桝
①	144.500
②	――
③	144.420
④	――
⑤	144.220
⑥	144.820

2号集水桝
①	――
②	143.848
③	143.793
④	143.848
⑤	143.643
⑥	144.243

8号集水桝
①	――
②	145.320
③	――
④	146.085
⑤	145.180
⑥	146.480

7号集水桝
①	143.320
②	――
③	143.250
④	――
⑤	143.100
⑥	143.700

6号集水桝
①	142.040
②	141.860(角落とし)
③	142.070
④	142.030
⑤	141.710
⑥	142.310

6号集水桝
①	142.460
②	――
③	142.460
④	――
⑤	142.270
⑥	142.870

3号集水桝
①	143.690
②	――
③	143.690
④	――
⑤	143.490
⑥	143.990

3号集水桝
①	143.450
②	143.400
③	――
④	――
⑤	143.250
⑥	143.750

1号集水桝
①	――
②	144.322
③	――
④	144.322
⑤	144.117
⑥	144.717

7号集水桝
①	143.100
②	143.100
③	――
④	――
⑤	142.900
⑥	143.400

7号集水桝
①	――
②	143.050
③	――
④	143.050
⑤	142.850
⑥	143.350

7号集水桝
①	――
②	141.550
③	――
④	141.550
⑤	141.350
⑥	141.850

7号集水桝
①	――
②	141.500
③	――
④	141.500
⑤	141.300
⑥	141.800

1号集水桝
①	――
②	142.624
③	142.590
④	142.624
⑤	142.419
⑥	143.019

9号集水桝
①	――
②	――
③	141.950
④	141.900
⑤	141.720
⑥	143.220

3号集水桝
①	142.900
②	142.000
③	――
④	――
⑤	141.800
⑥	142.300

9号集水桝
①	142.330
②	141.490
③	141.490
④	141.490
⑤	141.256
⑥	142.756

1号集水桝
①	141.160
②	――
③	141.160
④	――
⑤	140.950
⑥	141.550

10号集水桝
①	139.570
②	139.440
③	139.500
④	139.440
⑤	139.270
⑥	139.970

1号集水桝
①	――
②	――
③	142.850
④	142.905
⑤	142.700
⑥	143.300

7号集水桝
①	142.480
②	142.480
③	142.480
④	――
⑤	142.320
⑥	142.920

1号集水桝
①	142.285
②	――
③	142.285
④	――
⑤	142.180
⑥	142.680

11号集水桝
①	――
②	139.925
③	139.370
④	――
⑤	139.224
⑥	140.320

12号集水桝
①	139.370
②	139.370
③	139.370
④	139.370
⑤	138.070
⑥	139.770

13号集水桝
①	138.440
②	138.300
③	138.300
④	――
⑤	138.101
⑥	138.851

1号集水桝
①	140.435
②	――
③	140.435
④	――
⑤	140.230
⑥	140.830

1号集水桝
①	140.239
②	――
③	140.239
④	――
⑤	140.034
⑥	140.634

13号集水桝
①	138.455
②	――
③	138.244
④	138.250
⑤	138.095
⑥	138.845

凡例



図面番号	28 /	縮　尺	1：500
工　種	市道整備事業		
種　別	排水系統図	番号	1 / 1
路線名	道面郷線		
工事箇所	東広島市河内町入野		

東　広　島　市

コンクリート境界杭設置標準図

５０*５０*４～５ｍｍ
アルミダイカスト製
アンカーピン鉄製(ユニクロメッキ)

ＡＫタイプ



平　面　図



側　面　図

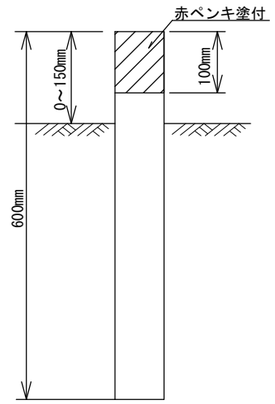

コンクリート境界杭

規格寸法　75*75*600mm

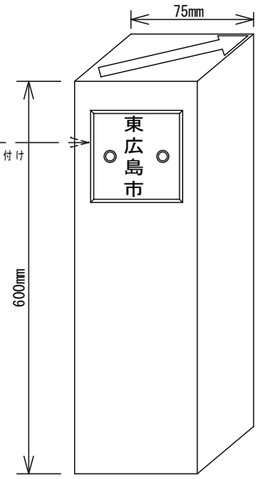

※専用アンカーピンはＡ・Ｂタイプと同じ

表面　（上面図）　裏面



アルミ製境界用表示板（現場打用）標準図

Ａタイプ

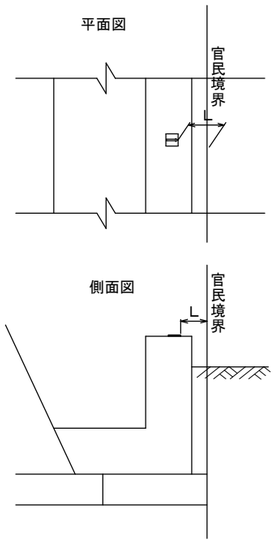

Ｌは、天端幅内で調整をし、
５ｃｍ単位で明記。



規格寸法　５０*５０*４～５ｍｍ
材質　アルミダイカスト製
アンカーピン鉄製（ユニクロメッキ）

Ｂタイプ

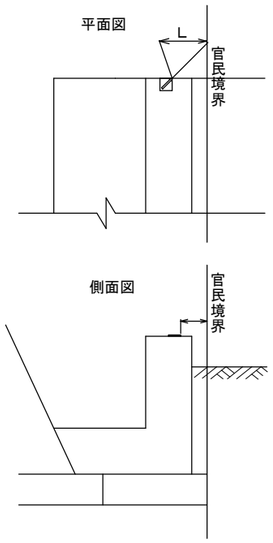

Ｌは、天端幅内で調整をし、
５ｃｍ単位で明記。



規格寸法　２５*７０*５ｍｍ（特殊サイズ）
材質　アルミダイカスト製
アンカーピン鉄製（ユニクロメッキ）

アルミ製境界用表示板（プレキャスト用）標準図

Ｃタイプ

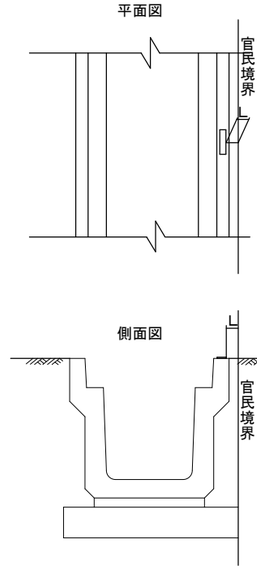

Ｌは、天端幅内で調整をし、
１ｃｍ単位で明記。



Ｄタイプ

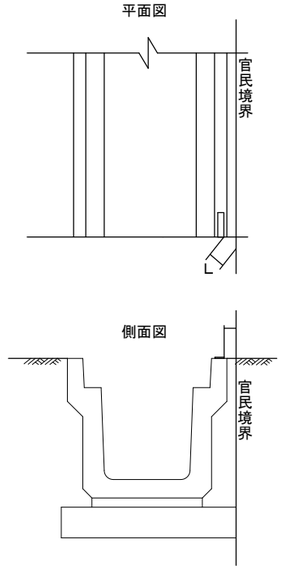

Ｌは、天端幅内で調整をし、
１ｃｍ単位で明記。

アルミ製境界用標示板設置方法

①



設置場所に標示板を
置き、アンカー穴の
印をつける。

②

ドリルでアンカー穴をあける。

③



スポイト等で中の
ごみを出す。

④



コンクリートボンドで
充てんする。

⑤



標示板の裏面とアンカー穴に
接着剤を塗布しアンカーを打ち込む。

Ａタイプ　Ｂタイプ

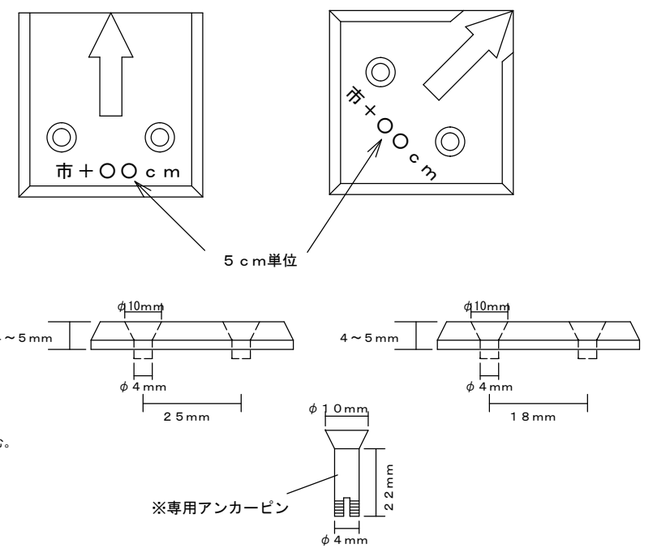

Ｃタイプ

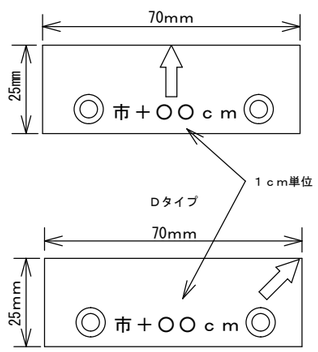

※専用アンカーピンはＡ・Ｂタイプと同じ

図面番号	29	縮尺	
工　種	市道整備事業		
種　別	用地境界標一般図		
路線河川名	道面郷線		
工事箇所	東広島市河内町入野		
東広島市			

参 考 図 書

工事名称　：　令和８年度 生活市道整備事業
道面郷線道路改良工事

＜注意事項＞

1　本工事は、数量公開の対象工事です。

2　この数量書は適正な積算のための参考指標として数量を示すものです。
数量は参考数量であり、設計図書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上の拘束をするものではありません。

3　その他
・当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、広島県制定の建設発生土処分一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとしている。搬出先としては次の施設を見込んでいる。

種別	施設の名称	所在地	運搬距離（km）
残土（砂・砂質土・礫質土）	―	―	―
残土（粘性土）	㈱大地リサイクルセンター第９処分場	東広島市河内町入野字大内原987-1	5.8

・当該工事により発生する建設資材廃棄物は、広島県制定の再資源化施設一覧表に掲載されている施設に搬出するものとする。搬出先としては、次の施設を見込んでいる。

種別	施設の名称	所在地	運搬距離（km）
Co 殻（無筋）	シンクファーム㈱田万里ｺﾝｸﾘｰﾄﾘｻｲｸﾙ施設	竹原市田万里西小寺 11357	14.1
Co 殻（有筋）	―	―	―
As 殻	光陽産業（株）河内営業所	東広島市河内町入野 2589	3.4
木材	―	―	―

総括情報表

変更回数	0
適用単価地区	49 東広島市(河内)
単価適用日	00-08.08.01(0)
諸経費体系	1 公共(一般)

	当世代	前世代
工種	04 道路改良工事	
施工地域・工事場所区分	04 一般交通影響有り(2)	
復興補正区分	00 補正なし	
週休補正区分	09 閉所型・月単位	
現場事務所等の貸与区分	00 補正なし	
ＩＣＴ補正区分	00 補正なし	
冬期補正係数	00 補正なし	
緊急工事区分	00 通常工事 ０％	
前払金支出割合区分	00 補正無し	
契約保証区分	01 金銭的保証(0.04%)	

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

≪凡例≫

Co ･･･コンクリート　　As ･･･アスファルト
DT ･･･ダンプトラック　　BH ･･･バックホウ
CC ･･･クローラクレーン　TC ･･･トラッククレーン
RTC･･･ラフテレーンクレーン

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良	1	式			Y1E01　　レベル1
道路土工	1	式			Y1E0101　　レベル2
掘削工	1	式			Y1E010101　レベル3
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	640	m3			Y1E01010101レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	640	m3			SPK26040001 00 単第0 -0001　表
路体盛土工	1	式			Y1E010103　レベル3
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	20	m3			Y1E01010301レベル4
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	20	m3			SPK26040004 00 単第0 -0002　表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	340	m3			Y1E01010301レベル4
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	340	m3			SPK26040004 00 単第0 -0003 表
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上	250	m3			Y1E01010301レベル4
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害有り	250	m3			SPK26040004 00 単第0 -0004 表
路床盛土工	1	式			Y1E010105 レベル3
路床盛土 施工幅員2.5m未満	10	m3			Y1E01010501レベル4
路床盛土 施工幅員2.5m未満	10	m3			SPK26040005 00 単第0 -0005 表
路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	110	m3			Y1E01010501レベル4
路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	110	m3			SPK26040005 00 単第0 -0006 表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路床盛土 施工幅員4.0m以上	330	m3			Y1E01010501レベル4
路床盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害有り	330	m3			SPK26040005 00 単第0 -0007 表
土材料 処理土　ほぐし	440	m3			Y1E01010507レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し　距離13.0km以下(10.0km超)	360	m3			SPK26040002 00 単第0 -0008 表
購入土 処理土　ほぐし	440	m3			F0000000001 00
法面整形工	1	式			Y1E010107　レベル3
法面整形(切土部) 切土部 現場制約無し	90	m2			Y1E01010701レベル4
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	90	m2			SPK26040024 00 単第0 -0009 表
法面整形(盛土部) 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し	200	m2			Y1E01010702レベル4

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	200	m2			SPK26040024 00 単第0 -0010 表
防草コンクリート	1	式			Y1E010109 レベル3
張りコンクリート 防草コンクリート Co厚さ70mm	361	m2			Y1E01010901レベル4
コンクリート打設工 防草コンクリート Co厚さ70mm 18-8-20BB	361	m2			S1040011 00 単第0 -0011 表
残土処理工	1	式			Y1E010110 レベル3
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	90	m3			Y1E01011002レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離6.0km以下(5.0km超)	90	m3			SPK26040002 00 単第0 -0013 表
残土等処分 粘性土	90	m3			Y1E01011003レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費 残土処分（粘性土） ㈱大地リサイクルセンター第9残土処分場	90	m3			F0000000002 00
法面工	1	式			Y1E0104　　レベル2
植生工	1	式			Y1E010401　レベル3
植生マット [規]250m2未満	90	m2			Y1E01040106レベル4
植生マット工 [規]250m2未満	90	m2			SS000277　　00 単第0 -0014　表
擁壁工	1	式			Y1E0106　　レベル2
作業土工	1	式			Y1E010601　レベル3
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	450	m3			Y1E01060102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	450	m3			SPK26040014 00 単第0 -0015　表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 土砂	330	m3			Y1E01060103レベル4
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	330	m3			SPK26040019 00 単第0 -0016 表
場所打擁壁工(構造物単位)	1	式			Y1E010605 レベル3
重力式擁壁（1号） 擁壁平均高さ1m超2m未満	65	m3			Y1E01060502レベル4
重力式擁壁 擁壁平均高さ1m超2m未満 基礎砕石有り 均しCo無し	65	m3			SPK26040070 00 単第0 -0017 表
重力式擁壁（W1-S-25-C-1） 擁壁平均高さ1m超2m未満	22	m3			Y1E01060502レベル4
重力式擁壁 擁壁平均高さ1m超2m未満 基礎砕石有り 均しCo無し	22	m3			SPK26040070 00 単第0 -0017 表
重力式擁壁（SGW42） 擁壁平均高さ1m超2m未満	4	m3			Y1E01060502レベル4
重力式擁壁 擁壁平均高さ1m超2m未満 基礎砕石無し 均しCo有り	4	m3			SPK26040070 00 単第0 -0018 表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
嵩上工 σck=18N/mm2	17	m			Y4999　　レベル4
嵩上工 σck=18N/mm2	17	m			V000001300　00 単第0 -0019　表
石・ブロック積(張)工	1	式			Y1E0107　　レベル2
Coブロック工(Coブロック積)	1	式			Y1E010703　レベル3
コンクリートブロック基礎 σck=18N/mm2	64	m			Y1E01070301レベル4
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ブロック積	64	m			V000000100　00 単第0 -0024　表
2号ブロック積 滑面ブロック σck=18N/mm2	164	m2			Y1E01070305レベル4
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB	164	m2			SDT00039　　00 単第0 -0028　表
胴込・裏込材(砕石) RC-40	126	m3			Y1E01070308レベル4

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	126	m3			SPK26040045 00 単第0 -0029 表
天端コンクリート σck=18N/mm2	65	m			Y1E01070313レベル4
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ ブロック積	65	m			V000000200 00 単第0 -0030 表
排水構造物工	1	式			Y1E0109 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010901 レベル3
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	270	m3			Y1E01090102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	270	m3			SPK26040014 00 単第0 -0015 表
埋戻し 土砂	150	m3			Y1E01090103レベル4
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	150	m3			SPK26040019 00 単第0 -0033 表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
側溝工	1	式			Y1E010903　レベル3
プレキャストU型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300A[300×300×2000]	308	m			Y1E01090301レベル4
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300A[300×300×2000]	308	m			SDT00013　00 単第0 -0034　表
プレキャストU型側溝 鉄筋コンクリートU形(JIS_A_5372) 300B[300×300×600]	69	m			Y1E01090301レベル4
U型側溝 鉄筋コンクリートU形(JIS_A_5372) 300B[300×300×600]	69	m			SDT00013　00 単第0 -0035　表
自由勾配側溝 B300　土留型	6	m			Y1E01090304レベル4
自由勾配側溝 材料別途 1000≧重量	6	m			SDT00015　00 単第0 -0036　表
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cm以下 RC-40	6	m2			SPK26040033 00 単第0 -0037　表
基礎・インバートコンクリート 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	0.6	m3			T1030063　00

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
底版コンクリート 小型構造物 24-12-25(20)BB 人力打設	0.1	m3			SPK26040157 00 単第0 -0038 表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.9	m2			SPK26040159 00 単第0 -0021 表
鉄筋工　鉄筋加工 ＳＤ３４５・Ｄ１３	0.009	t			S1040015 00 単第0 -0022 表
鉄筋工　鉄筋組立（一般構造物） ＳＤ３４５・Ｄ１３	0.009	t			S1040015 00 単第0 -0039 表
自由勾配側溝 土留型　B300-H500 L=2000	1	本			F0000000025 00
自由勾配側溝 土留型　B300-H700 L=2000	1	本			F0000000026 00
自由勾配側溝 暗渠型　B300-H600 斜切　L=1192/1277　通し筋穴付	1	本			F0000000027 00
自由勾配側溝 暗渠型　B300-H700 斜切　L=875/790　通し筋穴付	1	本			F0000000028 00
自由勾配側溝 B500	72	m			Y1E01090304レベル4

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
自由勾配側溝 材料別途 1000≧重量	72	m			SDT00015 00 単第0 -0040 表
インバートコンクリート 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	4	m3			T1030063 00
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 500*600*2000 参考質量710kg	25	本			T2160071 00
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 500*700*2000 参考質量774kg	6	本			T2160073 00
自由勾配側溝 暗渠型　B500-H600 斜切　L=1237/1373	1	本			F0000000016 00
自由勾配側溝 暗渠型　B500-H600 両斜切　L=629/472	1	本			F0000000017 00
自由勾配側溝 暗渠型　B500-H600 両斜切　L=826/1400	1	本			F0000000018 00
自由勾配側溝 暗渠型　B500-H600 斜切　L=787/970	1	本			F0000000019 00
自由勾配側溝 暗渠型　B500-H600 斜切　L=816/670	1	本			F0000000020 00

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
自由勾配側溝 暗渠型　B500-H600 斜切　L=822/676	1	本			F0000000021 00
自由勾配側溝 暗渠型　B500-H600 短切　L=1188	1	本			F0000000022 00
自由勾配側溝 暗渠型　B500-H600 短切　L=905	1	本			F0000000023 00
自由勾配側溝 標準型　B500-H600 短切　L=1000	2	本			F0000000024 00
自由勾配側溝 B300	40	m			Y1E01090304レベル4
自由勾配側溝 材料別途 1000≧重量	40	m			SDT00015　00 単第0 -0041　表
インバートコンクリート 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	0.6	m3			T1030063　00
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*300*2000 参考質量322kg	18	本			T2160045　00
自由勾配側溝 暗渠型　B300-H300 斜切　L=978/1023	1	本			F0000000012 00

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
自由勾配側溝 暗渠型　B300-H300 斜切　L=989/1012	1	本			F0000000013 00
自由勾配側溝 暗渠型　B300-H300 斜切　L=783/760	1	本			F0000000014 00
自由勾配側溝 標準型　B300-H300 短切　L=1000	1	本			F0000000015 00
埋戻コンクリート σck=18N/mm2	9	m3			Y4999　　レベル4
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	9	m3			SPK26040157 00 単第0 -0020　表
側溝蓋 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた 300[412×95×500]	79	枚			Y1E01090305レベル4
蓋版 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた 300[412×95×500]	79	枚			SDT00017　　00 単第0 -0042　表
側溝蓋 自由勾配側溝用　Co,Gr蓋	105	枚			Y1E01090305レベル4
蓋版 自由勾配側溝ふた 300[400×95×500]	33	枚			SDT00017　　00 単第0 -0043　表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
蓋版 自由勾配側溝ふた 500[600×125×500]	51	枚			SDT00017　00 単第0 -0044　表
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量 グレーチング蓋　B300用	8	枚			SDT00017　00 単第0 -0045　表
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量 グレーチング蓋　B500用	13	枚			SDT00017　00 単第0 -0046　表
管渠工	1	式			Y1E010904　レベル3
ヒューム管(B形管) 基礎砕石有り 外圧管1種 固定基礎90°巻き	9	m			Y1E01090402レベル4
ヒューム管(B形管) 据付 管径300㎜ 固定基礎90°巻き 基礎砕石有り 外圧管1種	9	m			SPK26040090 00 単第0 -0047　表
暗渠排水管 据付　硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径150m	9	m			Y1E01090403レベル4
暗渠排水管 据付 直管 50～150㎜ 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径150㎜	9	m			SPK26040093 00 単第0 -0048　表
暗渠排水管 据付　硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200m	10	m			Y1E01090403レベル4

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
暗渠排水管 据付 直管 200～400㎜ 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200㎜	10	m			SPK26040093 00 単第0 -0049 表
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径200㎜ 台付鉄筋コンクリート管(重圧管)	8	m			Y1E01090404レベル4
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径200㎜ 台付鉄筋コンクリート管(重圧管)	8	m			SPK26040098 00 単第0 -0050 表
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300㎜ 台付鉄筋コンクリート管(重圧管)	41	m			Y1E01090404レベル4
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300㎜ 台付鉄筋コンクリート管(重圧管)	17	m			SPK26040098 00 単第0 -0051 表
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300㎜ 材料支給 台付鉄筋コンクリート管(重圧管)	24	m			SPK26040098 00 単第0 -0052 表
管接続工 σck=18N/㎜2	1	箇所			Y4999 レベル4
管接続工 σck=18N/㎜2	1	箇所			V000000900 00 単第0 -0053 表
集水桝・マンホール工	1	式			Y1E010905 レベル3

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桝 1号集水桝 σck=18N/mm2	4	箇所			Y1E01090502レベル4
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.32m3を超え0.34m3以下	4	箇所			SPK26040104 00 単第0 -0054 表
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量	1	枚			SDT00017 00 単第0 -0055 表
蓋版 材料支給 40≧重量	3	枚			SDT00017 00 単第0 -0056 表
現場打ち集水桝 2号集水桝 σck=18N/mm2	1	箇所			Y1E01090502レベル4
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.52m3を超え0.55m3以下	1	箇所			SPK26040104 00 単第0 -0057 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量≦170	1	枚			SDT00017 00 単第0 -0058 表
現場打ち集水桝 3号集水桝(1) σck=18N/mm2	1	箇所			Y1E01090502レベル4
現場打ち集水桝 18-8-40BB	1	箇所			V000001000 00 単第0 -0059 表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桝 4号集水桝(1) σck=18N/mm2	1	箇所			Y1E01090502レベル4
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.52m3を超え0.55m3以下	1	箇所			SPK26040104 00 単第0 -0057 表
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量	1	枚			SDT00017 00 単第0 -0055 表
現場打ち集水桝 4号集水桝(2) σck=18N/mm2	1	箇所			Y1E01090502レベル4
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.46m3を超え0.49m3以下	1	箇所			SPK26040104 00 単第0 -0060 表
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量	1	枚			SDT00017 00 単第0 -0055 表
現場打ち集水桝 5号集水桝 σck=18N/mm2	1	箇所			Y1E01090502レベル4
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.52m3を超え0.55m3以下	1	箇所			SPK26040104 00 単第0 -0057 表
蓋版 材料支給 40<重量≦170	1	枚			SDT00017 00 単第0 -0061 表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桝 7号集水桝　H=500 σck=18N/mm2	4	箇所			Y1E01090502レベル4
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.28m3を超え0.30m3以下	4	箇所			SPK26040104 00 単第0 -0062　表
現場打ち集水桝 7号集水桝　H=600 σck=18N/mm2	1	箇所			Y1E01090502レベル4
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.32m3を超え0.34m3以下	1	箇所			SPK26040104 00 単第0 -0054　表
現場打ち集水桝 8号集水桝 σck=18N/mm2	1	箇所			Y1E01090502レベル4
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.82m3を超え0.87m3以下	1	箇所			SPK26040104 00 単第0 -0063　表
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量	1	枚			SDT00017　　00 単第0 -0055　表
足掛金物 W=300	2	個			F0000000008 00
現場打ち集水桝 9号集水桝 σck=18N/mm2	1	箇所			Y1E01090502レベル4

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 1.09m3を超え1.15m3以下	1	箇所			SPK26040104 00 単第0 -0064 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量≦170	1	枚			SDT00017 00 単第0 -0065 表
足掛金物 W=300	3	個			F0000000008 00
現場打ち集水桝 13号集水桝 σck=18N/㎜2	1	箇所			Y1E01090502レベル4
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.38m3を超え0.40m3以下	1	箇所			SPK26040104 00 単第0 -0066 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量≦170	1	枚			SDT00017 00 単第0 -0065 表
プレキャスト集水桝 AS桝　300×600×600	1	箇所			Y1E01090504レベル4
プレキャスト集水桝 据付　基礎砕石有り	1	基			V000001100 00 単第0 -0067 表
場所打水路工	1	式			Y1E010907 レベル3

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打水路 1号L型水路 σck=18N/mm2	1	m			Y1E01090701レベル4
現場打ち水路 1号L型水路 300×300	1	m			V000000300 00 単第0 -0071 表
現場打水路 2号L型水路 σck=18N/mm2	77	m			Y1E01090701レベル4
現場打ち水路 2号L型水路 300×400	77	m			V000000400 00 単第0 -0072 表
現場打水路 U2(GL)-B300-H300 σck=18N/mm2	3	m			Y1E01090701レベル4
現場打ち水路 U2(GL)-B300-H300	3	m			V000000500 00 単第0 -0073 表
取水水路 B500 σck=24N/mm2	3	m			Y1E01090701レベル4
1号取水水路 L=1000	1	箇所			V000000600 00 単第0 -0075 表
2号取水水路 L=1000	1	箇所			V000000700 00 単第0 -0077 表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
3号取水水路 L=1000	1	箇所			V000000800　00 単第0 -0078　表
運搬工	1	式			Y3999　レベル3
現場発生品運搬 排水構造物　支給品	2	回			Y1E01121603レベル4
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付 通称4～4.5t積2.9t吊 片道運搬距離6.0km以下(4.0km超)	4.85	t			SPK26040410 00 単第0 -0079　表
構造物撤去工	1	式			Y1E0112　レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206　レベル3
コンクリート構造物取壊し 機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)	28	m3			Y1E01120601レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)	28	m3			SDT00031　00 単第0 -0080　表
舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下	140	m			Y1E01120602レベル4

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	140	m			SPK26040304 00 単第0 -0081　表
舗装版破砕 アスファルト舗装版厚15cm以下	950	m2			Y1E01120603レベル4
舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	950	m2			SPK26040303 00 単第0 -0082　表
運搬処理工	1	式			Y1E011216　レベル3
殻運搬 Co殻（無筋）	28	m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離14.4km以下(10.9km超)	28	m3			SPK26040155 00 単第0 -0083　表
殻運搬 As殻	38	m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 舗装版破砕 DID区間無し 運搬距離3.5km以下(1.5km超)	38	m3			SPK26040155 00 単第0 -0084　表
殻処分 Co殻（無筋）	28	m3			Y1E01121602レベル4

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費 Co殻（無筋） ｼﾝｸﾌｧｰﾑ㈱田万里ｺﾝｸﾘｰﾄﾘｻｲｸﾙ施設	65	t			F0000000005 00
殻処分 As殻	38	m3			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費 As殻 光陽産業㈱河内営業所	90	t			F0000000004 00
舗装	1	式			Y1E02　　レベル1
地盤改良工	1	式			Y1E0202　　レベル2
路床安定処理工	1	式			Y1E020201　レベル3
安定処理 混合深さ1m以下 5.2t/100m2 セメント系(一般軟弱土用)フレコン	1,140	m2			Y1E02020101レベル4

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
安定処理 混合深さ1m以下 5.2t/100m2 セメント系(一般軟弱土用)フレコン	1,140	m2			SPK26040023 00 単第0 -0085 表
舗装工	1	式			Y1E0204 レベル2
アスファルト舗装工	1	式			Y1E020404 レベル3
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚120mm 1層施工	1,700	m2			Y1E02040403レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚120mm 1層施工	1,700	m2			SPK26040234 00 単第0 -0086 表
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスファルト混合物 平均幅員3.0m超 t=40mm	1,640	m2			Y1E02040409レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚40mm	1,640	m2			SPK26040241 00 単第0 -0087 表
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスファルト混合物 平均幅員1.4m未満 t=40mm	113	m2			Y1E02040409レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚40mm	113	m2			SPK26040241 00 単第0 -0088 表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート舗装工	1	式			Y1E020412　レベル3
下層路盤(車道・路肩部) RC-30　全仕上り厚100㎜	88	m2			Y1E02041201レベル4
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100㎜ 1層施工 RC-30	88	m2			SPK26040232 00 単第0 -0089　表
コンクリート舗装 σck=18N/㎜2　t=10cm	88	m2			Y1E02041207レベル4
コンクリート舗装 t=10cm	88	m2			V000001200　00 単第0 -0090　表
縁石工	1	式			Y1E0206　　レベル2
縁石工	1	式			Y1E020603　レベル3
アスカーブ 細粒度アスコン(13) 断面積215cm2以上235cm2未満	70	m			Y1E02060304レベル4
アスカーブ 断面積215cm2以上235cm2未満 細粒度アスコン(13)	70	m			SPK26040245 00 単第0 -0091　表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
防護柵工	1	式			Y1E0208　　レベル2
路側防護柵工	1	式			Y1E020801　レベル3
ガードレール 塗装品_Gr-C-4E	67	m			Y1E02080101レベル4
防護柵設置工(Gr) 土中建込 - 塗装品_Gr-C-4E [規]50m以上100m未満	67	m			SS000121　　00 単第0 -0092　表
ガードレール 塗装品_Gr-C-2B	75	m			Y1E02080101レベル4
防護柵設置工(Gr) コンクリート建込 - 塗装品_Gr-C-2B [規]21m以上100m未満	75	m			SS000123　　00 単第0 -0093　表
区画線工	1	式			Y1E0210　　レベル2
区画線工	1	式			Y1E021001　レベル3
溶融式区画線 実線_15cm　白　t=1.5㎜	550	m			Y1E02100101レベル4

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	550	m			SDT00001　00 単第0 -0094　表
道路付属施設工	1	式			Y1E0212　レベル2
境界工	1	式			Y1E021201　レベル3
境界鋲 アルミ製　設置 [規]30枚以上	87	枚			Y1E02120102レベル4
境界鋲 設置 [規]30枚以上	87	枚			SS000097　00 単第0 -0095　表
境界プレート アルミ製　50×50×4㎜　2つ穴	87	枚			F0000000036 00
仮設工	1	式			Y1E0215　レベル2
工事用道路工	1	式			Y1E021501　レベル3
工事用道路土工 W=3.0m	1	式			Y1E02150101レベル4

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
掘削(表土剥ぎ取り) 土砂 上記以外(小規模) 標準	70	m3			SPK26040001 00 単第0 -0096　表
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	70	m3			SPK26040004 00 単第0 -0003　表
掘削(撤去) 土砂 上記以外(小規模) 標準	70	m3			SPK26040001 00 単第0 -0097　表
整地 敷均し(ルーズ) 施工数量10,000m3未満 障害無し	70	m3			SPK26040003 00 単第0 -0098　表
土材料 処理土　ほぐし	100	m3			Y1E01010507レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し　距離13.0km以下(10.0km超)	70	m3			SPK26040002 00 単第0 -0008　表
購入土 処理土　ほぐし	100	m3			F0000000001 00
交通管理工	1	式			Y1E021521　レベル3
交通誘導警備員	6	人			Y1E02152101レベル4

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B	6	人			R0369 00
＊＊直接工事費＊＊ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
技術管理費					Z0006
技術管理費	1	式			YZZ06 レベル2
技術管理費	1	式			YZZ06001 レベル3
土質試験費	1	式			YZZ06001001 レベル4
CBR試験 室内CBR用試料採取 締め固める土(70kg)	3	箇所			TH003334 00
CBR試験 締め固めた土のCBR試験 設計CBR,モールド2個使用	3	試料			TH003338 00
【設計経費】 共通仮設費[対象外]，現場管理費[対象外] 一般管理費[対象外]					#0048

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
環境庁告示第46号溶出試験 六価クロム溶出試験費 試験方法1	1	試料			TH003912　　00
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊ 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事費計＊＊					
＊＊契約保証費計＊＊					

施工単価表

掘削　　SPK26040001　　単第0 -0001　表

土砂 上記以外(小規模)　　標準　　1　　m3　　当り

機械構成比:　27.65%　　労務構成比:　61.34%　　材料構成比:　11.01%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　1,342.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 バケット容量0.28m3	27.65%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0.28m3		MTPC00185 MTPT00185
運転手(特殊)	61.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂 E=7　標準			B=5　上記以外(小規模)		

施工単価表

路体(築堤)盛土　　SPK26040004　　単第0 -0002　表

施工幅員2.5m未満　　1　m3　当り

機械構成比: 0.63%　労務構成比: 99.14%　材料構成比: 0.23%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 7,091.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.63%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	90.71%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.43%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.23%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　施工幅員2.5m未満					

施工単価表

路体(築堤)盛土　　SPK26040004　　単第0 -0003　表

施工幅員2.5m以上4.0m未満　　1　m3　当り

機械構成比:　14.60%　労務構成比:　76.67%　材料構成比:　8.73%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　899.05000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.64%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型 バケット容量0.28m3		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第2,3次基準値)低騒音	6.96%		振動ローラ(舗装用) 搭乗・コンバインド式 運転質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
運転手(特殊)	67.73%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.94%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.73%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2　施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施工単価表

路体(築堤)盛土　　SPK26040004　　単第0 -0004　表

施工幅員4.0m以上　　施工数量20,000m3未満 障害有り　　1　m3　当り

機械構成比: 18.43%　労務構成比: 61.96%　材料構成比: 19.61%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 483.43000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	10.50%		ブルドーザ 湿地 通称7t級		KTPC00036 KTPT00036
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11～12t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.93%		振動ローラ(土工用) フラット・シングルドラム型 運転質量11～12t		KTPC00058 KTPT00058
運転手(特殊)	50.88%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	11.08%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	19.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3　施工幅員4.0m以上 C=2　障害有り			B=1　施工数量20,000m3未満		

施工単価表

路床盛土　　SPK26040005　　単第0 -0005　表

施工幅員2.5m未満　　1　　m3　　当り

機械構成比:　0.72%　労務構成比:　99.01%　材料構成比:　0.27%　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　7,199.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.72%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	89.35%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.66%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.27%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　施工幅員2.5m未満					

施工単価表

路床盛土　　SPK26040005　　単第0 -0006　表

施工幅員2.5m以上4.0m未満　　1　m3　当り

機械構成比:　14.57%　労務構成比:　76.80%　材料構成比:　8.63%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　944.74000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第2,3次基準値)低騒音	7.30%		振動ローラ(舗装用) 搭乗・コンバインド式 運転質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.27%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型 バケット容量0.28m3		KTPC00054 KTPT00054
運転手(特殊)	68.29%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.51%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.63%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2　施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施工単価表

路床盛土　　SPK26040005　　単第0 -0007　表

施工幅員4.0m以上　　施工数量20,000m3未満 障害有り　　1　m3　当り

機械構成比: 19.88%　労務構成比: 58.72%　材料構成比: 21.40%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 878.82000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11～12t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	12.46%		振動ローラ(土工用) フラット・シングルドラム型 運転質量11～12t		KTPC00058 KTPT00058
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	7.42%		ブルドーザ 湿地 通称7t級		KTPC00036 KTPT00036
運転手(特殊)	49.58%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	9.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	21.40%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3　施工幅員4.0m以上 C=2　障害有り			B=1　施工数量20,000m3未満		

施工単価表

土砂等運搬　　SPK26040002　　単第0 -0008　表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)　DID区間無し　距離13.0km以下(10.0km超)　1　m3　当り

機械構成比: 25.12%　労務構成比: 63.12%　材料構成比: 11.76%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 3,622.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 通称4t積級	25.12%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	63.12%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.76%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=45 距離13.0km以下(10.0km超)			B=5 バックホウ B容量0.28m3 D=1 DID区間無し		

施工単価表

法面整形　　SPK26040024　　単第0 -0009　表

切土部 現場制約無し　　レキ質土,砂及び砂質土,粘性土　　1　　m2　　当り

機械構成比: 8.80%　労務構成比: 81.51%　材料構成比: 9.69%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 964.64000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	8.80%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	38.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	22.44%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	20.15%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	9.69%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

法面整形　　SPK26040024　　単第0 -0010　表

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し　　レキ質土,砂及び砂質土,粘性土　　1　m2　当り

機械構成比: 11.31%　労務構成比: 76.24%　材料構成比: 12.45%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 475.98000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	11.31%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	33.80%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	28.83%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	13.61%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	12.45%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

コンクリート打設工　S1040011　単第0 -0011　表

防草コンクリート Co厚さ70mm　18-8-20BB　100　m2　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.600	人			
特殊作業員	1.100	人			
普通作業員	1.900	人			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	8.470	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	8.470	m3			
機-28_バックホウ(クローラ型)運転 クレーン付1.7t吊_B容量0.28m3	0.890	日			単第0-0012　表
諸雑費	4.0	%			#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m2			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			
A=2　施工幅 1.0m超2.0m以下 C=1　- F=70　コンクリート厚さ(mm)			B=2　施工高さ -1.0m以上1.0m以下 D=1　18-8-20BB G=2　小型車割増有		

施工単価表

機-28_バックホウ(クローラ型)運転　　S9035　　単第0 -0012　表
クレーン付1.7t吊_B容量0.28m3　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	37.00	L			
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.60	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日			
A=8　クレーン付1.7t吊_B容量0.28m3 C=1　運転労務数量(人/日)			B=37　軽油消費量(L/日) D=1.6　機械賃料数量(供用日/日)		

施工単価表

土砂等運搬　　SPK26040002　　単第0 -0013　表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)　　DID区間無し　距離6.0km以下(5.0km超)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　25.12%　　労務構成比:　63.12%　　材料構成比:　11.76%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　2,213.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 通称4t積級	25.12%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	63.12%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.76%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2　小規模 C=1　土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=28　距離6.0km以下(5.0km超)			B=5　バックホウ B容量0.28m3 D=1　DID区間無し		

施工単価表

植生マット工　　SS000277　　単第0 -0014　表

[規]250m2未満　　1　　m2　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
植生工(人力施工)【材工共】 植生マット工 肥料袋付	1.000	m2			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			
A=4　　[規]250m2未満					

施工単価表

床掘り　　SPK26040014　　単第0 -0015　表

土砂 上記以外(小規模)　　1　m3　当り

機械構成比: 19.50%　労務構成比: 73.36%　材料構成比: 7.14%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 2,397.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3	19.50%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3		MTPC00189 MTPT00189
運転手(特殊)	39.84%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂 E=1　-(全ての費用)			B=5　上記以外(小規模)		

施工単価表

埋戻し　　SPK26040019　　単第0 -0016　表

最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　m3　当り

機械構成比: 8.83%　労務構成比: 82.43%　材料構成比: 8.74%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 2,130.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	7.40%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.5～0.6t	1.34%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		KTPC00070 KTPT00070
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.09%		タンパ及びランマ 通称60～80kg級		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	40.30%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	26.38%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	15.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.13%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

埋戻し　　SPK26040019　　単第0 -0016　表

最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　m3　当り

機械構成比: 8.83%　労務構成比: 82.43%　材料構成比: 8.74%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 2,130.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=3　最大埋戻幅1m以上4m未満			D=1　-(全ての費用)		

施工単価表

重力式擁壁　　SPK26040070　　単第0 -0017　表

擁壁平均高さ1m超2m未満　　基礎砕石有り 均しCo無し　　1　m3　当り

機械構成比: 2.86%　労務構成比: 68.08%　材料構成比: 29.06%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 75,250.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 バケット容量0.45m3吊能力2.9t	1.97%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 バケット容量0.45m3吊能力2.9t		MTPC00160 MTPT00160
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	16.91%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	14.24%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.05%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.38%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	28.67%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.27%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

重力式擁壁　　SPK26040070　　単第0 -0017　表

擁壁平均高さ1m超2m未満　　基礎砕石有り 均しCo無し　　1　m3　当り

機械構成比: 2.86%　労務構成比: 68.08%　材料構成比: 29.06%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 75,250.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 擁壁平均高さ1m超2m未満 D=2 基礎砕石有り F=1 一般養生			B=2 18-8-40BB E=1 均しCo無し H=2 小型車割増有		

施工単価表

重力式擁壁　　SPK26040070　　単第0 -0018　表

擁壁平均高さ1m超2m未満　　基礎砕石無し 均しCo有り　　1　m3　当り

機械構成比: 2.91%　労務構成比: 69.29%　材料構成比: 27.80%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 78,759.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 バケット容量0.45m3吊能力2.9t	1.88%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 バケット容量0.45m3吊能力2.9t		MTPC00160 MTPT00160
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	16.15%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	13.61%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.27%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	27.40%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.26%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

重力式擁壁　　SPK26040070　　単第0 -0018　表

擁壁平均高さ1m超2m未満　　基礎砕石無し 均しCo有り　　1　m3　当り

機械構成比: 2.91%　労務構成比: 69.29%　材料構成比: 27.80%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 78,759.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 擁壁平均高さ1m超2m未満 D=1 基礎砕石無し F=1 一般養生			B=2 18-8-40BB E=2 均しCo有り H=2 小型車割増有		

施工単価表

嵩上工　　V000001300　　単第0 -0019　表

σck=18N/mm2　　10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	1.23	m3			単第0-0020　表
型枠 一般型枠 小型構造物	7.15	m2			単第0-0021　表
鉄筋工　鉄筋加工 ＳＤ３４５・Ｄ１３	0.006	t			単第0-0022　表
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	20	孔			単第0-0023　表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			

施工単価表

コンクリート　　SPK26040157　　単第0 -0020　表

小型構造物 18-8-40BB　　人力打設　　1　m3　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 41.24%　材料構成比: 58.76%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 38,619.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	22.34%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.14%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.74%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	58.76%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有		

施工単価表

型枠　　SPK26040159　　単第0 -0021　表

一般型枠　　小型構造物　　1　　m2　　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 100.00%　材料構成比: 0.00%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 9,646.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.38%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　一般型枠 C=1　-(全ての費用)			B=2　小型構造物		

施工単価表

鉄筋工　鉄筋加工　　S1040015　　単第0 -0022　表

ＳＤ３４５・Ｄ１３　　1　　t　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.200	人			
鉄筋工	2.300	人			
普通作業員	0.200	人			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1～3,2011,2014	0.040	日			
異形棒鋼<JISG3112> SD345,D13 単位質量0.995kg/m	1.030	t			1*1.03
諸雑費	12	%			#09
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	t			
A=1　　加工			C=5　　ＳＤ３４５・Ｄ１３		

施工単価表

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)　SPK26040114　単第0 -0023　表

削孔深さ30㎜以上200㎜未満　1　孔　当り

機械構成比: 2.05%　労務構成比: 95.59%　材料構成比: 2.36%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 720.84000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量2kVA 低騒音	0.98%		発動発電機 ガソリンエンジン駆動 2kVA		KTPC00041 KTPT00041
その他 電動ハンマドリル 穴あけ能力φ38～40㎜	0.69%		電動ハンマドリル 穴あけ能力φ38～40㎜		MTPC00146 MTPT00146
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	45.66%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	18.58%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.48%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	1.92%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)　SPK26040114　単第0 -0023　表

削孔深さ30㎜以上200㎜未満　1　孔　当り

機械構成比: 2.05%　労務構成比: 95.59%　材料構成比: 2.36%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 720.84000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=1　削孔深さ30㎜以上200㎜未満					

施工単価表

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　V000000100　単第0 -0024　表

ブロック積　10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎砕石無し	1.14	m3			単第0-0025　表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.72	m3			単第0-0026　表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			単第0-0027　表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			

施工単価表

現場打基礎コンクリート　SPK26040049　単第0 -0025　表

18-8-40BB　基礎砕石無し　1　m3　当り

機械構成比: 1.61%　労務構成比: 67.53%　材料構成比: 30.86%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 74,772.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	1.61%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
型わく工	20.82%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	16.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.40%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	9.59%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	29.69%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.99%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

現場打基礎コンクリート　　SPK26040049　　単第0 -0025　表

18-8-40BB　　基礎砕石無し　　1　　m3　　当り

機械構成比:　1.61%　　労務構成比:　67.53%　　材料構成比:　30.86%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価：　74,772.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=2　18-8-40BB D=1　一般養生・特殊養生(練炭)			C=2　基礎砕石無し E=2　小型車割増有		

施工単価表

コンクリート　　SPK26040157　　単第0 -0026　表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB　　人力打設　　1　m3　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 28.77%　材料構成比: 71.23%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 32,152.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	12.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.34%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	71.23%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有		

施工単価表

型枠　　SPK26040159　　単第0 -0027　表

一般型枠　　均しコンクリート　　1　　m2　　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 100.00%　材料構成比: 0.00%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 5,387.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	58.85%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	19.89%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.01%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　一般型枠 C=1　-(全ての費用)			B=5　均しコンクリート		

施工単価表

コンクリートブロック積工(練積)　SDT00039　単第0 -0028　表

滑面ブロック　18-8-40BB　1　m2　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_ブロック積工【手間のみ】 時間的制約なし	1.000	m2			
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	8.500	個			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.112	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	0.112	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			
A=1　昼間施工 C=1　18-8-40BB F=1　18-8-40BB			B=1　- E=2　小型車割増有 H=0.1　裏込コンクリートの厚さ(m)		
I=1　滑面ブロック L=1　時間的制約なし			K=8.5　ブロックm2当り使用量(個/m2)		

施工単価表

コンクリートブロック積工(練積)　SDT00039　単第0 -0028　表

滑面ブロック　18-8-40BB　1　m2　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

胴込・裏込材(砕石)　　SPK26040045　　単第0 -0029　表

間知・平・連節・緑化ブロック　　RC-40　　1　m3　当り

機械構成比: 8.99%　労務構成比: 68.98%　材料構成比: 22.03%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価: 7,441.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	8.99%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	36.04%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	20.09%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	12.29%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン 40～0mm	17.76%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.27%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　間知・平・連節・緑化ブロック			B=1　RC-40		

施工単価表

胴込・裏込材(砕石)　　SPK26040045　　単第0 -0029　表

間知・平・連節・緑化ブロック　　RC-40　　1　　m3　　当り

機械構成比:　8.99%　労務構成比:　68.98%　材料構成比:　22.03%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　7,441.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考

施工単価表

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ　　V000000200　　単第0 -0030　表

ブロック積　　10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打天端コンクリート 18-8-40BB 一般養生	1.15	m3			単第0-0031　表
目地板 1工事当り使用量30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10mm	0.11	m2			単第0-0032　表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			

施工単価表

現場打天端コンクリート　　SPK26040052　　単第0 -0031　表

18-8-40BB　　一般養生　　1　m3　当り

機械構成比: 2.31%　労務構成比: 64.12%　材料構成比: 33.57%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 69,240.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	2.31%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
型わく工	22.02%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	15.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.34%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	32.06%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.51%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工単価表

現場打天端コンクリート　　SPK26040052　　単第0 -0031　表

18-8-40BB　　一般養生　　1　m3　当り

機械構成比: 2.31%　労務構成比: 64.12%　材料構成比: 33.57%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 69,240.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=2 18-8-40BB D=2 小型車割増有			C=1 一般養生		

施工単価表

目地板　　SPK26040118　　単第0 -0032　表

1工事当り使用量30m2未満　　瀝青繊維質目地板t=10mm　　1　m2　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 64.44%　材料構成比: 35.56%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 4,288.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	47.50%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	16.62%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
目地板 瀝青繊維質板 厚10mm	35.56%		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		TTPC00199 TTPT00199
積算単価			積算単価		EP001
A=1　1工事当り使用量30m2未満			B=1　瀝青繊維質目地板t=10mm		

施工単価表

埋戻し　　SPK26040019　　単第0 -0033　表

最大埋戻幅1m未満　　1　m3　当り

機械構成比: 8.51%　労務構成比: 87.87%　材料構成比: 3.62%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 3,510.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 バケット容量0.45m3	7.96%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 バケット容量0.45m3		MTPC00159 MTPT00159
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.55%		タンパ及びランマ 通称60～80kg級		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	53.46%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	25.55%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	8.86%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.78%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.84%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=4　最大埋戻幅1m未満			D=1　-(全ての費用)		

施工単価表

埋戻し　　SPK26040019　　単第0 -0033　表

最大埋戻幅1m未満　　1　m3　当り

機械構成比: 8.51%　労務構成比: 87.87%　材料構成比: 3.62%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 3,510.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考

施工単価表

U型側溝　　SDT00013　　単第0 -0034　表

落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種　　300A[300×300×2000]　　1　　m　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300A 300*300*2,000 参考質量419kg	0.500	本			
再生クラッシャラン 40～0mm	0.055	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=1　昼間施工 C=12　300A[300×300×2000] I=1　-			B=3　落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 G=1　時間的制約なし J=1　-		
K=2　RC-40			M=1　-		

施工単価表

U型側溝　　SDT00013　　単第0 -0035　表

鉄筋コンクリートU形(JIS_A_5372)　　300B[300×300×600]　　1　　m　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=600_60を超え300kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300B 300×300×600 参考質量79kg	1.653	本			
再生クラッシャラン 40～0mm	0.048	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=1　昼間施工 C=5　300B[300×300×600] I=1　-			B=1　鉄筋コンクリートU形(JIS_A_5372) G=1　時間的制約なし J=1　-		
K=2　RC-40			M=1　-		

施工単価表

自由勾配側溝　　SDT00015　　単第0 -0036　表

材料別途 1000≧重量　　1　　m　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.000	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=1　昼間施工 D=1　1000≧重量 F=2　基礎砕石を施工しない場合 L=0　基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			B=51　材料別途 E=1　時間的制約なし J=1　18-8-40BB M=1　-		

施工単価表

基礎砕石　　SPK26040033　　単第0 -0037　表

砕石の厚さ7.5cm以下　　RC-40　　1　　m2　　当り

機械構成比:　5.39%　　労務構成比:　83.61%　　材料構成比:　11.00%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　1,248.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	5.36%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	40.22%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	17.01%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	15.76%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	10.04%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン 40～0mm	5.62%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.35%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

基礎砕石　　SPK26040033　　単第0 -0037　表

砕石の厚さ7.5cm以下　　RC-40　　1　　m2　　当り

機械構成比:　5.39%　労務構成比:　83.61%　材料構成比:　11.00%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　1,248.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　砕石の厚さ7.5cm以下 D=1　-(全ての費用)			B=1　RC-40		

施工単価表

底版コンクリート　　SPK26040157　　単第0 -0038　表

小型構造物 24-12-25(20)BB　　人力打設　　1　m3　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 41.24%　材料構成比: 58.76%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 38,619.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	22.34%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.14%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.74%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) W/C(55%),種別(高炉)	58.76%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00343 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=1 24-12-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有		

施工単価表

鉄筋工　鉄筋組立（一般構造物）　S1040015　単第0 -0039　表

ＳＤ３４５・Ｄ１３　1　t　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.500	人			
鉄筋工	3.500	人			
普通作業員	0.300	人			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1～3,2011,2014	0.110	日			
諸雑費	8	%			#09
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	t			
A=2　組立 C=5　ＳＤ３４５・Ｄ１３			B=1　一般構造物		

施工単価表

自由勾配側溝　　SDT00015　　単第0 -0040　表

材料別途 1000≧重量　　1　　m　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
再生クラッシャラン 40～0mm	0.110	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.065	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	0.065	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=1　昼間施工 D=1　1000≧重量 F=1　-			B=51　材料別途 E=1　時間的制約なし G=2　RC-40		
I=0.92　基礎砕石の設計数量(m3/10m) L=0.615　基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			J=1　18-8-40BB M=2　小型車割増有り		

施工単価表

自由勾配側溝　　SDT00015　　単第0 -0041　表

材料別途 1000≧重量　　1　　m　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
再生クラッシャラン 40～0mm	0.630	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.032	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	0.032	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=1　昼間施工 D=1　1000≧重量 F=1　-			B=51　材料別途 E=1　時間的制約なし G=2　RC-40		
I=5.25　基礎砕石の設計数量(m3/10m) L=0.3　基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			J=1　18-8-40BB M=2　小型車割増有り		

施工単価表

蓋版　　SDT00017　　単第0 -0042　表

落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた　　300[412×95×500]　　1　　枚　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた300 412*95*500 参考質量45kg	1.000	枚			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	枚			
A=1　昼間施工 C=20　300[412×95×500] G=1　-			B=4　落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた F=1　時間的制約なし		

施工単価表

蓋版　　SDT00017　　単第0 -0043　表

自由勾配側溝ふた　　300[400×95×500]　　1　　枚　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 車道用ふた300用(400×95×500) 参考質量41kg	1.000	枚			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	枚			
A=1　昼間施工 C=23　300[400×95×500] G=1　-			B=5　自由勾配側溝ふた F=1　時間的制約なし		

施工単価表

蓋版　　SDT00017　　単第0 -0044　表

自由勾配側溝ふた　　500[600×125×500]　　1　　枚　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 車道用ふた500用(600×125×500) 参考質量83kg	1.000	枚			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	枚			
A=1　昼間施工 C=25　500[600×125×500] G=1　-			B=5　自由勾配側溝ふた F=1　時間的制約なし		

施工単価表

蓋版　　SDT00017　　単第0 -0045　表

蓋版(各種) 40≧重量　　グレーチング蓋　B300用　　1　　枚　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			
グレーチング蓋（自由勾配側溝用） B300用　L=500　普通目　T-25	1.000	枚			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	枚			
A=1　昼間施工 D=29　【F】蓋版(枚) F=1　時間的制約なし			B=9　蓋版(各種) E=1　40≧重量 G=1　-		

施工単価表

蓋版　　SDT00017　　単第0 -0046　表

蓋版(各種) 40≧重量　　グレーチング蓋　B500用　　1　　枚　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			
グレーチング蓋（自由勾配側溝用） B500用　L=500　普通目　T-25	1.000	枚			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	枚			
A=1　昼間施工 D=30　【F】蓋版(枚) F=1　時間的制約なし			B=9　蓋版(各種) E=1　40≧重量 G=1　-		

施工単価表

ヒューム管(B形管)　　SPK26040090　　単第0 -0047　表

据付 管径300㎜ 固定基礎90°巻き　　基礎砕石有り 外圧管1種　　1　m　当り

機械構成比: 2.15%　労務構成比: 58.97%　材料構成比: 38.88%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価: 20,777.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 排2,3,2011,2014	1.92%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 バケット容量0.45m3 吊能力2.9t		KTPC00067 KTPT00067
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	18.58%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	7.87%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	7.78%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	5.87%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) 外圧管,B形1種,呼び径300,長さ2,000 参考質量165kg	30.08%		ヒューム管 外圧管 B形1種 径300㎜×長さ2,000㎜		TTPC00109 TTPT00109
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	7.28%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

ヒューム管(B形管)　　SPK26040090　　単第0 -0047　表

据付 管径300㎜ 固定基礎90°巻き　　基礎砕石有り 外圧管1種　　1　m　当り

機械構成比: 2.15%　労務構成比: 58.97%　材料構成比: 38.88%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 20,777.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.36%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=1 固定基礎90°巻き E=1 外圧管1種 H=2 小型車割増有			B=3 管径300㎜ D=1 基礎砕石有り G=1 18-8-40BB I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

暗渠排水管　　SPK26040093　　単第0 -0048　表

据付 直管 50～150mm　　硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径150mm　　1　m　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 51.25%　材料構成比: 48.75%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 880.45000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	36.54%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	14.71%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
薄肉管(VU)(JISK6741)PE 呼び径150(165×5.1)	48.75%		暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0404 TTPT00188
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=1 50～150mm G=1 -			B=1 直管 D=62 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径150mm I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

暗渠排水管　　SPK26040093　　単第0 -0049　表

据付 直管 200～400mm　　硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200mm　　1　m　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 16.42%　材料構成比: 83.58%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 5,329.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	11.56%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
薄肉管(VU)(JISK6741)PE 呼び径200(216×6.5)	83.58%		暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0405 TTPT00189
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=2 200～400mm G=1 -			B=1 直管 D=66 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200mm I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

鉄筋コンクリート台付管　　SPK26040098　　単第0 -0050　表

据付 管径200㎜　　台付鉄筋コンクリート管(重圧管)　　1　m　当り

機械構成比: 2.89%　労務構成比: 34.05%　材料構成比: 63.06%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 15,715.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.5m3(平積0.39m3)吊能力2.9t 排2,3,2011,2014	2.07%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 バケット容量0.5～0.6m3 吊能力2.9t		KTPC00077 KTPT00077
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	8.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.18%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	5.82%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	3.80%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
重圧管 内径200	60.81%		鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径300㎜×長さ2,000㎜		TTPCD0566 TTPT00134
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

鉄筋コンクリート台付管　　SPK26040098　　単第0 -0050　表

据付 管径200㎜　　台付鉄筋コンクリート管(重圧管)　　1　m　当り

機械構成比: 2.89%　労務構成比: 34.05%　材料構成比: 63.06%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 15,715.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=2 台付鉄筋コンクリート管(重圧管)			B=1 管径200㎜ E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

鉄筋コンクリート台付管　　SPK26040098　　単第0 -0051　表

据付 管径300㎜　　台付鉄筋コンクリート管(重圧管)　　1　m　当り

機械構成比: 2.89%　労務構成比: 34.05%　材料構成比: 63.06%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 15,715.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.5m3(平積0.39m3)吊能力2.9t 排2,3,2011,2014	2.07%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 バケット容量0.5～0.6m3 吊能力2.9t		KTPC00077 KTPT00077
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	8.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.18%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	5.82%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	3.80%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
重圧管 内径300 質量380kg	60.81%		鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径300㎜×長さ2,000㎜		TTPCD0411 TTPT00134
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

鉄筋コンクリート台付管　　SPK26040098　　単第0 -0051　表

据付 管径300㎜　　台付鉄筋コンクリート管(重圧管)　　1　m　当り

機械構成比: 2.89%　労務構成比: 34.05%　材料構成比: 63.06%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 15,715.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=2 台付鉄筋コンクリート管(重圧管)			B=3 管径300㎜ E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

鉄筋コンクリート台付管　　SPK26040098　　単第0 -0052　表

据付 管径300㎜　材料支給　　台付鉄筋コンクリート管(重圧管)　　1　m　当り

機械構成比: 2.89%　労務構成比: 34.05%　材料構成比: 63.06%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 15,715.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.5m3(平積0.39m3)吊能力2.9t 排2,3,2011,2014	2.07%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 バケット容量0.5～0.6m3 吊能力2.9t		KTPC00077 KTPT00077
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	8.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.18%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	5.82%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	3.80%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
非計上　材料単価	60.81%		鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径300㎜×長さ2,000㎜		TTPCD0411 TTPT00134
非計上　材料単価	1.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

鉄筋コンクリート台付管　　SPK26040098　　単第0 -0052　表

据付 管径300㎜　材料支給　　台付鉄筋コンクリート管(重圧管)　　1　m　当り

機械構成比: 2.89%　労務構成比: 34.05%　材料構成比: 63.06%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 15,715.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=2 台付鉄筋コンクリート管(重圧管)			B=3 管径300㎜ E=2 機械費・労務費のみ(1日未満完了作業)		

施工単価表

管接続工　　V000000900　　単第0 -0053　表

σck=18N/mm2　　1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.227	m3			単第0-0020　表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.646	m2			単第0-0021　表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			

施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)　SPK26040104　単第0 -0054　表

18-8-40BB　0.32m3を超え0.34m3以下　1　箇所　当り

機械構成比: 0.07%　労務構成比: 87.31%　材料構成比: 12.62%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 58,941.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	0.07%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	34.27%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.20%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.92%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	12.31%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.07%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)　SPK26040104　単第0 -0054　表

18-8-40BB　0.32m3を超え0.34m3以下　1　箇所　当り

機械構成比: 0.07%　労務構成比: 87.31%　材料構成比: 12.62%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 58,941.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 18-8-40BB D=2 人力打設 F=2 小型車割増有			C=7 0.32m3を超え0.34m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

施工単価表

蓋版　　SDT00017　　単第0 -0055　表

蓋版(各種) 40≧重量　　1　　枚　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			
グレーチング蓋（集水桝用） 500×500用　T-14　普通目　落し込み	1.000	組			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	枚			
A=1　昼間施工 D=9　【F】蓋版(枚) F=1　時間的制約なし			B=9　蓋版(各種) E=1　40≧重量 G=1　-		

施工単価表

蓋版　　SDT00017　　単第0 -0056　表

材料支給 40≧重量　　1　　枚　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	枚			
A=1　昼間施工 E=1　40≧重量 G=1　-			B=10　材料別途 F=1　時間的制約なし		

施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)　SPK26040104　単第0 -0057　表

18-8-40BB　0.52m3を超え0.55m3以下　1　箇所　当り

機械構成比: 0.07%　労務構成比: 85.48%　材料構成比: 14.45%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 83,130.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	0.07%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	32.90%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	28.94%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.15%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	14.15%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.07%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)　SPK26040104　単第0 -0057　表

18-8-40BB　0.52m3を超え0.55m3以下　1　箇所　当り

機械構成比: 0.07%　労務構成比: 85.48%　材料構成比: 14.45%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 83,130.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 18-8-40BB D=2 人力打設 F=2 小型車割増有			C=15 0.52m3を超え0.55m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

施工単価表

蓋版　　SDT00017　　単第0 -0058　表

蓋版(各種) 40<重量≦170　　1　　枚　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			
グレーチング蓋（集水桝用） 500×1200用　T-14　普通目　落し込み　2分	1.000	組			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	枚			
A=1　昼間施工 D=34　【F】蓋版(枚) F=1　時間的制約なし			B=9　蓋版(各種) E=2　40<重量≦170 G=1　-		

施工単価表

現場打ち集水桝　　V000001000　　単第0 -0059　表

18-8-40BB　　1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.194	m3			単第0-0020　表
型枠 一般型枠 小型構造物	2.318	m2			単第0-0021　表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.036	m3			単第0-0026　表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.17	m2			単第0-0027　表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			

施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)　SPK26040104　単第0 -0060　表

18-8-40BB　0.46m3を超え0.49m3以下　1　箇所　当り

機械構成比: 0.07%　労務構成比: 85.90%　材料構成比: 14.03%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 76,051.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	0.07%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	33.22%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.13%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.10%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	13.73%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.07%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)　SPK26040104　単第0 -0060　表

18-8-40BB　0.46m3を超え0.49m3以下　1　箇所　当り

機械構成比: 0.07%　労務構成比: 85.90%　材料構成比: 14.03%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 76,051.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 18-8-40BB D=2 人力打設 F=2 小型車割増有			C=13 0.46m3を超え0.49m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

施工単価表

蓋版　　SDT00017　　単第0 -0061　表

材料支給 40<重量≦170　　1　　枚　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	枚			
A=1　昼間施工 E=2　40<重量≦170 G=1　-			B=10　材料別途 F=1　時間的制約なし		

施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)　SPK26040104　単第0 -0062　表

18-8-40BB　0.28m3を超え0.30m3以下　1　箇所　当り

機械構成比: 0.08%　労務構成比: 87.83%　材料構成比: 12.09%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 54,220.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	0.08%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	34.66%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.28%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.21%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.85%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	11.76%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)　SPK26040104　単第0 -0062　表

18-8-40BB　0.28m3を超え0.30m3以下　1　箇所　当り

機械構成比: 0.08%　労務構成比: 87.83%　材料構成比: 12.09%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 54,220.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 18-8-40BB D=2 人力打設 F=2 小型車割増有			C=5 0.28m3を超え0.30m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)　SPK26040104　単第0 -0063　表

18-8-40BB　0.82m3を超え0.87m3以下　1　箇所　当り

機械構成比: 0.06%　労務構成比: 84.15%　材料構成比: 15.79%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 119,720.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	0.06%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	31.91%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	28.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.06%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	15.52%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.06%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)　SPK26040104　単第0 -0063　表

18-8-40BB　0.82m3を超え0.87m3以下　1　箇所　当り

機械構成比: 0.06%　労務構成比: 84.15%　材料構成比: 15.79%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 119,720.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 18-8-40BB D=2 人力打設 F=2 小型車割増有			C=23 0.82m3を超え0.87m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)　SPK26040104　単第0 -0064　表

18-8-40BB　1.09m3を超え1.15m3以下　1　箇所　当り

機械構成比: 0.94%　労務構成比: 83.05%　材料構成比: 16.01%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 163,180.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	0.83%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	0.06%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	34.08%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	21.26%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.82%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.86%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	15.23%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)　SPK26040104　単第0 -0064　表

18-8-40BB　1.09m3を超え1.15m3以下　1　箇所　当り

機械構成比: 0.94%　労務構成比: 83.05%　材料構成比: 16.01%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 163,180.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.50%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 18-8-40BB D=1 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2 小型車割増有			C=28 1.09m3を超え1.15m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

施工単価表

蓋版　　SDT00017　　単第0 -0065　表

蓋版(各種) 40<重量≦170　　1　　枚　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			
グレーチング蓋（集水桝用） 600×600用　T-14　普通目　落し込み	1.000	組			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	枚			
A=1　昼間施工 D=10　【F】蓋版(枚) F=1　時間的制約なし			B=9　蓋版(各種) E=2　40<重量≦170 G=1　-		

施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)　SPK26040104　単第0 -0066　表

18-8-40BB　0.38m3を超え0.40m3以下　1　箇所　当り

機械構成比: 0.07%　労務構成比: 86.63%　材料構成比: 13.30%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 66,020.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	0.07%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	33.75%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.11%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.16%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.01%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	12.99%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.07%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)　SPK26040104　単第0 -0066　表

18-8-40BB　0.38m3を超え0.40m3以下　1　箇所　当り

機械構成比: 0.07%　労務構成比: 86.63%　材料構成比: 13.30%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 66,020.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 18-8-40BB D=2 人力打設 F=2 小型車割増有			C=10 0.38m3を超え0.40m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

施工単価表

プレキャスト集水桝　　V000001100　　単第0 -0067　表

据付　基礎砕石有り　　1　基　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャスト集水桝 据付 基礎砕石有り 製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下	1	基			単第0-0068　表
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.025	m3			単第0-0069　表
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量	1	枚			単第0-0070　表
プレキャスト集水桝 AS桝　300×600×600	1	基			
プレキャスト集水桝用ベース 300×600用	1	基			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	基			

施工単価表

プレキャスト集水桝　　SPK26040096　　単第0 -0068　表

据付 基礎砕石有り　　製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下　　1　基　当り

機械構成比: 11.60%　労務構成比: 85.02%　材料構成比: 3.38%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 6,504.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	9.36%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.28m3 吊能力1.7t		KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	37.54%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	16.48%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.96%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	4.59%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.73%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

プレキャスト集水桝　　SPK26040096　　単第0 -0068　表

据付 基礎砕石有り　　製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下　　1　基　当り

機械構成比: 11.60%　労務構成比: 85.02%　材料構成比: 3.38%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 6,504.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=1 基礎砕石有り			B=3 製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下 D=1 -(全ての費用)		

施工単価表

コンクリート　　SPK26040157　　単第0 -0069　表

小型構造物 18-8-25(20)BB　　人力打設　　1　m3　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 41.24%　材料構成比: 58.76%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 38,619.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	22.34%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.14%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.74%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	58.76%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=3 18-8-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有		

施工単価表

蓋版　　SDT00017　　単第0 -0070　表

蓋版(各種) 40≧重量　　1　　枚　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			
グレーチング蓋（集水桝用） AS桝300×600用　普通目　110°開閉	1.000	枚			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	枚			
A=1　昼間施工 D=33　【F】蓋版(枚) F=1　時間的制約なし			B=9　蓋版(各種) E=1　40≧重量 G=1　-		

施工単価表

現場打ち水路　　V000000300　　単第0 -0071　表

1号L型水路　　300×300　　10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	1.08	m3			単第0-0020　表
型枠 一般型枠 小型構造物	9	m2			単第0-0021　表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.42	m3			単第0-0026　表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1	m2			単第0-0027　表
目地板 1工事当り使用量30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10mm	0.108	m2			単第0-0032　表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			

施工単価表

現場打ち水路　　V000000400　　単第0 -0072　表

2号L型水路　　300×400　　10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	1.219	m3			単第0-0020　表
型枠 一般型枠 小型構造物	11	m2			単第0-0021　表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.4	m3			単第0-0026　表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1	m2			単第0-0027　表
目地板 1工事当り使用量30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10mm	0.122	m2			単第0-0032　表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			

施工単価表

現場打ち水路　　V000000500　　単第0 -0073　表

U2(GL)-B300-H300　　10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	2.021	m3			単第0-0020　表
型枠 一般型枠 小型構造物	22	m2			単第0-0021　表
基礎砕石 砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	7	m2			単第0-0074　表
グレーチング蓋（現場打側溝用） 300用　T-14　普通目　ボルト固定　L=1000	10	組			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			

施工単価表

基礎砕石　　SPK26040033　　単第0 -0074　表

砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下　　RC-40　　1　　m2　　当り

機械構成比:　4.85%　　労務構成比:　75.15%　　材料構成比:　20.00%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　1,388.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	4.82%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	36.15%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.29%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.16%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.03%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン 40～0mm	15.16%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.81%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

基礎砕石　　SPK26040033　　単第0 -0074　表

砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下　　RC-40　　1　　m2　　当り

機械構成比:　4.85%　労務構成比:　75.15%　材料構成比:　20.00%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　1,388.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=3　砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 D=1　-(全ての費用)			B=1　RC-40		

施工単価表

1号取水水路　　V000000600　　単第0 -0075　表

L=1000　　1　　箇所　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 24-12-25(20)BB 人力打設	0.329	m3			単第0-0076　表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.086	m2			単第0-0021　表
基礎砕石 砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	0.9	m2			単第0-0074　表
鉄筋工　鉄筋加工 ＳＤ３４５・Ｄ１３	0.017	t			単第0-0022　表
鉄筋工　鉄筋組立（一般構造物） ＳＤ３４５・Ｄ１３	0.017	t			単第0-0039　表
グレーチング蓋（現場打側溝用） B500用　L=1000　T-14　普通目　2分割	1	組			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			

施工単価表

コンクリート　　SPK26040157　　単第0 -0076　表

小型構造物 24-12-25(20)BB　　人力打設　　1　m3　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 41.24%　材料構成比: 58.76%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 38,619.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	22.34%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.14%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.74%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) W/C(55%),種別(高炉)	58.76%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00343 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=1 24-12-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有		

施工単価表

2号取水水路　　V000000700　　単第0 -0077　表

L=1000　　1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 24-12-25(20)BB 人力打設	0.328	m3			単第0-0076　表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.074	m2			単第0-0021　表
基礎砕石 砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	0.9	m2			単第0-0074　表
鉄筋工　鉄筋加工 ＳＤ３４５・Ｄ１３	0.017	t			単第0-0022　表
鉄筋工　鉄筋組立（一般構造物） ＳＤ３４５・Ｄ１３	0.017	t			単第0-0039　表
グレーチング蓋（現場打側溝用） B500用　L=1000　T-14　普通目　2分割	1	組			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			

施工単価表

3号取水水路　　V000000800　　単第0 -0078　表

L=1000　　1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 24-12-25(20)BB 人力打設	0.329	m3			単第0-0076　表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.08	m2			単第0-0021　表
基礎砕石 砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	0.9	m2			単第0-0074　表
鉄筋工　鉄筋加工 ＳＤ３４５・Ｄ１３	0.017	t			単第0-0022　表
鉄筋工　鉄筋組立（一般構造物） ＳＤ３４５・Ｄ１３	0.017	t			単第0-0039　表
グレーチング蓋（現場打側溝用） B500用　L=1000　T-14　普通目　2分割	1	組			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			

施工単価表

現場発生品及び支給品運搬　　SPK26040410　　単第0 -0079　表

クレーン装置付 通称4～4.5t積2.9t吊　　片道運搬距離6.0km以下(4.0km超)　　1　t　当り

機械構成比: 16.52%　労務構成比: 79.59%　材料構成比: 3.89%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 3,264.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 通称4～4.5t積級吊能力2.9t	16.52%		トラック クレーン装置付 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		MTPC00021 MTPT00021
運転手(特殊)	40.20%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	39.39%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2　クレーン装置付 通称4～4.5t積2.9t吊 C=6　片道運搬距離6.0km以下(4.0km超)			B=1　DID区間無し		

施工単価表

構造物とりこわし工(無筋構造物)　SDT00031　単第0 -0080　表

機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)　1　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=1　昼間施工 C=1　-			B=1　機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機) D=1　時間的制約なし		

施工単価表

舗装版切断　　SPK26040304　　単第0 -0081　表

アスファルト舗装版　　アスファルト舗装版厚15cm以下　　1　m　当り

機械構成比: 14.40%　労務構成比: 58.90%　材料構成比: 26.70%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 731.83000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)･湿式･E駆動 通称(切削深)20cm級ブレード径φ56cm	9.80%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動 通称(切削深)20cm級 ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.20%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.89%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	9.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.47%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.88%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

舗装版切断　　SPK26040304　　単第0 -0081　表

アスファルト舗装版　　アスファルト舗装版厚15cm以下　　1　m　当り

機械構成比: 14.40%　労務構成比: 58.90%　材料構成比: 26.70%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 731.83000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 E=1 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

施工単価表

舗装版破砕　　SPK26040303　　単第0 -0082　表

アスファルト舗装版　　障害等無し 舗装版厚15cm以下　　1　m2　当り

機械構成比: 12.28%　労務構成比: 81.66%　材料構成比: 6.06%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 227.41000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	12.28%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型 バケット容量0.45m3		KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役	29.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	27.76%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	6.06%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策不要 F=1 積込作業有り			B=1 障害等無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

施工単価表

殻運搬　　SPK26040155　　単第0 -0083　表

Co(無筋)構造物とりこわし　　DID区間無し　運搬距離14.4km以下(10.9km超)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　39.03%　　労務構成比:　46.18%　　材料構成比:　14.79%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　2,200.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	39.03%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	46.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	14.79%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　Co(無筋)構造物とりこわし C=1　DID区間無し E=1　-(全ての費用)			B=1　機械積込 D=50　運搬距離14.4km以下(10.9km超)		

施工単価表

殻運搬　　SPK26040155　　単第0 -0084　表

舗装版破砕　　DID区間無し 運搬距離3.5km以下(1.5km超)　　1　m3　当り

機械構成比: 42.27%　労務構成比: 41.18%　材料構成比: 16.55%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 2,485.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	42.27%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	41.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	16.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破砕 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=15 運搬距離3.5km以下(1.5km超)		

施工単価表

安定処理　SPK26040023　単第0 -0085　表

混合深さ1m以下 5.2t/100m2　セメント系(一般軟弱土用)フレコン　1　m2　当り

機械構成比: 6.85%　労務構成比: 45.44%　材料構成比: 47.71%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 2,295.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.5m3(平積0.4)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.85%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.5m3 吊能力2.9t		KTPC00038 KTPT00038
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.28%		タイヤローラ 運転質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第2,3次基準値)低騒音	1.72%		振動ローラ(舗装用) 搭乗・コンバインド式 運転質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
運転手(特殊)	23.43%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	13.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.29%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコンパック 【地区単価×固化材100m2当り使用量(t)】	44.42%		セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1tパック 【標準数量 5.25t/100m2】		TTPC00050 TTPT00397
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.29%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工単価表

安定処理　　SPK26040023　　単第0 -0085　表

混合深さ1m以下 5.2t/100m2　　セメント系(一般軟弱土用)フレコン　　1　　m2　　当り

機械構成比: 6.85%　労務構成比: 45.44%　材料構成比: 47.71%　市場単価構成比: 0.00%　　標準単価： 2,295.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=2 バックホウ C=3 混合深さ1m以下 F=1 セメント系(一般軟弱土用)フレコン			B=1 路床 D=5.2 固化材100m2当り使用量(実数入力)(t)		
【固化材単価】 固化材単価(円) * 固化材100m2当り使用量(t) 固化材100m2当り使用量(t):5.200(t)					

施工単価表

上層路盤(車道・路肩部)　SPK26040234　単第0 -0086　表

RM-30　全仕上り厚120㎜ 1層施工　1　m2　当り

機械構成比: 11.39%　労務構成比: 38.57%　材料構成比: 50.04%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 646.43000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	7.88%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.98%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.96%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	16.98%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	6.21%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.55%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	4.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

上層路盤(車道・路肩部)　　SPK26040234　　単第0 -0086　表

RM-30　　全仕上り厚120㎜ 1層施工　　1　　m2　　当り

機械構成比:　11.39%　労務構成比:　38.57%　材料構成比:　50.04%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　646.43000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整砕石 30～0㎜	46.32%		再生粒度調整砕石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150㎜		TTPC00010 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.21%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=5　RM-30 H=1　-(全ての費用)			E=120　全仕上り厚(㎜)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(㎜)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(㎜):120.000(㎜)					

施工単価表

表層(車道・路肩部)　SPK26040241　単第0 -0087　表

平均幅員3.0m超　1層当り平均仕上厚40mm　1　m2　当り

機械構成比: 1.32%　労務構成比: 10.25%　材料構成比: 88.43%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 1,891.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.84%		アスファルトフィニッシャ ホイール型 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.13%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.13%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	2.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.05%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

表層(車道・路肩部)　SPK26040241　単第0 -0087　表

平均幅員3.0m超　1層当り平均仕上厚40mm　1　m2　当り

機械構成比: 1.32%　労務構成比: 10.25%　材料構成比: 88.43%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 1,891.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	80.48%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	7.39%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.47%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 平均幅員3.0m超 C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=40 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):40.000(mm)					

施工単価表

表層(車道・路肩部)　SPK26040241　単第0 -0088　表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)　1層当り平均仕上厚40mm　1　m2　当り

機械構成比: 0.42%　労務構成比: 44.56%　材料構成比: 55.02%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 3,034.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.23%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 通称40～60kg級	0.13%		振動コンパクタ 前進型 通称40～60kg級		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.70%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.12%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.27%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	50.19%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	4.60%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

表層(車道・路肩部)　SPK26040241　単第0 -0088　表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)　1層当り平均仕上厚40mm　1　m2　当り

機械構成比: 0.42%　労務構成比: 44.56%　材料構成比: 55.02%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 3,034.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.17%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=40 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):40.000(mm)					

施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)　SPK26040232　単第0 -0089　表

全仕上り厚100㎜ 1層施工　RC-30　1　m2　当り

機械構成比: 5.50%　労務構成比: 18.62%　材料構成比: 75.88%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 1,337.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	3.81%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.47%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.46%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	8.20%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	3.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.68%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	2.17%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)　SPK26040232　単第0 -0089　表

全仕上り厚100㎜ 1層施工　RC-30　1　m2　当り

機械構成比: 5.50%　労務構成比: 18.62%　材料構成比: 75.88%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 1,337.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャラン 30～0㎜	74.09%		クラッシャラン 40～0㎜ [標準数量]全仕上り厚150㎜		TTPCD0018 TTPT00346
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100　全仕上り厚(㎜) D=1　-(全ての費用)			B=3　RC-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(㎜)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(㎜):100.000(㎜)					

施工単価表

コンクリート舗装　　V000001200　　単第0 -0090　表

t=10cm　　1　　m2　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.1	m3			単第0-0020　表
路盤紙 クラフト紙系	1	m2			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			

施工単価表

アスカーブ　SPK26040245　単第0 -0091　表

断面積215cm2以上235cm2未満　細粒度アスコン(13)　1　m　当り

機械構成比: 3.71%　労務構成比: 53.78%　材料構成比: 42.51%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 1,275.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 通称2t積級	2.23%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
アスファルトカーバ ガソリンエンジン駆動式 施工能力4.0～4.5m3/h	1.27%		アスファルトカーバ ガソリンエンジン駆動式 施工能力4.0～4.5m3/h		MTPC00055 MTPT00055
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	24.29%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.77%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	9.02%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(一般)	7.66%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト混合物 細粒度(13)	41.17%		再生細粒度アスコン 13		TTPC00019 TTPT00025

施工単価表

アスカーブ　　SPK26040245　　単第0 -0091　表

断面積215cm2以上235cm2未満　　細粒度アスコン(13)　　1　m　当り

機械構成比: 3.71%　労務構成比: 53.78%　材料構成比: 42.51%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 1,275.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.34%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=6　断面積215cm2以上235cm2未満 C=1　- E=1　-(全ての費用)			B=1　細粒度アスコン(13) D=1　-		

施工単価表

防護柵設置工(Gr) 土中建込　　SS000121　　単第0 -0092　表

- 塗装品_Gr-C-4E　　[規]50m以上100m未満　　1　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
標準型【材工共】 土中建込・塗装品(白色) Gr-C-4E	1.000	m			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=1 - C=2 [規]50m以上100m未満 F=1 -			B=3 塗装品_Gr-C-4E E=1 - G=1 -		
H=1 -			I=1 -		

施工単価表

防護柵設置工(Gr) コンクリート建込　　SS000123　　単第0 -0093　表

- 塗装品_Gr-C-2B　　[規]21m以上100m未満　　1　　m　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
標準型【材工共】 コンクリート建込・塗装品(白色) Gr-C-2B	1.000	m			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=1 - C=2 [規]21m以上100m未満 F=1 -			B=3 塗装品_Gr-C-2B E=1 - G=1 -		
H=1 -			I=1 -		

施工単価表

区画線設置(溶融式)　SDT00001　単第0 -0094　表

実線_15cm　1000　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	49.350	L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=1　昼間施工 C=1　実線_15cm E=1　アスファルトに設置の場合			B=1　白色 D=1　塗布厚t=1.5mm F=1　時間的制約なし		
G=1　- I=1　-			H=1　- J=1　-(全ての費用)		

施工単価表

区画線設置(溶融式)　SDT00001　単第0 -0094　表

実線_15cm　1000　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

境界鋲　　SS000097　　単第0 -0095　表

設置［規]30枚以上　　1　　枚　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
境界鋲設置【手間のみ】 　設置	1.000	枚			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	枚			
A=1　設置 C=1　-			B=1　[規]30枚以上 D=1　-		

施工単価表

掘削(表土剥ぎ取り)　　SPK26040001　　単第0 -0096　表

土砂 上記以外(小規模)　　標準　　1　　m3　　当り

機械構成比: 27.65%　労務構成比: 61.34%　材料構成比: 11.01%　市場単価構成比: 0.00%　　標準単価： 1,342.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 バケット容量0.28m3	27.65%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0.28m3		MTPC00185 MTPT00185
運転手(特殊)	61.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂 E=7　標準			B=5　上記以外(小規模)		

施工単価表

掘削(撤去)　　SPK26040001　　単第0 -0097　表

土砂 上記以外(小規模)　　標準　　1　　m3　　当り

機械構成比:　27.65%　　労務構成比:　61.34%　　材料構成比:　11.01%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　1,342.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 バケット容量0.28m3	27.65%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0.28m3		MTPC00185 MTPT00185
運転手(特殊)	61.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂 E=7　標準			B=5　上記以外(小規模)		

施工単価表

整地　　SPK26040003　　単第0 -0098　表

敷均し(ルーズ)　　施工数量10,000m3未満 障害無し　　1　m3　当り

機械構成比: 21.78%　労務構成比: 53.54%　材料構成比: 24.68%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 132.74000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	21.78%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)	53.54%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	24.68%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2　敷均し(ルーズ) C=1　障害無し			B=1　施工数量10,000m3未満		

数　量　計　算　書

道面郷線道路改良工事

東広島市河内町入野

東　　広　　島　　市

設 計 数 量 総 括 表

費 目	工 種	種 別	細 目	単位	数 量	変更数量	数量増減	摘 要
本工事費								
	道路土工							
	掘削工	オープン	砂質土	m3	546			
		〃	粘性土(肥土)	m3	96			
	盛土工	路体盛土	W<1.0	m3	13			
		〃	1.0≦W<2.5	m3	4			
		〃	2.5≦W<4.0	m3	343			
		〃	4.0≦W	m3	254			
		路床盛土	W<1.0	m3	9			
		〃	1.0≦W<2.5	m3	2			
		〃	2.5≦W<4.0	m3	110			
		〃	4.0≦W	m3	330			
	不足土	良質土	運搬(地山)	m3	364			
			ほぐし	m3	437			
	残土処分		粘性土	m3	86			
	法面整形							
		切土法面整形	土砂	㎡	88			
		盛土法面整形	1：1.2	㎡	203			
	構造物撤去工							
	舗装切断工	アスファルト舗装版	t=4cm	m	138			
	舗装版取壊	アスファルト舗装版	t=4cm	m2	954			
	構造物取壊	コンクリート取壊	無 筋	m3	17			
		ブロック取壊	控え350	m2	30			
	運搬処分工	コンクリート殻	無 筋	m3	17			
	〃	アスファルト殻		m3	38			
	〃	ブロック殻	無 筋	m3	11			
	法面工							
	切土	切土法面工	植生マット	m2	85			
	切土	防草対策工(1:1.0)	ｺﾝｸﾘｰﾄ t=7cm	m2	16			
	盛土	張コンクリート(1:1.2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ t=7cm	m2	262			

設　計　数　量　総　括　表

費　目	工　種	種　別	細　目	単位	数　量	変更数量	数量増減	摘　要
	擁壁工							
	作業土工							
		床　掘	土　砂	m3	445			
		埋　戻	埋戻C	m3	203			
		〃	埋戻D	m3	115			
		〃	埋戻M	m3	8			肥土
		基面整正	土　砂	m2	199			
	嵩上工	コンクリート	σck=18N/mm2	m	17			
	重力式擁壁	東広島市標準設計						
		コンクリート	σck=18N/mm2	m3	91			1号擁壁:65m3
		型　枠	無筋	m2	367			wl-s-25-c-1:22m3
		基　礎　材	RC-40　t=15cm	m2	91			sgw42:4m3
		基　礎　材	RC-40　t=20cm	m2	34			
		基　礎　材	均しCo　t=10cm	m2	7			
		目　地　材	ｴﾗｽﾀｲﾄ t=10mm	m2	9			
		水　抜　管	φ150	m	7			
		吸出防止材	300×300	枚	15			
	ブロック積							
		２号ブロック積	控え350 t=100cm	m^2	164			
		裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N/mm2	m^3	16			
		胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N/mm2	m^3	36			
		裏込砕石	RC-40	m^3	126			
		目地材	ｴﾗｽﾀｲﾄ t=10mm	m^2	7			
		水抜管	φ150	m	10			
		吸出防止材	300×300	枚	20			
		ブロック積基礎	B520-H300	m	64			
		天端コンクリート	18N/mm2	m	65			
	排水工							
	作業土工							
		床　掘	土　砂	m3	269			
		埋　戻	埋戻D	m3	146			
			埋戻M	m3	0			
		基面整正	砂質土	m2	273			

設　計　数　量　総　括　表

費　目	工　　種	種　　別	細　　目	単位	数　量	変更数量	数量増減	摘　　要
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝	PU3型	B300-H300	m	308			
		PU1型	B300-H300	m	69			
		自由勾配側溝(1/5)	B300	m	6			
		自由勾配側溝(2/5)	B500	m	72			
		自由勾配側溝(3/5)	B300	m	40			
		埋戻コンクリート		m3	9			
	場所打水路	1号L型水路	B300-H300	m	1			
		2号L型水路	B300-H300～340	m	77			
		U2(GL)B300H300		m	3			
		取水水路		m	3			
	管渠工	重圧管	φ200	m	8			
		重圧管	φ300	m	41			
		ヒューム管	P1-RC1-D300	m	9			
		塩　ビ　管	φ150	m	9			
		〃	φ200	m	10			
		管接続工		箇所	1			
	集水桝	1号集水桝	B500-L500-H600	箇所	4			
		2号集水桝	B500-L1200-H600	箇所	1			
		3号集水桝(1)	B500-L300-H500	箇所	1			
		4号集水桝(1)	B500-L300-H500	箇所	1			
		4号集水桝(2)	B500-L500-H1000	箇所	1			
		5号集水桝	B600-L600-H900	箇所	1			
		7号集水桝	B500-L500-H500	箇所	4			
		〃	B500-L500-H600	箇所	1			
		8号集水桝	B500-L500-H1300	箇所	1			
		9号集水桝	B600-L600-H1500	箇所	1			
		13号集水桝	B600-L600-H750	箇所	1			
		AS桝	300×600×600	箇所	1			
	水路蓋	水路蓋工	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	79			
	防護柵工							
		ガードレール	Gr-C-2B	m	75			
		ガードレール	Gr-C-4E	m	67			

設 計 数 量 総 括 表

費 目	工 種	種 別	細 目	単位	数 量	変更数量	数量増減	摘 要
	舗装工							
	車 道 部	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装						
	表 層	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ	13 t= 4cm	m2	1753			
	路 盤	再生粒度調整砕石	RM-30 t=12cm	m2	1698			既設拡幅部
	路床安定処理	セメント改良	t=65cm	m2	1143			新設部
		セメント改良	t=50cm	m2	0			
	坂 路	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装						
	表 層	ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2	t=10cm	m2	88			
	路 盤 紙			m2	88			
	路 盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-30 t=10cm	m2	88			
	アスカーブ			m	68			
	張ｺﾝｸﾘｰﾄ							
		ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2	t=7cm	m2	83			
	区画線工							
	溶融式区画線							
		車道外側線	実線白15cm	m	554			A路線施工延長×2
	境界工							
	境界鋲			箇所	87			
	仮設工							
	仮設道路工							
		掘削	表土剥取	m3	70			
		路体盛土	2.5≦W<4.0	m3	70			
		掘削	撤去	m3	70			
		整地	敷均し	m3	70			
		購入土	ほぐし	m3	100			
	交通誘導員			人	6			

道　路　土　工

道路土工数量集計表

種別・工種	細　　別	規　　格	単位	数　　量		備　　考
				実数値	積算値	
土　工						
掘削工	オープン	砂質土	m3	546.3	546	
		粘性土(肥土)	m3	95.7	96	
盛土工	路体盛土	W<1.0	m3	12.8	13	
	〃	1.0≦W<2.5	m3	3.9	4	
	〃	2.5≦W<4.0	m3	342.8	343	
	〃	4.0≦W	m3	253.8	254	
	路床盛土	W<1.0	m3	8.8	9	
	〃	1.0≦W<2.5	m3	2.2	2	
	〃	2.5≦W<4.0	m3	109.6	110	
	〃	4.0≦W	m3	330.2	330	
搬入土	不足土	良質土	m3	364.2	364	地山
			m3	437.0	437	ほぐし
運搬処分工		粘性土(肥土)	m3	86.4	86	
法面整形工						
	切土法面整形	土砂 1：1.0	m2	88.4	88	
	盛土法面整形	1：1.2	m2	202.9	203	

土 量 配 分

切土工

	掘削工種	土　質	単位	発生土量
切	片　　切	土砂	m^3	
			m^3	
			m^3	
			m^3	
	オープン	土砂	m^3	546.3
		粘性土	m^3	95.7
			m^3	
土	合　　計		m^3	**642.0**
			m^3	

土　質	単位	発生土量
土砂	m^3	1333.1
粘性土	m^3	95.7

1182.3　×　0.9
＝　1064.1

盛土工

	種　　別	細　　別	単位	土　　量
盛	路体盛土	W<1.0	m^3	12.8
		1.0≦W<2.5	m^3	3.9
		2.5≦W<4.0	m^3	342.8
		4.0≦W	m^3	253.8
	路床盛土	W<1.0	m^3	8.8
		1.0≦W<2.5	m^3	2.2
		2.5≦W<4.0	m^3	109.6
		4.0≦W	m^3	330.2
土	盛　　土	路外盛土	m^3	
	合　　計		m^3	**1064.1**
	合　　計		m^3	**0.0**

作業土工

	掘削工種	土　質	単位	発生土量
床	機　　械	土砂	m^3	714.4
			m^3	
掘			m^3	
			m^3	
	合　　計		m^3	**714.4**

515.0　×　0.9
＝　463.5

9.3　×　0.9
＝　8.4

作業土工

	種　　別	埋　戻　幅	単位	土　　量
埋	土砂	C	m^3	202.7
	土砂	D	m^3	260.8
	合　　計		m^3	**463.5**
戻	土砂	M	m^3	8.4
	合　　計		m^3	**8.4**

仮設工

	盛土(締固)	購入土	掘削(撤去)
工事用道路	72.4	96.5	72.4

()書きは不足土　　ほぐし土量

購入土	土　砂	1333.1 − 1182.3 − 515.0 +	(364.2) m^3	437.0 m^3
残土処分	粘性土	95.7 − 9.3 −	86.4 m^3	
		− −	m^3	
		− −	m^3	

作業土工数量集計表

種別・工種	細　　別	規　　格	単位	数　　量						備　　考
				擁壁工	排水工				合計	
作業土工	床　掘	土　砂	m3	445.4	269.0				714.4	
	埋　戻	C	m3	202.7					202.7	
	〃	D	m3	115.2	145.6				260.8	
	〃	M	m3	8.4	0.0				8.4	
	基面整正	土　砂	m2	199.3	273.2				472.5	

道路土工数量計算書

道路土工（掘削工）

測点名称	区間距離	土砂			粘性土									備　考
		面積	平 均	立積	面積	平 均	立積	面積	平 均	立積	面積	平 均	立積	
ABPBC.1	0.0	0.5	－	－										
ASP.1	6.3	12.9	6.70	42.2		－	－							
AEC.1	6.3	6.6	9.75	61.4										
ABC.2	3.6	6.4	6.50	23.4										
ASP.2	20.3	4.4	5.40	109.6										
AEC.2	20.3	4.1	4.25	86.3										
ABC.3	7.5	3.4	3.75	28.1										
ASP.3	8.8	3.1	3.25	28.6										
AEC.3	8.8	2.4	2.75	24.2	0.8	－	－							
ANO.5	11.9				1.5	1.15	13.7							
ANO.5	18.0	0.0	1.20	21.6	1.5									
ABC.4	7.9	0.1	0.05	0.4	1.4	1.45	11.5							
ASP.4	5.7	0.3	0.20	1.1	1.2	1.30	7.4							
AEC.4	5.7	0.2	0.25	1.4	1.2	1.20	6.8							
ANO.7	20.6	0.3	0.25	5.2	1.4	1.30	26.8							
ABC.5	17.9	0.3	0.30	5.4	1.4	1.40	25.1							
		0.5			0.0									
ABC.5	0.9	0.5	0.50	0.5	0.0									
	2.9	0.5	0.50	1.5	0.0									
ASP.5	7.8	0.8	0.65	5.1										
AEC.5	10.7	0.7	0.75	8.0										
ANO.10	19.8	0.3	0.50	9.9										
ABC.6	22.0	0.9	0.60	13.2										
ASP.6	14.9	2.8	1.85	27.6										
AECBC7	14.9	0.2	1.50	22.4										
ASP.7	11.3	0.7	0.45	5.1										
AEC.7	11.3	1.3	1.00	11.3										
ANO.13 + 17.000	2.7	0.8	1.05	2.8	0.0	－	－							
ABC.8	14.2													
AEC.8	5.9													
ABC.9	23.4													
ASP.9	18.8													
AEC.9	18.8													
ANO.19	21.8													
ABC.10	6.2													
ASP.10	8.3													
AEC.10	8.3													
					0.7									
SBP	2.0				0.7	0.70	1.4							
	4.3				0.7	0.70	3.0							
小　計	420.8	m		546.3	m^3		95.7	m^3						
合　計	550.5	m		546.3	m^3		95.7	m^3						

道路土工数量計算書

道路土工（路体盛土）

測点名称	区間距離	W<1.0			1.0≦W<2.5			2.5≦W<4.0			4.0≦W			備　考
		面積	平 均	立積	面積	平 均	立積	面積	平 均	立積	面積	平 均	立積	
ABPBC.1	0.0													
ASP.1	6.3	0.0	－	－										
AEC.1	6.3	0.0												
ABC.2	3.6	0.0												
ASP.2	20.3	0.0			0.0	－	－							
AEC.2	20.3	0.0			0.0									
ABC.3	7.5	0.0	－	－	0.0			0.0	－	－				
ASP.3	8.8	0.0			0.0			0.0						
AEC.3	8.8	0.6	0.30	2.6				0.0			0.0	－	－	
ANO.5	11.9	0.0	0.30	3.6	0.0	－	－	4.3	2.15	25.6	2.9	1.45	17.3	
ABC.4	7.9				0.2	0.10	0.8	3.7	4.00	31.6	5.8	4.35	34.4	
ASP.4	5.7				0.0	0.10	0.6	3.7	3.70	21.1	5.8	5.80	33.1	
AEC.4	5.7							6.0	4.85	27.6	2.8	4.30	24.5	
ANO.7	20.6							5.3	5.65	116.4	4.1	3.45	71.1	
ABC.5	17.9	0.0	－	－				5.3	5.30	94.9	4.1	4.10	73.4	
								5.5						
ABC.5	0.9							5.5	5.50	5.0				
	2.9							5.5	5.50	16.0				
		0.5												
ASP.5	7.8	0.5	0.50	3.9										
AEC.5	10.7	0.0	0.25	2.7										
ANO.10	19.8													
ABC.6	22.0													
ASP.6	14.9													
AECBC7	14.9							0.0	－	－				
ASP.7	11.3							0.4	0.20	2.3				
AEC.7	11.3							0.0	0.20	2.3				
ANO.13 + 17.000	2.7													
ABC.8	14.2													
AEC.8	5.9													
ABC.9	23.4													
ASP.9	18.8													
AEC.9	18.8													
ANO.19	21.8													
ABC.10	6.2													
ASP.10	8.3													
AEC.10	8.3													
	0.0				0.4									
SBP	2.0				0.4	0.40	0.8							
	4.3				0.4	0.40	1.7							
小　計	402.8	m		12.8	m^3		3.9	m^3		342.8	m^3		253.8	m^3
合　計	532.5	m		12.8	m^3		3.9	m^3		342.8	m^3		253.8	m3

道路土工数量計算書

道路土工（路床盛土）

測点名称	区間距離	W<1.0			1.0≦W<2.5			2.5≦W<4.0			4.0≦W			備　考
		面積	平 均	立積	面積	平 均	立積	面積	平 均	立積	面積	平 均	立積	
ABPBC.1	0.0	0.0	－	－										
ASP.1	6.3	0.3	0.15	0.9										
	2.3	0.3	0.30	0.7										
ABC.2	3.6					－	－							
ASP.2	20.3													
AEC.2	20.3													
ABC.3	7.5	0.0	－	－										
ASP.3	8.8	0.1	0.05	0.4				0.0	－	－				
AEC.3	8.8	0.0	0.05	0.4				0.8	0.40	3.5	0.0	－	－	
		0.8												
ANO.5	11.9	0.0	0.40	4.8										
ANO.5	18.0							0.0	0.40	7.2	5.9	2.95	53.1	
ABC.4	7.9										6.0	3.00	23.7	
ASP.4	5.7										5.6	5.80	33.1	
AEC.4	5.7										4.6	5.10	29.1	
ANO.7	20.6				0.0	－	－				5.1	4.85	99.9	
ABC.5	17.9	0.0	－	－	0.0						5.1	5.10	91.3	
					0.6									
ABC.5	0.9				0.6	0.60	0.5							
	2.9				0.6	0.60	1.7							
		0.1												
ASP.5	10.7	0.1	0.10	1.1	0.0									
AEC.5	10.7	0.0	0.05	0.5				0.0	－	－				
ANO.10	19.8							1.0	0.50	9.9				
ABC.6	22.0							0.0	0.50	11.0				
ASP.6	14.9							0.0	－	－				
AECBC7	14.9							0.9	0.45	6.7				
ASP.7	11.3							4.0	2.45	27.7				
AEC.7	11.3							2.7	3.35	37.9				
ANO.13 + 17.000	2.7							1.5	2.10	5.7				
ABC.8	14.2													
AEC.8	5.9													
ABC.9	23.4													
ASP.9	18.8													
AEC.9	18.8													
ANO.19	21.8													
ABC.10	6.2													
ASP.10	8.3													
AEC.10	8.3													
小　計	413.4	m		8.8	m^3		2.2	m^3		109.6	m^3		330.2	m^3
合　計	573.0	m		8.8	m^3		2.2	m^3		109.6	m3		330.2	m3

法面整形工数量計算書

法面整形

測点名称	区間距離	切土(左)			切土(右)									備　考
		L	平 均	面積	L	平 均	面積	面積	平 均	立積	面積	平 均	立積	
A路線														
	0.0	1.1	－	－										
AEC.1	4.8	2.0	1.55	7.4										
ABC.2	3.6	1.9	1.95	7.0										
ASP.2	21.0	1.1	1.50	31.5										
AEC.2	21.0	0.8	0.95	20.0										
ABC.3	7.5	0.9	0.85	6.4										
ASP.3	9.6	0.7	0.80	7.7										
AEC.3	9.6	0.2	0.45	4.3										
	3.0	0.0	0.10	0.3										
	0.0				0.0	－	－							
ASP.6	7.8				0.7	0.35	2.7							
	1.1				0.8	0.75	0.8							
	0.5				0.4	0.60	0.3							
B路線														
	0.0													
BEC.1	2.0													
	2.2													
	0.0													
BBC.2	3.5													
	3.1													
	0.7													
BSP.2	0.0													
	1.8													
NO.1 + 14.000	4.4													
	5.0													
	0.0													
	0.8													
	2.2													
	9.1													
合　計	124.3	m		84.6	m^2		3.8	m^2						
左右合計	124.3						88.4	m^2			平均法長			0.71m

法面整形工数量計算書

法面整形

測点名称	区間距離	盛土(左)			盛土(右)									備　考
		L	平 均	面積	L	平 均	面積	面積	平 均	立積	面積	平 均	立積	
	0.0				0.0	－	－							
NO.5	11.7				1.5	0.75	8.8							
ABC.4	7.9				2.3	1.90	15.0							
ASP.4	4.1				2.6	2.45	10.0							
AEC.4	4.1				2.6	2.60	10.7							
ANO.7	20.6				2.5	2.55	52.5							
	17.9				2.5	2.50	44.8							
	0.0				1.8	－	－							
AECBC.7	10.8				0.7	1.25	13.5							
	1.8				0.5	0.60	1.1							
	0.0				0.0	－	－							
	7.4				2.4	1.20	8.9							
ASP.7	5.5				2.0	2.20	12.1							
	11.0				1.8	1.90	20.9							
	5.1				0.0	0.90	4.6							
	0.0													
ABC.9	6.3													
ASP.9	17.2													
AEC.9	17.2													
ANO.19	21.8													
ABC.10	6.2													
BBC.1	6.2													
BSP.1	5.7													
	0.0													
BSP.3	0.5													
	6.6													
	0.0													
	1.1													
BNO.3	0.2													
BNO.3 + 8.000	8.0													
	1.8													
	0.0													
	0.7													
	12.2													
	0.0													
BBC.1	3.9													
BSP.1	7.5													
合　計	231.0	m		0.0	m^2		202.9	m^2						
左右合計	231.0						202.9	m^2			平均法長			0.88m

構造物撤去工

構造物撤去工数量集計表

種別・工種	細　　別	規　　格	単位	数　　量		備　　考
				実数値	積算値	
構造物撤去工						
舗装切断工	アスファルト舗装	t=4cm	m	138.1	138	
舗装版取壊	アスファルト舗装版	t=4cm	m2	954.1	954	
構造物取壊	コンクリート取壊	無筋	m3	17.0	17	
構造物取壊	ブロック積取壊	控え350	m2	29.9	30	
運搬処分工	コンクリート殻		m3	17.0	17	
〃	アスファルト殻		m3	38.2	38	
〃	ブロック殻		m3	10.5	11	

構造物撤去 延長調書

アスファルト舗装切断工

アスファルト舗装切断(t=4cm)							
測　　点	延　長						摘　要
						合　計	
A路線起点(舗装根拠図より)	18.5					18.5	
A,B路線交差点(舗装根拠図より)	2.5					2.5	
B路線NO.1交差点(舗装根拠図より)							
B路線NO.3+16交差点(舗装根拠図より)							
B路線終点(舗装根拠図より)							
計	21.0					21.0 m	
						合　計	

アスファルト舗装切断(t=4cm)							
測　　点	延　長						摘　要
						合　計	
SBP ～ SNO.1	20.0					20.0	
SNO.1 ～ SNO.2	20.0					20.0	
SNO.2 ～ SNO.3	20.0					20.0	
SNO.3 ～ SNO.3 + 13.1	13.1					13.1	
SNO.3 + 13.1 ～ SNO.4	6.9					6.9	
SNO.4 ～ SNO.5	20.0					20.0	
SNO.5 ～ SNO.5 + 14.1	14.1	3.0				17.1	
計	114.1	3.0				117.1 m	
合　計						138.1 m	

構造物撤去工数量計算書

構造物、舗装版取壊工

測点名称	区間距離	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装			ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊			ﾌﾞﾛｯｸ取壊			備　考
		幅	平　均	面積	面積	平　均	立積	幅	平　均	面積	
ABPBC.1	0.0	5.0	－	－							
ASP.1	6.3	2.1	3.55	22.4							
AEC.1	6.3	2.0	2.05	12.9							
ABC.2	3.6	2.0	2.00	7.2							
ASP.2	20.3	2.2	2.10	42.6							
AEC.2	20.3	2.3	2.25	45.7							
ABC.3	7.5	2.2	2.25	16.9							
ASP.3	8.8	2.0	2.10	18.5							
AEC.3	8.8	2.0	2.00	17.6							
ANO.5	18.0	2.1	2.05	36.9							
ABC.4	7.9	4.6	3.35	26.5							
ASP.4	5.7	3.0	3.80	21.7							
AEC.4	5.7	3.1	3.05	17.4							
ANO.7	20.6	2.4	2.75	56.7							
ABC.5	18.8	4.2	3.30	62.0							
ASP.5	10.7	3.2	3.70	39.6							
AEC.5	10.7	3.1	3.15	33.7							
ANO.10	19.8	3.1	3.10	61.4							
ABC.6	22.0	3.5	3.30	72.6							
ASP.6	14.9	3.2	3.35	49.9							
AECBC7	14.9	2.5	2.85	42.5							
ASP.7	11.3	2.5	2.50	28.3							
AEC.7	11.3	3.0	2.75	31.1							
ANO.13 + 17.000	2.7	5.7	4.35	11.7							
	5.5	5.0	5.35	29.4							
ASP.1					0.15						
AEC.1	12.6				0.12	0.14	1.8				
ABC.5					2.13						
	3.6				2.13	2.13	7.7				
					0.15						
AEC.5	4.7				0.15	0.15	0.7				
					0.06						
ANO.10	17.7				0.06	0.06	1.1				
ABC.6	22.0				0.03	0.05	1.1				
AECBC7					0.09						
ASP.7	11.3				0.03	0.06	0.7				
AEC.7	11.3				0.00	0.02	0.2				
ANO.13 + 17.000	2.7				0.03	0.02	0.1				
小　計	368.3	m		805.2	m^2		13.4	m^3			m^2

構造物撤去工数量計算書

構造物、舗装版取壊工

測点名称	区間距離	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装			ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊			ﾌﾞﾛｯｸ取壊			備　考
		幅	平　均	面積	面積	平　均	立積	幅	平　均	面積	
ABC.4								1.2			
ASP.4	5.1							1.5	1.35	6.9	
AEC.4	3.2							1.5	1.50	4.8	
	12.1							1.5	1.50	18.2	
					0.51						
SBP	3.1	0.0	－	－	0.51	0.51	1.6				
	4.0				0.51	0.51	2.0				
SNO.1	20.0	0.8	0.40	8.0							
SNO.2	20.0	0.9	0.85	17.0							
SNO.3	20.0	0.9	0.90	18.0							
SNO.3 + 13.14	13.1	0.9	0.90	11.8							
SNO.4	6.9	1.4	1.15	7.9							
SNO.5	20.0	1.3	1.35	27.0							
	14.1	1.3	1.30	18.3							
		3.1									
SNO.6	5.9	3.1	3.10	18.3							
	7.3	3.1	3.10	22.6							

法　面　工

法面工数量集計表

種別・工種	細　　別	規　　格	単位	数　　量		備　　考
				実数値	積算値	
法面工						
植生工	切土法面工	植生マット	㎡	84.6	85	
法面保護工	切土法面工	防草対策工	㎡	15.8	16	
	盛土法面工	張コンクリート	㎡	262.0	262	

法面工数量計算書

植生工

測点名称	区間距離	切土(左)			切土(右)									備　考
		L	平 均	面積	L	平 均	面積	面積	平 均	立積	面積	平 均	立積	
A路線														
	0.0	1.1	-	-										
AEC.1	4.8	2.0	1.55	7.4										
ABC.2	3.6	1.9	1.95	7.0										
ASP.2	21.0	1.1	1.50	31.5										
AEC.2	21.0	0.8	0.95	20.0										
ABC.3	7.5	0.9	0.85	6.4										
ASP.3	9.6	0.7	0.80	7.7										
AEC.3	9.6	0.2	0.45	4.3										
	3.0	0.0	0.10	0.3										
合　計	80.1	m		84.6	m^2		0.0	m^2						
左右合計	80.1						84.6	m^2			平均法長			1.06m

法面工数量計算書

防草対策工

測点名称	区間距離	切土(左)			切土(右)									備　考
		L	平 均	面積	L	平 均	面積	面積	平 均	立積	面積	平 均	立積	
A路線														
	0.0				0.5	-	-							
ASP.6	7.8				1.2	0.85	6.6							
	1.6				0.9	1.05	1.7							
B路線														
	0.0													
BEC.1	2.0													
	2.2													
	0.0													
BBC.2	3.5													
	3.1													
	0.7													
BSP.2	0.0													
	1.8													
NO.1 + 14.000	4.4													
	5.0													
	0.0													
	0.8													
	2.2													
	9.1													
S路線														
					0.5									
	3.3				0.5	0.50	1.7							
SNO.3	11.6				0.5	0.50	5.8							
合　計	59.1	m		0.0	m^2		15.8	m^2						
左右合計	59.1						15.8	m^2			平均法長			0.27m

法面工数量計算書

張コンクリート

測点名称	区間距離	盛土(左)			盛土(右)									備　考
		L2	平 均	面積	L2	平 均	面積	面積	平 均	立積	面積	平 均	立積	
	0.0				0.0	－	－							
NO.5	11.7				2.0	1.00	11.7							
ABC.4	7.9				2.8	2.40	19.0							
ASP.4	4.1				3.1	2.95	12.1							
AEC.4	4.1				3.1	3.10	12.7							
ANO.7	20.6				3.0	3.05	62.8							
	17.9				3.0	3.00	53.7							
					2.8	－	－							
AECBC.7	10.8				1.7	2.25	24.3							
	1.8				1.5	1.60	2.9							
					0.0	－	－							
	7.4				2.4	1.20	8.9							
					3.4									
ASP.7	5.5				3.0	2.70	14.9							
	11.0				2.8	2.90	31.9							
	5.1				0.0	1.40	7.1							
	0.0													
ABC.9	6.3													
ASP.9	17.2													
AEC.9	17.2													
ANO.19	21.8													
ABC.10	6.2													
BBC.1	6.2													
BSP.1	5.7													
	0.0													
BSP.3	0.5													
	6.6													
	0.0													
	1.1													
BNO.3	0.2													
BNO.3 + 8.000	8.0													
	1.8													
	0.0													
	0.7													
	12.2													
	0.0													
BBC.1	3.9													
BSP.1	7.5													
合　計	231.0	m		0.0	m^2		262.0	m^2						
左右合計	231.0						262.0	m^2			平均法長			1.13m

擁　壁　工

擁壁工数量集計表

種別・工種	細　　別	規　　格	単位	数　　量		備　　考
				実数値	積算値	
擁壁工						
作業土工						
	床　　掘	土　砂	m^3	445.4	445	
	埋　　戻	埋戻C	m^3	202.7	203	
	〃	埋戻D	m^3	115.2	115	
	〃	埋戻M	m^3	8.4	8	肥土
	基面整正	土　砂	m^2	199.3	199	
嵩上工	コンクリート	σck=18N/mm2	m	17.2	17	
重力式擁壁	東広島市標準設計					
	コンクリート	σck=18N/mm2	m^3	90.6	91	
	型　　枠	無筋	m^2	366.9	367	
	基　礎　材	RC-40　t=15cm	m^2	90.5	91	
	基　礎　材	RC-40　t=20cm	m^2	33.5	34	
	基　礎　材	均しCo　t=10cm	m^2	6.9	7	
	目　地　材	ｴﾗｽﾀｲﾄ t=10mm	m^2	8.5	9	
	水　抜　管	φ150	m	7.1	7	
	吸出防止材	300×300	枚	15.0	15	
ブロック積						
	２号ブロック積	控え350 t=100cm	m^2	163.8	164	
	裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N/mm2	m^3	16.4	16	
	胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N/mm2	m^3	36.0	36	
	裏込砕石	RC-40	m^3	125.7	126	
	目地材	ｴﾗｽﾀｲﾄ t=10mm	m^2	6.6	7	
	水抜管	φ150	m	10.1	10	
	吸出防止材	300×300	枚	20.0	20	
	ブロック積基礎	B520-H300	m	64.4	64	
	天端コンクリート		m	65.1	65	

擁壁工数量計算書

作業土工

測点名称	区間距離	床掘(土砂)			基面整正						備　考
		面積	平均	立積	幅	平均	面積				
道路左側	展開図より										
	0.0	3.5	---	---	1.2	---	---				小型重力
AEC.1	7.5	4.3	3.90	29.3	1.3	1.25	9.4				
ABC.2	3.6	4.3	4.30	15.5	1.3	1.30	4.7				
ASP.2	20.8	3.8	4.05	84.2	1.3	1.30	27.0				
AEC.2	20.8	3.6	3.70	77.0	1.3	1.30	27.0				
ABC.3	7.5	3.5	3.55	26.6	1.3	1.30	9.8				
ASP.3	9.4	3.5	3.50	32.9	1.3	1.30	12.2				
AEC.3	9.4	3.1	3.30	31.0	1.3	1.30	12.2				
	11.5	1.6	2.35	27.0	1.1	1.20	13.8				
BNO.6 + 4.800	0.0										小型重力
	1.6										
BNO.6 + 7.400	0.0										小型重力
	24.6										
合　計	116.7	m		323.5	m3		116.1	m2			

擁壁工数量計算書

作業土工

測点名称	区間距離	床掘(土砂)			基面整正						備　考
		面積	平均	立積	幅	平均	面積				
道路右側	展開図より										
	0.0										ブロック積
AEC.1	6.1										
ABC.2	3.6										
ASP.2	19.8										
AEC.2	19.8										
ABC.3	7.5										
ASP.3	8.7										
AEC.3	8.3										
	0.0										ブロック積
ASP.3	2.3										
AEC.3	8.2										
	6.4										
		0.9	---	---	0.7	---	---				
ANO.5	11.8	0.9	0.90	10.6	0.7	0.70	8.3				
ABC.4	8.0	1.0	0.95	7.6	0.7	0.70	5.6				
ASP.4	3.2	1.0	1.00	3.2	0.7	0.70	2.2				
AEC.4	3.2	1.0	1.00	3.2	0.7	0.70	2.2				
ANO.7	20.6	1.1	1.05	21.6	0.7	0.70	14.4				
	17.6	1.1	1.10	19.4	0.7	0.70	12.3				
	0.0										ブロック積
ABC.8	23.6										
AEC.8	6.6										
	17.9										
	0.0	1.3	---	---	0.8	---	---				小型重力
ANO.10	18.6	1.3	1.30	24.2	0.8	0.80	14.9				
ABC.6	22.0	1.2	1.25	27.5	0.7	0.75	16.5				
	0.7	1.2	1.20	0.8	0.7	0.70	0.5				
	0.0	0.6	0.30		1.0	0.50					
SBP	2.0	0.6	0.60	1.2	1.0	1.00	2.0				
	4.3	0.6	0.60	2.6	1.0	1.00	4.3				
合　計	250.8	m		121.9	m3		83.2	m2			

擁壁工数量計算書

作業土工

測点名称	区間距離	床掘(土砂)			基面整正						備　考
		面積	平均	立積	幅	平均	面積				
道路左側	116.7			323.5			116.1				
道路右側	250.8			121.9			83.2				

擁壁工数量計算書

作業土工

測点名称	区間距離	埋戻（C）			埋戻（D）			埋戻（M）			備　考
		面積	平均	立積	面積	平均	立積	面積	平均	立積	
道路左側	展開図より										
	0.0	1.8	---	---	0.5	---	---				小型重力
AEC.1	7.5	3.0	2.40	18.0	0.5	0.50	3.8				
ABC.2	3.6	2.9	2.95	10.6	0.5	0.50	1.8				
ASP.2	20.8	2.5	2.70	56.2	0.5	0.50	10.4				
AEC.2	20.8	2.2	2.35	48.9	0.5	0.50	10.4				
ABC.3	7.5	2.2	2.20	16.5	0.5	0.50	3.8				
ASP.3	9.4	2.1	2.15	20.2	0.5	0.50	4.7				
AEC.3	9.4	1.7	1.90	17.9	0.5	0.50	4.7				
	11.5	0.8	1.25	14.4	0.2	0.35	4.0				
BNO.6 + 4.800	0.0										小型重力
	1.6										
BNO.6 + 7.400	0.0										小型重力
	24.6										

擁壁工数量計算書

作業土工

測点名称	区間距離	埋戻（C）			埋戻（D）			埋戻（M）			備　考
		面積	平均	立積	面積	平均	立積	面積	平均	立積	
道路右側	展開図より										
	0.0										ブロック積
AEC.1	6.1										
ABC.2	3.6										
ASP.2	19.8										
AEC.2	19.8										
ABC.3	7.5										
ASP.3	8.7										
AEC.3	8.3										
	0.0										ブロック積
ASP.3	2.3										
AEC.3	8.2										
	6.4										
					0.6	---	---	0.1	---	---	
ANO.5	11.8				0.6	0.60	7.1	0.1	0.10	1.2	
ABC.4	8.0				0.6	0.60	4.8	0.1	0.10	0.8	
ASP.4	3.2				0.6	0.60	1.9	0.1	0.10	0.3	
AEC.4	3.2				0.6	0.60	1.9	0.1	0.10	0.3	
ANO.7	20.6				0.7	0.65	13.4	0.1	0.10	2.1	
	17.6				0.7	0.70	12.3	0.1	0.10	1.8	
	0.0										ブロック積
ABC.8	23.6										
AEC.8	6.6										
	17.9										
	0.0				0.7	---	---				小型重力
ANO.10	18.6				0.7	0.70	13.0				
ABC.6	22.0				0.7	0.70	15.4				
	0.7				0.7	0.70	0.5				
	0.0				0.2	0.10		0.3	0.15		小型重力
SBP	2.0				0.2	0.20	0.4	0.3	0.30	0.6	
	4.3				0.2	0.20	0.9	0.3	0.30	1.3	
合　計	250.8	m		0.0	m3		71.6	m3		8.4	m3

擁壁工数量計算書

作業土工

測点名称	区間距離	埋戻（C）			埋戻（D）			埋戻（M）			備　考
		面積	平均	立積	面積	平均	立積	面積	平均	立積	
道路左側	116.7			202.7			43.6				
道路右側	250.8						71.6			8.4	

擁壁工 延長調書

嵩上工

嵩上工																			
測　　点	延　長						摘　要	測　　点	延　長						摘　要
						合　計								合　計	
ABC.5　付近　右側坂路	17.2					17.2									
計	17.2					17.2　m		計						m	
						合　　計			17.2					17.2 m	

擁壁工-材料集計表

位　置，種　別	延長 ヶ所	ｺﾝｸﾘｰﾄ	型　枠	基礎材RC-40		均しCo	目地材	水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	吸出防止材	摘　要
		18-8-40BB	無筋	t=150	t=200	t=100	t=10mm	φ150	300X300	
左側										
ANO.0付近～ANO.4+13.50(1号重力式擁壁)	90.53	64.5	249.9	90.5			6.4	3.4	8.0	
BNO.6+5.10付近(W1-S-20-C-1)										
BNO.6+7.40付近(W1-S-20-C-1)										
右側										
ANO.9+1.8～ANO.11+2.7(W1-S-25-C-1)	41.24	21.9	101.7		33.5		2.1	2.5	5.0	
SBP-2.0～SBP+4.3	6.32	4.2	15.3			6.9	0.0	1.2	2.0	
	m	m^3	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m	枚	
合　計	138.09	90.6	366.9	90.5	33.5	6.9	8.5	7.1	15.0	

重力式擁壁数量計算書

道路左側　　ANO.0付近～ANO.4+13.50(1号重力式擁壁)

測点	距離	コンクリート			型枠			基礎材			足場工			摘要
		断面積	平均	体積	長さ	平均長	面積	幅	平均幅	面積	高さ	平均高	面積	H
		0.51			2.21			0.89						1.080
AEC.1	7.50	0.75	0.630	4.73	2.87	2.540	19.1	1.02	0.955	7.2				1.400
ABC.2	3.60	0.75	0.750	2.70	2.87	2.870	10.3	1.02	1.020	3.7				1.400
ASP.2	20.80	0.75	0.750	15.60	2.87	2.870	59.7	1.02	1.020	21.2				1.400
AEC.2	20.80	0.75	0.750	15.60	2.87	2.870	59.7	1.02	1.020	21.2				1.400
ABC.3	7.50	0.75	0.750	5.63	2.87	2.870	21.5	1.02	1.020	7.7				1.400
ASP.3	9.40	0.75	0.750	7.05	2.87	2.870	27.0	1.02	1.020	9.6				1.400
AEC.3	9.40	0.75	0.750	7.05	2.87	2.870	27.0	1.02	1.020	9.6				1.400
ANO. 4+13.5	11.53	0.31	0.530	6.11	1.57	2.220	25.6	0.76	0.890	10.3				0.765
合計	90.53			64.47			249.9			90.5				

道路左側　　ANO.0付近～ANO.4+13.50(1号重力式擁壁)

平均体積　V＝64.47/90.53=　　0.71　　m^3

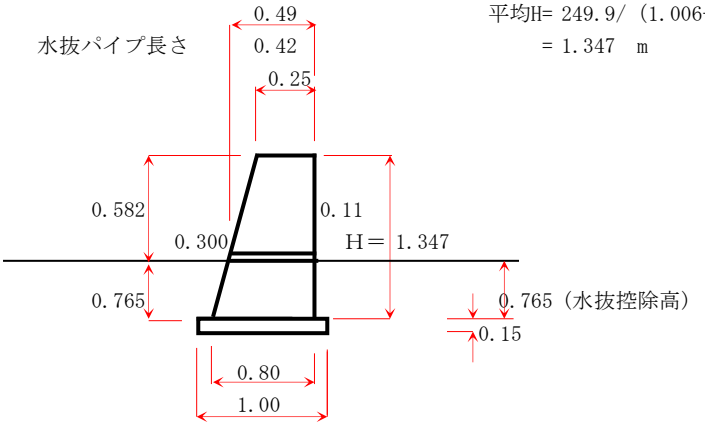

平均H= 249.9/ (1.006+1.044) /90.53
= 1.347　m

目地材(10m/ヶ所,t=10mm)	9	ヶ所	A=0.71×9=	6.4	m^2
水抜きパイプ(7㎡/ヶ所,φ150mm)	n=(1.347-0.765)×90.53/7=	8	ヶ所	L=0.42×8=	3.4 m
吸出防止材(300×300)	n=8枚				
足場工　単管傾斜足場					掛m^2
足場工　枠組足場					掛m^2

重力式擁壁数量計算書

道路右側　　ANO.9+1.8～ANO.11+2.7(W1-S-25-C-1)

測　点	距 離	コンクリート			型　枠			基 礎 材			足 場 工			摘 要
		断面積	平 均	体 積	長 さ	平均長	面 積	幅	平均幅	面 積	高 さ	平均高	面 積	H
NO. 9+1.40	0.00	0.74			3.13			0.91						1.533
ANO. 10+0.0	18.60	0.56	0.650	12.09	2.60	2.865	53.3	0.83	0.870	16.2				1.274
ABC.6	21.97	0.31	0.435	9.56	1.71	2.155	47.3	0.70	0.765	16.8				0.835
	0.67	0.30	0.305	0.20	1.65	1.680	1.1	0.69	0.695	0.5				0.805
合　計	41.24			21.85			101.7			33.5				

道路右側　　ANO.9+1.8～ANO.11+2.7(W1-S-25-C-1)

平均体積　V＝21.85/41.24=　　0.53　　m^3

水抜パイプ長さ

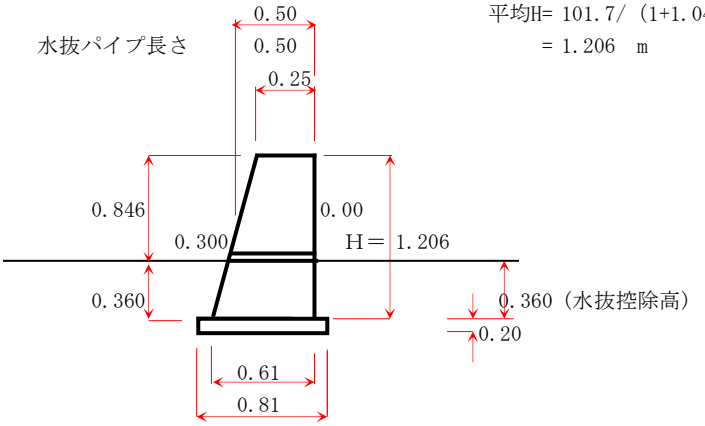

平均H= 101.7/ (1+1.044) /41.24
= 1.206　m

目地材(10m/ヶ所,t=10mm)	4　ヶ所	A=0.53×4=	2.1　m^2
水抜きパイプ(7㎡/ヶ所,φ150mm)	n=(1.206-0.36)×41.24/7=　5　ヶ所	L=0.5×5=	2.5　m
吸出防止材(300×300)	n=5枚		
足場工　単管傾斜足場			掛m^2
足場工　枠組足場			掛m^2

重力式擁壁数量計算書

SGW42

測　　点	距 離	コンクリート			型　　枠			基 礎 材			足場工			摘 要
		断面積	平 均	体　積	長　さ	平均長	面　積	幅	平均幅	面　積	設置高	平均幅	面　積	H
	0.000	0.60			2.25			1.03						1.060
	1.965	0.66	0.630	1.24	2.40	2.325	4.6	1.07	1.050	2.1				1.135
	0.989	0.68	0.670	0.66	2.44	2.420	2.4	1.08	1.075	1.1				1.153
	3.366	0.71	0.695	2.34	2.52	2.480	8.3	1.10	1.090	3.7				1.190
合　　計	6.32			4.24			15.3			6.9			0.00	

SGW42

平均体積　V＝4.24/6.32=　　0.67　　m^3

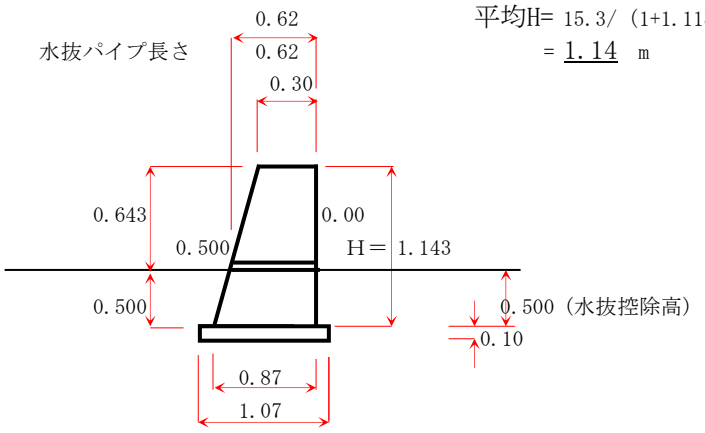

平均H= 15.3/（1+1.118）/6.32
= 1.14 m

目地材(10m/ヶ所, t=10mm)	0	ヶ所	A=0.67×0=	0.0 m^2
水抜きパイプ(2.5㎡/ヶ所, φ50mm)	n=(1.143-0.5)×6.32/2.5=	2	ヶ所	L=0.62×2= 1.2 m
吸出防止材(150×150)	n=2枚			
足場工　枠組み足場				0.0 掛m^2
単管傾斜足場	0.00	×	1.118	0.0 掛m^2

2号ブロック積工	前面勾配 1: 0.5	斜率 1.118	控え厚 0.35 m	砕石控除高
	砕石勾配 1: 0.4	斜率 1.077	裏ｺﾝt= 0.10 m	
	根入れ 0.350 m		砕石上幅= 0.30 m	0.450

追加距離	距離 天端長	距離 基礎工	距離 平均長	積ブロック 法長	積ブロック 平均	積ブロック 面積	裏込砕石 面積	裏込砕石 平均	裏込砕石 立積	摘要
道路右側										1:0.5
ANO.4+8.30	0.000	0.000	0.0	2.6	---	---	0.807	---	---	H=2.330
ANO.5	11.760	11.760	11.8	2.4	2.50	29.5	0.715	0.76	22.4	H=2.150
ABC.4	7.950	7.950	8.0	2.4	2.40	19.2	0.735	0.72	13.8	H=2.190
ASP.4	3.630	3.240	3.4	2.5	2.45	8.3	0.745	0.74	6.1	H=2.210
AEC.4	3.520	3.180	3.4	2.5	2.50	8.5	0.750	0.75	6.4	H=2.220
ANO.7	20.630	20.630	20.6	2.6	2.55	52.5	0.786	0.77	40.4	H=2.290
ANO.7+17.7	17.650	17.590	17.6	2.6	2.60	45.8	0.813	0.80	36.6	H=2.340
ガードレール基礎設置部										
ANO.3+10.7										
SP.3										
EC.3										
NO.4+8.30										
合計	m 65.140	m 64.350	64.800			m2 163.800			m3 125.700	

工　　種	2号ブロック積擁壁	材 料 計 算 書

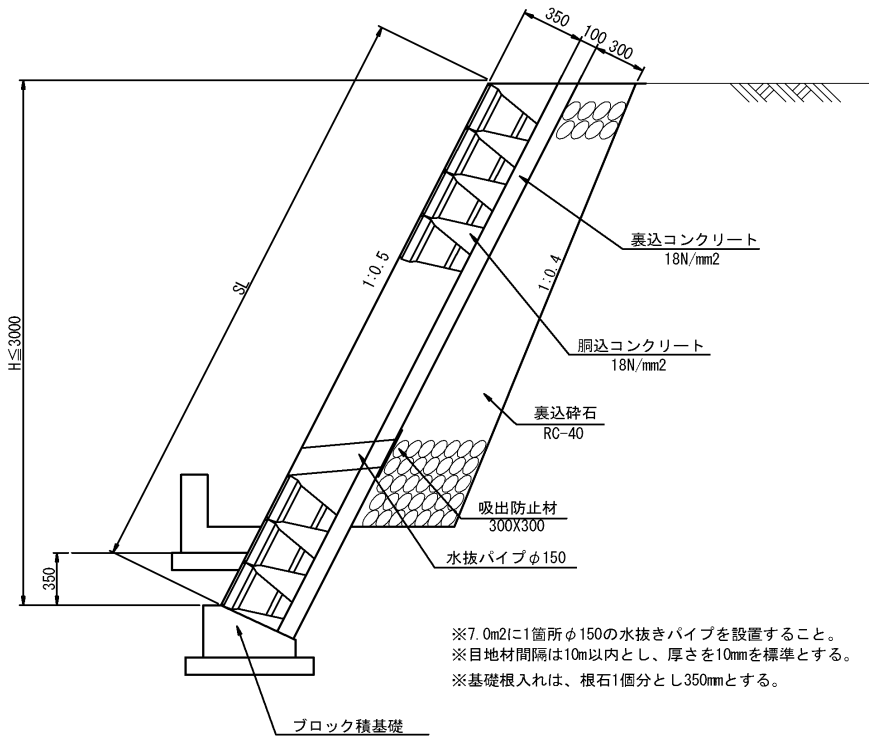

平均H=　2.261　m　　延長L=　64.8 m　　N=　0.50　　（ 1.00 式）

名　　称	規　　格	算　　式	単位	単位数量	延長・面積	数　量
ブロック積	控え35cm	根入れ＝ 0.35	m^2			163.8
裏込コンクリート	σck=18N/mm2	1.00 × 0.10	m^3	0.100	163.8	16.4
胴込コンクリート	σck=18N/mm2	1.00 × 0.22	m^3	0.220	163.8	36.0
裏込砕石	RC-40	別紙計算書より	m^3			125.7
目地材	t=10mm	設置箇所数 64.800 / 10 - 1	箇所	5		
		2.261 × 1.118 × 0.50 + 0.051	m^2	1.315	5.0	6.6
水抜管	Vuφ150	設置箇所数（ 2.261 - 0.350 ）× 1.118 × 64.8 / 7.0	箇所	20		
		箇所当り設置延長 0.45 × 1.118	m	0.503	20.0	10.1
吸出防止材	300 X 300		枚			20.0

ブロック積基礎数量計算書					
基礎工					
位　　置	延長又は個数	備　考	位　　置	延長又は個数	備　考
展開図より(右側)					
ANO.0+7.64～ANO.3+6.19					
ANO.3+6.19～					
ANO.3+10.70～ANO.4+8.30					
ANO.4+8.30～ANO.7+17.70	64.35				
ANO.14+1.48～ANO.15+15.00					
計	64.35	m	計		m

排　水　工

排水工数量集計表

種別・工種	細　　別	規　　格	単位	数　量		備　　考
				実数値	積算値	
排水工						
作業土工						
	床　　掘	土　砂	m3	269.0	269	
	埋　戻	埋戻D	m3	145.6	146	
		埋戻M	m3	0.0	0	
	基面整正	砂質土	m2	273.2	273	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝	PU3型	B300-H300	m	308.4	308	
	PU1型	B300-H300	m	68.5	69	
	自由勾配側溝(1/5)	B300	m	6.1	6	NO.0+1.82～NO.0+7.34
	自由勾配側溝(2/5)	B500	m	71.6	72	SNO.0～SNO.3+12.6
	自由勾配側溝(3/5)	B300	m	39.9	40	SNO.3+13.4～SNO.5+13.3
	埋戻コンクリート	σck=18N/mm2	m3	9.3	9	
場所打水路						
	1号L型水路	B300-H300	m	0.7	1	
	2号L型水路	B300-H300～340	m	76.6	77	
	取水水路		m	3.0	3	
	横断用水路	U2(GL)B300-H300	m	3.0	3	
管渠工	重　圧　管	φ200	m	8.3	8	
	〃	φ300	m	40.7	41	
	ヒューム管	P1-RC1-D300	m	8.5	9	
	塩　ビ　管	φ150	m	9.3	9	
	塩　ビ　管	φ200	m	10.3	10	
	管接続工		箇所	1.0	1	

排水工数量集計表

種別・工種	細　　別	規　　格	単位	数　量		備　　考
				実数値	積算値	
集水桝	1号集水桝	B500-L500-H600	箇所	4.0	4	
	2号集水桝	B500-L1200-H600	箇所	1.0	1	
	3号集水桝(1)	B500-L300-H500	箇所	1.0	1	1:0.5
	4号集水桝(1)	B500-L500-H1000	箇所	1.0	1	
	4号集水桝(2)	B500-L500-H1000	箇所	1.0	1	
	5号集水桝	B600-L600-H900	箇所	1.0	1	
	7号集水桝	B500-L500-H500	箇所	4.0	4	
	〃	B500-L500-H600	箇所	1.0	1	
	8号集水桝	B500-L500-H1300	箇所	1.0	1	
	9号集水桝	B600-L600-H1500	箇所	1.0	1	
	13号集水桝	B600-L600-H750	箇所	1.0	1	
	AS桝	300×600×600	箇所	1.0	1	
水路蓋	水路蓋工	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	79.0	79	

作業土工数量集計表

種別・工種	細　　別	規　　格	単位	数　　量							備　　考
				道路左	道路右	重圧管300	重圧管200	重圧管150	横断溝	合計	
作業土工	床　掘	土　砂	m3	194.3	36.7	33.2	2.3		2.5	269.0	
	埋　戻	D	m3	96.9	23.8	22.6	1.4		0.9	145.6	
	埋　戻	M	m3	0.0	0.0					0.0	
	基面整正	土　砂	m2	201.4	46.9	19.5	3.3		2.1	273.2	
	埋戻コンクリート		m3	9.3	0.0					9.3	

排水工数量計算書

作業土工

測点名称	区間距離	土砂			埋戻 (D)			埋戻(Co)			基面整正			備　考
		面積	平 均	立積	面積	平 均	立積	面積	平 均	立積	幅	平 均	面積	
道路左側														
ANO.5	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-				0.0	-	-	
ABC.4	7.9	0.4	0.20	1.6	0.3	0.15	1.2				0.6	0.30	2.4	
ASP.4	6.8	0.5	0.45	3.1	0.3	0.30	2.0				0.6	0.60	4.1	
AEC.4	6.8	0.5	0.50	3.4	0.3	0.30	2.0				0.6	0.60	4.1	
ANO.7	20.6	0.5	0.50	10.3	0.3	0.30	6.2				0.6	0.60	12.4	
ABC.5	18.8	0.5	0.50	9.4	0.3	0.30	5.6				0.6	0.60	11.3	
ASP.5	11.0	0.5	0.50	5.5	0.3	0.30	3.3				0.6	0.60	6.6	
AEC.5	11.0	0.5	0.50	5.5	0.3	0.30	3.3				0.6	0.60	6.6	
ANO.10	19.8	0.5	0.50	9.9	0.3	0.30	5.9				0.6	0.60	11.9	
ABC.6	22.0	0.5	0.50	11.0	0.3	0.30	6.6				0.6	0.60	13.2	
ASP.6	16.3	0.5	0.50	8.2	0.3	0.30	4.9				0.6	0.60	9.8	
AECBC7	16.2	0.4	0.45	7.3	0.3	0.30	4.9				0.6	0.60	9.7	
ASP.7	10.0	0.5	0.45	4.5	0.3	0.30	3.0				0.6	0.60	6.0	
AEC.7	10.0	0.6	0.55	5.5	0.3	0.30	3.0				0.6	0.60	6.0	
ANO.13 + 17.000	2.7	0.5	0.55	1.5	0.3	0.30	0.8				0.6	0.60	1.6	
	3.0	0.5	0.50	1.5	0.3	0.30	0.9				0.6	0.60	1.8	
AEC.8														
ABC.9														
ASP.9														
AEC.9														
ANO.19														
ABC.10														
ASP.10														
AEC.10														
BBC.1														
BSP.1														
BEC.1														
BNO.1														
BBC.2														
BSP.2														
BNO.1 + 14.000														
BBC.3														
BSP.3														
BEC.3														
BNO.3														
BNO.3 + 8.000														
小　計	182.9	m		88.2	m^3		53.6	m^3		0.0	m^3		107.5	m^2

排水工数量計算書

作業土工

測点名称	区間距離	土砂			埋戻 (D)			埋戻(Co)			基面整正			備　考
		面積	平 均	立積	面積	平 均	立積	面積	平 均	立積	幅	平 均	面積	
BNO.3 + 16.000														
BNO.5														
BNO.6														
BEP														
	0.0	0.0			0.2	0.10					0.6	0.30		
SBP	1.6	0.0			0.2	0.20	0.3				0.6	0.60	1.0	
	3.9	0.0			0.2	0.20	0.8				0.6	0.60	2.3	
	0.0	1.1	0.55		0.4	0.30					0.9	0.75		
SNO.1	16.1	1.1	1.10	17.7	0.4	0.40	6.4				0.9	0.90	14.5	
SNO.2	20.0	0.9	1.00	20.0	0.3	0.35	7.0				0.8	0.85	17.0	
SNO.3	20.1	1.2	1.05	21.1	0.4	0.35	7.0				0.9	0.85	17.1	
SNO.3 + 13.140	13.3	1.7	1.45	19.3	0.8	0.60	8.0				1.0	0.95	12.6	
SNO.4	6.6	0.6	1.15	7.6	0.3	0.55	3.6				0.7	0.85	5.6	
SNO.5	19.9	0.6	0.60	11.9	0.3	0.30	6.0				0.7	0.70	13.9	
	14.1	0.6	0.60	8.5	0.3	0.30	4.2				0.7	0.70	9.9	
重圧管は別途計上														
								0.1						
SNO.1	20.3							0.1	0.10	2.0				
SNO.2	20.0							0.1	0.10	2.0				
SNO.3	20.0							0.2	0.15	3.0				
	11.7							0.2	0.20	2.3				
小　計	40.3	m		106.1	m^3		43.3	m^3		9.3			93.9	m^2
合　計	223.2	m		194.3	m^3		96.9	m^3		9.3	m^3		201.4	m^2

排水工数量計算書

作業土工

測点名称	区間距離	土砂			埋戻 (D)			埋戻(Co)			基面整正			備　考
		面積	平 均	立積	面積	平 均	立積	面積	平 均	立積	幅	平 均	面積	
道路右側														
	0.0	0.3	－	－	0.3	－	－				1.0	－	－	
ASP.1	5.4	0.3	0.30	1.6	0.3	0.30	1.6				1.0	1.00	5.4	
	3.0	0.3	0.30	0.9	0.3	0.30	0.9				1.0	1.00	3.0	
	0.0	0.4	－	－	0.3	－	－				0.6	－	－	
ASP.5	6.6	0.4	0.40	2.6	0.3	0.30	2.0				0.6	0.60	4.0	
AEC.5	10.4	0.6	0.50	5.2	0.4	0.35	3.6				0.6	0.60	6.2	
	1.1	0.6	0.60	0.7	0.4	0.40	0.4				0.6	0.60	0.7	
	0.0	0.5	－	－	0.3	－	－				0.6	－	－	
ASP.6	11.8	0.5	0.50	5.9	0.3	0.30	3.5				0.6	0.60	7.1	
AECBC.7	14.1	0.5	0.50	7.1	0.3	0.30	4.2				0.5	0.55	7.8	
ASP.7	13.7	0.5	0.50	6.9	0.3	0.30	4.1				0.5	0.50	6.9	
	11.5	0.5	0.50	5.8	0.3	0.30	3.5				0.5	0.50	5.8	
			－	－		－	－		－	－		－	－	
ABC.9														
ASP.9														
AEC.9														
ANO.19														
ABC.10														
BBC.1			－	－		－	－		－	－		－	－	
BSP.1														
BEC.1														
BNO.1														
BBC.2														
BSP.2														
BNO.1 + 14.000														
BBC.3									－	－				
BSP.3														
BEC.3														
BNO.3														
BNO.3 + 8.000														
BNO.3 + 16.000														
BNO.5														
			－	－		－	－		－	－				
BNO.6														
BEP														
合計	77.6	m		36.7	m^3		23.8	m^3		0.0	m^3		46.9	m^2

重圧管φ300　数量計算書

1式　当り

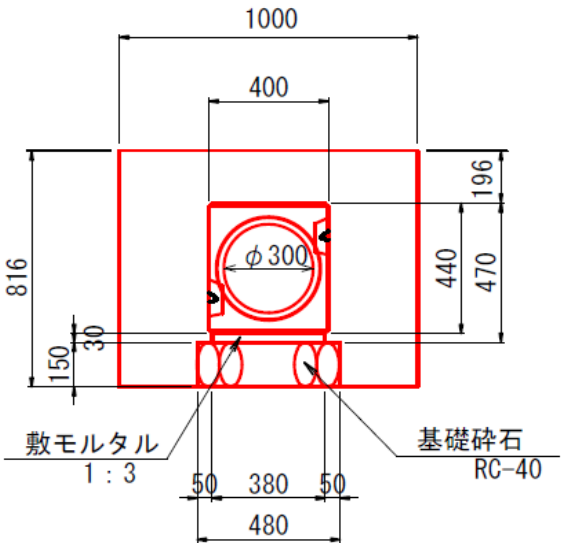

流出、流入状況

測　　点	施工延長	流入高	流出高	平均管底高	地盤高(平均)	平均土被り	平均土被り×延長
ANO. 0+3. 3(横断)	10. 000	143. 793	143. 020	143. 407	143. 68	-0. 097	-0. 970
ANO. 0+4. 1(左)	4. 600	143. 800	143. 380	143. 590	143. 60	-0. 360	-1. 656
ANO. 13+15. 9(横断)	6. 600	142. 590	142. 330	142. 460	143. 16	0. 330	2. 178
ANO. 13+13. 5(縦断)	2. 500	141. 500	141. 490	141. 495	142. 03	0. 165	0. 412
ANO. 13+18. 6(縦断)	6. 700	141. 900	141. 490	141. 695	142. 87	0. 805	5. 394
SNO. 6+14. 1(縦断)	10. 300	141. 490	141. 160	141. 325	141. 95	0. 255	2. 627
延長合計	L=40. 70m	平均土被り＝7. 985/40. 70＝0. 196m				合計	7. 985

※地盤高は、平面地形高からの推定高さ。

名　　称	規　格	算　　式	単位	数量
床　掘	土　砂	1. 00*0. 816*40. 70	m^3	33. 210
埋　戻	D	33. 210-(0. 48*0. 15+0. 40*0. 47)*40. 70	m^3	22. 628
基面整正	土　砂	0. 48*40. 70	m^2	19. 540

重圧管φ200　数量計算書

1式　当り

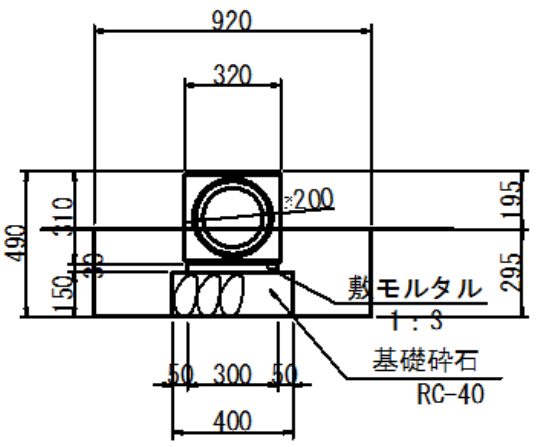

流出、流入状況

測　　点	施工延長	流入高	流出高	平均管底高	地盤高(平均)	平均土被り
ANO.4+17.2(横断)	8.300	145.310	143.670	144.490	144.55	-0.195

※地盤高は、平面地形高からの推定高さ。

名　　称	規　格	算　　式	単位	数量
床　掘	土　砂	0.92*0.295*8.30	m^3	2.250
埋　戻	D	2.253-(0.40*0.15+0.32*0.145)*8.3	m^3	1.370
基面整正	土　砂	0.40*8.30	m^2	3.320

横断溝　数量計算書

1式　当り

U2(GL)-B300-H300

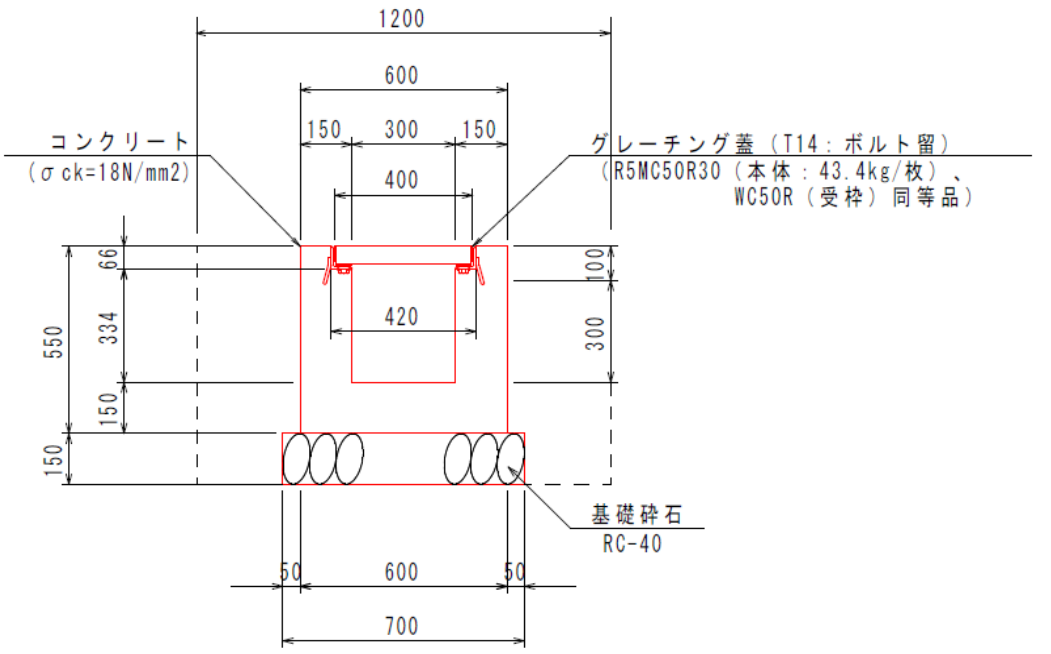

土工延長　L=3.0m

名　　称	規　格	算　　式	単位	数量
床　掘	土　砂	1.20*0.700*3.00	m^3	2.520
埋　戻	D	2.520-(0.700*0.15+0.600*0.700)*3.00	m^3	0.945
基面整正	土　砂	0.70*3.00	m^2	2.100

材 料 計 算 書

NO. 1

工　　種	自由勾配側溝（1/5）	施工延長 L (m)	6.086

標準断面図
土留タイプ

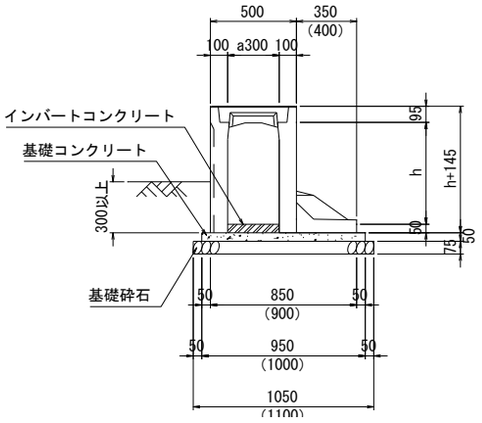

標準断面図
土留（暗渠）タイプ

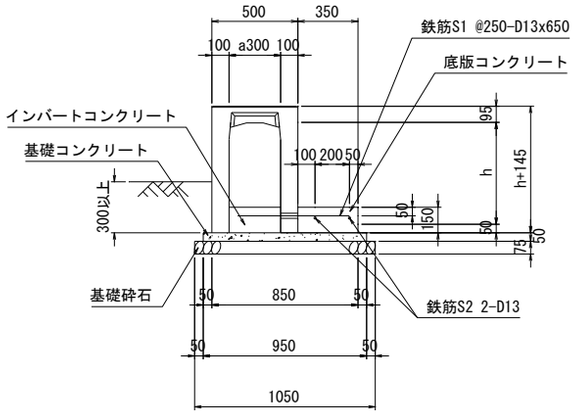

※ 施工の伸び 3 mm

自由勾配側溝・蓋版 数量

規格 a × h		形 状	製品長 L（mm）	数 量（本）	コンクリート蓋		グレーチング蓋	
					L = 500	135° 用	L = 500	L = 1000
300	500	土留用	2000 /	1	1		1	
300	700	土留用	2000 /	1	2			
300	600	暗渠土留	1000 /					
300	600	暗渠土留	1192 / 1277	1				
300	700	暗渠土留	875 / 790	1				
			/					
			/					
			/					
			/					
合　計				4	3	0	1	0

材 料 計 算 書 (2)

NO. 2

基礎材：インバートコンクリート

規格 a × h		インバート平均高さ (h1 + h2) / 2 (m)	側溝の内幅 a / 1000 (m)	延長 L (m)	インバート量 (m3)
300	500	(0.190 + 0.111) / 2	0.300	2.003	0.090
300	600	(0.211 + 0.162) / 2	0.300	1.238	0.069
300	700	(0.262 + 0.224) / 2	0.300	0.836	0.061
300	700	(0.224 + 0.128) / 2	0.300	2.009	0.106
		(+) / 2			0.000
		(+) / 2			0.000
		(+) / 2			0.000
		(+) / 2			0.000
		(+) / 2			0.000
		(+) / 2			0.000
		(+) / 2			0.000
		(+) / 2			0.000
		(+) / 2			0.000
		(+) / 2			0.000
		(+) / 2			0.000
合 計				6.086	0.327

基礎材：基礎砕石

B = 1.050 × L = 4.077 ・・・ 4.281
B = 1.100 × L = 2.009 ・・・ 2.210

合 計	6.491

基礎材：基礎コンクリート

B = 0.950 × t = 0.050 × L = 4.077 ・・・ 0.194
B = 1.000 × t = 0.050 × L = 2.009 ・・・ 0.100

合 計	0.294

基礎材：基礎コンクリート型枠

t = 0.050 × L = 6.086 × 2 ・・・ 0.609
t = × L = × 2 ・・・ 0.000

合 計	0.609

材 料 計 算 書 (3)

NO. 3

底版材：コンクリート

B =	0.350	× t =	0.150	× L =	2.074			・・・	0.109
B =		× t =		× L =				・・・	0.000

合 計	0.109

底版材：コンクリート型枠

t =	0.150	× L =	2.074					・・・	0.311
t =		× L =						・・・	0.000

合 計	0.311

底版材：鉄筋S1

L =	2.074	/ @ =	0.250	×	=	0.650	×	0.995		・・・	5.365
L =		/ @ =		×	=		×			・・・	

合 計	5.365

底版材：鉄筋S2

N =	2	× L =	2.074	×	0.995			・・・	4.127
N =		× L =		×				・・・	0.000

合 計	4.127

材 料 計 算 書

NO. 1

工　　種	自由勾配側溝 (2/5)	施工延長 L (m)	71.611

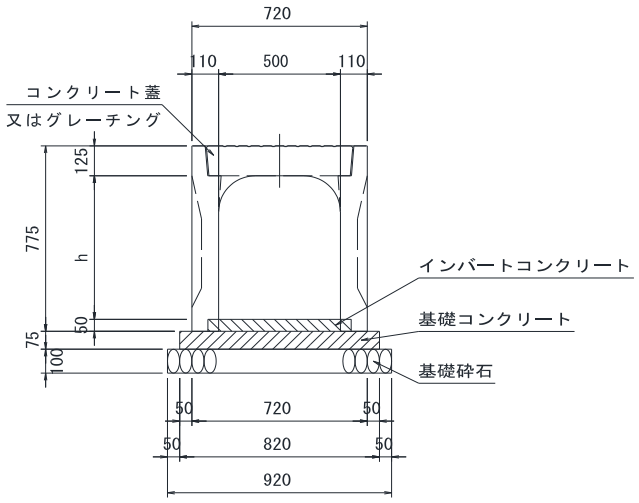

※ 施工の伸び 3 ㎜

自由勾配側溝・蓋版 数量

規格 a × h		形 状	製品長 L (㎜)	数 量 (本)	コンクリート蓋		グレーチング蓋	
					L = 500	135° 用	L = 500	L = 1000
500	600	標準型	2000 /	25	39		11	
500	700	標準型	2000 /	6	10		2	
500	600	標準型	1000 /	2	2			
500	600	暗渠型	1237 / 1373	1				
500	600	暗渠型	629 / 472	1				
500	600	暗渠型	826 / 1400	1				
500	600	暗渠型	787 / 970	1				
500	600	暗渠型	816 / 670	1				
500	600	暗渠型	822 / 676	1				
500	600	暗渠型	1188 /	1				
500	600	暗渠型	905 /	1				
合　計				41	51	0	13	0

材 料 計 算 書 (2)

NO. 2

基礎材：インバートコンクリート

規格 a × h		インバート平均高さ (h1 + h2) / 2 (m)	側溝の内幅 a / 1000 (m)	延長 L (m)	インバート量 (m3)
500	600	(0.155 + 0.074) / 2	0.500	1.991	0.114
500	600	(0.074 + 0.074) / 2	0.500	4.498	0.166
500	600	(0.074 + 0.078) / 2	0.500	4.003	0.152
500	600	(0.790 + 0.081) / 2	0.500	1.208	0.263
500	600	(0.082 + 0.094) / 2	0.500	8.227	0.362
500	600	(0.094 + 0.139) / 2	0.500	20.006	1.165
500	600	(0.139 + 0.084) / 2	0.500	5.754	0.321
500	700	(0.176 + 0.108) / 2	0.500	7.585	0.539
500	700	(0.108 + 0.178) / 2	0.500	4.459	0.319
500	600	(0.078 + 0.150) / 2	0.500	13.880	0.791
		(+) / 2			0.000
		(+) / 2			0.000
		(+) / 2			0.000
		(+) / 2			0.000
		(+) / 2			0.000
		(+) / 2			0.000
合 計				71.611	4.192

基礎材：基礎砕石

B = 0.920 × L = 71.611 ・・・ 65.882
B = × L = ・・・ 0.000

合 計	65.882

基礎材：基礎コンクリート

B = 0.820 × t = 0.075 × L = 71.611 ・・・ 4.404
B = × t = × L = ・・・ 0.000

合 計	4.404

基礎材：基礎コンクリート型枠

t = 0.075 × L = 71.611 × 2 ・・・ 10.742
t = × L = × 2 ・・・ 0.000

合 計	10.742

材 料 計 算 書

NO. 1

工　　種	自由勾配側溝（3/5）	施工延長 L (m)	39.861

標準断面図

標準・暗渠タイプ

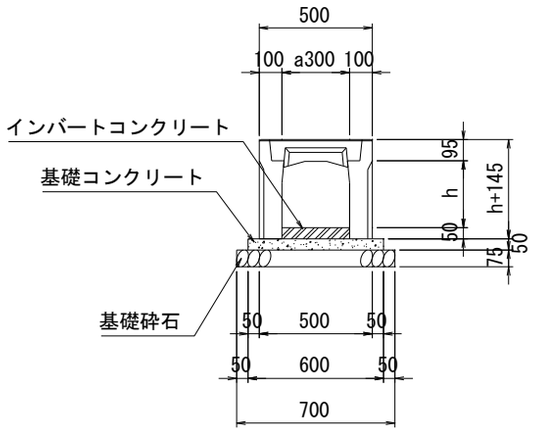

※ 施工の伸び 3 mm

自由勾配側溝・蓋版 数量

規格 a × h		形 状	製品長 L（mm）	数 量（本）	コンクリート蓋		グレーチング蓋	
					L = 500	135° 用	L = 500	L = 1000
300	300	標準型	2000 /	18	29		7	
300	300	標準型	1000 /	1	1			
300	300	暗渠型	978 / 1023	1				
300	300	暗渠型	989 / 1012	1				
300	300	暗渠型	783 / 760	1				
合　計				22	30	0	7	0

材 料 計 算 書 (2)

NO. 2

基礎材：インバートコンクリート

規格 a × h		インバート平均高さ (h1 + h2) / 2 (m)	側溝の内幅 a / 1000 (m)	延長 L (m)	インバート量 (m3)
300	300	(0.050 + 0.050) / 2	0.300	39.861	0.598
		(+) / 2			0.000
		(+) / 2			0.000
		(+) / 2			0.000
		(+) / 2			0.000
		(+) / 2			0.000
		(+) / 2			0.000
		(+) / 2			0.000
		(+) / 2			0.000
		(+) / 2			0.000
		(+) / 2			0.000
		(+) / 2			0.000
		(+) / 2			0.000
		(+) / 2			0.000
		(+) / 2			0.000
合 計				39.861	0.598

基礎材：基礎砕石

B = 0.700 × L = 39.861 ・・・ 27.903
B = × L = ・・・ 0.000

合 計	27.903

基礎材：基礎コンクリート

B = 0.600 × t = 0.050 × L = 39.861 ・・・ 1.196
B = × t = × L = ・・・ 0.000

合 計	1.196

基礎材：基礎コンクリート型枠

t = 0.050 × L = 39.861 × 2 ・・・ 3.986
t = × L = × 2 ・・・ 0.000

合 計	3.986

排水工 延長調書

PU3-B300-H300

左側								右側							
測点	延長					合計	摘要	測点	延長					合計	摘要
ABPBC.1 ～ ANO.0 + 7.4	3.6					3.6		ANO.8 + 2.7 ～ ANO.9 + 0.6	17.3					17.3	
ANO.0 + 7.7 ～ ANO.4 + 18.0	92.0					92.0		ANO.11 + 3.8 ～ ANO.11 + 17.4	12.3					12.3	
ANO.4 + 18.8 ～ ANO.13 + 15.9	179.9					179.9		BNO.0 + 13.5 ～ BNO.1 + 0.2							
ANO.13 + 16.7 ～ ANO.20 + 3.1						3.3		BNO.1 + 1.0 ～ BNO.2 + 10.3							
BBP ～ BNO.1 + 9.7															
BNO.1 + 14.3 ～ BNO.3 + 12.2															
計	275.5					278.8 m		計	29.6					29.6 m	
						合計			305.1					308.4 m	

排水工 延長調書

PU1-B300-H300

左側								右側							
測点	延長					合計	摘要	測点	延長					合計	摘要
								ANO.9 + 1.4 ～ ANO.9 + 17.9	16.5					16.5	
								ANO.9 + 19.9 ～ ANO.11 + 3.8	23.7					23.7	
								ANO.11 + 18.3 ～ ANO.12	2.4					2.4	
								ANO.12 + 0.3 ～ ANO.12 + 12.2	10.2					10.2	
								ANO.12 + 18.8 ～ ANO.13 + 11.9	15.7					15.7	
計						m		計	68.5					68.5 m	
						合計			68.5					68.5 m	

排水工 延長調書

横断用水路　U2(GL)-300-300

左側								右側							
測点	延長					合計	摘要	測点	延長					合計	摘要
SNO.3 + 13.1 ～	3.0					3.0									
計	3.0					3.0 m		計						m	
						合計			3.0					3.0 m	

排水工 延長調書

１号L型水路

左側								右側							
測点	延長					合計	摘要	測点	延長					合計	摘要
								ASP.1 + ～ AEC.1	0.7					0.7	
								ANO.14 + 2.5 ～ ANO.15 + 12.4							
計						m		計	0.7					0.7 m	
						合計			0.7					0.7 m	

排水工 延長調書

2号L型水路

左側								右側							
測点	延長					合計	摘要	測点	延長					合計	摘要
								ANO.3 + 15.6 ～ ANO.4 + 14.4	6.1					6.1	
								ANO.4 + 15.1 ～ ANO.7 + 17.7	70.5					70.5	
計					m			計	76.6					76.6 m	
合計									76.6					76.6 m	

排水工 延長調書

取水水路

左側								右側							
測点	延長					合計	摘要	測点	延長					合計	摘要
SNO.0 + 9.1	1.0					1.0									
SNO.0 + 11.3	1.0					1.0									
SNO.2 + 6.3	1.0					1.0									
計	3.0					3.0 m		計						m	
						合計			3.0					3.0 m	

排水工 延長調書

重圧管φ200

左側								右側							
測点	延長					合計	摘要	測点	延長					合計	摘要
ANO.5付近	8.3					8.3	(横断)								
計	8.3					8.3 m		計						m	
						合計			8.3					8.3 m	

排水工 延長調書

重圧管φ300

左側								右側							
測点	延長					合計	摘要	測点	延長					合計	摘要
ABPBC.1 付近	10.0					10.0		ANO.3+14.0付近							
ABPBC.1付近	4.6					4.6		ANO.4+5.3付近							
ANO.13+15.9付近	6.6					6.6		ANO.13+13.5付近	2.5					2.5	
ANO.19+17.6付近								ANO.13+18.6付近	6.7					6.7	
SNO.5 + 14.6 ～ SNO.6 + 4.6	10.3					10.3		ANO.14+2.1付近							
計	31.5					31.5 m		計	9.2					9.2 m	
						合計			40.7					40.7 m	

排水工 延長調書

P1-RC1-D300

左側								右側							
測点	延長					合計	摘要	測点	延長					合計	摘要
								ANO.9 + 17.9 ～ ANO.10	2.0					2.0	
								ANO.12 + 12.9 ～ ANO.12 + 18.1	6.5					6.5	
計						m		計	8.5					8.5 m	
						合計			8.5					8.5 m	

排水工 延長調書

塩ビ管φ150

左側								右側							
測点	延長					合計	摘要	測点	延長					合計	摘要
SNO.0 + 9.1	1.3					1.3		ANO.0 + 7.4 ～ ANO.0 + 8.0							
SNO.0 + 11.3	1.7					1.7		ABC.5 付近	3.2					3.2	
SNO.2 + 6.3	3.1					3.1		BNO.0 + 13.3 ～ BNO.0 + 18.2							
								BNO.1 + 0.7 ～ BNO.1 + 6.9							
								BNO.1 + 5.6 付近							
								BNO.1 + 18.3							
計	6.1					6.1 m		計	3.2					3.2 m	
						合計			9.3					9.3 m	

排水工 延長調書

塩ビ管φ200

左側								右側							
測点	延長					合計	摘要	測点	延長					合計	摘要
ANO.4 + 18.9 ～ ANO.5 + 18.5	10.3					10.3									
計	10.3					10.3 m		計						m	
						合計			10.3					10.3 m	

排水工 箇所調書

1号集水桝

左側								右側							
測点	箇所					合計	摘要	測点	箇所					合計	摘要
ANO.0 + 12.6 付近	1.0					1.0		ANO.11 + 17.9 付近	1.0					1.0	
ANO.13 + 16.3 付近	1.0					1.0		BNO.0 + 12.9 付近							
ANO.20 + 3.3 付近								BNO.1 + 0.6 付近							
BNO.1 + 10.1 付近															
BNO.1 + 14.0 付近															
SNO.5 + 13.7 付近	1.0					1.0									
計	3.0					3.0 箇		計	1.0					1.0 箇	
						合計			4.0					4.0 箇	

排水工 箇所調書

2号集水桝

左側								右側							
測点	箇所					合計	摘要	測点	箇所					合計	摘要
ABPBC.1 付近	1.0					1.0									
計	1.0					1.0 箇		計						箇	
						合計			1.0					1.0 箇	

排水工 箇所調書

3号集水桝(1)

左側								右側							
測点	箇所					合計	摘要	測点	箇所					合計	摘要
								ANO.4 + 14.8 付近	1.0					1.0	
計					箇			計	1.0					1.0 箇所	
					合計				1.0					1.0 箇所	

排水工 箇所調書

4号集水桝(1)

左側								右側							
測点	箇所					合計	摘要	測点	箇所					合計	摘要
						0.0		ASP.1 + 2.0 付近	1.0					1.0	
計						箇		計	1.0					1.0 箇所	
						合計			1.0					1.0 箇所	

排水工 箇所調書

4号集水桝(2)

左側								右側							
測点	箇所					合計	摘要	測点	箇所					合計	摘要
ANO.4 + 18.4 付近	1.0					1.0									
計	1.0					1.0 箇		計						箇所	
						合計			1.0					1.0 箇所	

排水工 箇所調書

5号集水桝

左側								右側							
測点	箇所					合計	摘要	測点	箇所					合計	摘要
ANO.5 + 8.8 付近	1.0					1.0									
計	1.0					1.0 箇		計						箇所	
						合計			1.0					1.0 箇所	

排水工 箇所調書

7号集水桝(H500)

左側								右側							
測点	箇所					合計	摘要	測点	箇所					合計	摘要
								ANO.11 + 19.8 付近	1.0					1.0	
								ANO.12 + 12.5 付近	1.0					1.0	
								ANO.12 + 18.6 付近	1.0					1.0	
								ANO.13 + 12.3 付近	1.0					1.0	
計						箇		計	4.0					4.0 箇所	
						合計			4.0					4.0 箇所	

排水工 箇所調書

7号集水桝(H600)

左側								右側							
測点	箇所					合計	摘要	測点	箇所					合計	摘要
								ANO.7 + 17.7 付近	1.0					1.0	
								BNO.0 + 7.4 付近							
計						箇		計	1.0					1.0 箇所	
						合計			1.0					1.0 箇所	

排水工 箇所調書

8号集水桝

左側								右側							
測点	箇所					合計	摘要	測点	箇所					合計	摘要
								ANO.9 + 0.9 付近	1.0					1.0	
計						箇		計	1.0					1.0 箇所	
						合計			1.0					1.0 箇所	

排水工 箇所調書

9号集水桝

左側								右側							
測点	箇所					合計	摘要	測点	箇所					合計	摘要
								ANO.13 + 15.2 付近	1.0					1.0	
								ANO.14 + 2.1 付近						0.0	
計						箇		計	1.0					1.0 箇所	
						合計			1.0					1.0 箇所	

排水工 箇所調書

13号集水桝

左側								右側							
測点	箇所					合計	摘要	測点	箇所					合計	摘要
SNO.3 + 13.1 付近	1.0					1.0		BNO.5 + 16.5 付近							
計	1.0					1.0 箇		計						箇所	
						合計			1.0					1.0 箇所	

排水工 箇所調書

AS桝

左側								右側							
測点	箇所					合計	摘要	測点	箇所					合計	摘要
ANO.0 + 2.5 付近	1.0					1.0									
計	1.0					1.0 箇		計						箇所	
						合計			1.0					1.0 箇所	

排水工 延長調書

コンクリート蓋

左側								右側							
測点	枚数					合計	摘要	測点	枚数					合計	摘要
ANO.4 + 14.5 ～ ANO.4 + 18.0	7.0					7.0		ANO.11 + 4.7 ～ ANO.11 + 8.0	6.0					6.0	
ANO.5 + 8.1 ～ ANO.5 + 10.7	6.0					6.0		BNO.0 + 9.9 ～ BNO.0 + 12.5							
ANO.5 + 13.0 ～ ANO.5 + 15.5	6.0					6.0		BNO.0 + 18.2 ～ BNO.1 + 0.2							
ANO.6 + 1.6 ～ ANO.6 + 4.6	6.0					6.0		BNO.1 + 6.8 ～ BNO.1 + 8.9							
ANO.7 + 17.0 ～ ANO.8 + 3.0	12.0					12.0		BNO.1 + 19.0 ～ BNO.2 + 1.0							
ANO.8 + 15.7 ～ ANO.8 + 17.7	4.0					4.0		BNO.2 + 16.6 ～ BNO.2 + 18.8							
ANO.10 + 14.9 ～ ANO.11 + 0.9	12.0					12.0		BNO.3 + 9.8 ～ BNO.3 + 11.6							
ANO.11 + 9.5 ～ ANO.11 + 13.1	8.0					8.0		BNO.3 + 17.7 ～ BNO.4 + 0.3							
ANO.12 + 3.4 ～ ANO.12 8.8	12.0					12.0		BNO.4 + 17.5 ～ BNO.5 + 0.5							
ANO.14 + 18.1 ～ ANO.15 + 3.1								BNO.6 + 0.0 ～ BNO.6 + 3.0							
ABC.9 ～ ANO.16 + 6.1								BNO.6 + 3.3 ～ BNO.6 + 6.3							
ANO.19 + 13.7 ～ ANO.19 + 18.1															
計	73.0					73.0 枚		計	6.0					6.0 枚	
						合計			79.0					79.0 枚	

排水工 延長調書

管接続工

左側								右側							
測点	枚数					合計	摘要	測点	枚数					合計	摘要
ABPBC.1付近	1.0					1.0									
計	1.0					1.0 箇所		計						箇所	
						合計			1.0					1.0 箇所	

防護柵工

防護柵工数量集計表

種別・工種	細　　別	規　　格	単位	数　　量		備　　考
				実数値	積算値	
防護柵工						
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-C-2B	m	74.9	75	
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Ｇｒ-C-4E	m	67.3	67	

防護柵工 延長調書

Gr-C-2B

Gr-C-2B								Gr-C-2B							
測　　点	延　長						摘　要	測　　点	延　長						摘　要
						合　計								合　計	
								ANO.0 + 7.6 ～ ANO.3 + 6.2	57.9					57.9	
								ANO.3 + 10.7 ～ ANO.4 + 8.3	17.0					17.0	
								ANO.14 付近 ～ ANO.15 + 14.6							
計						m		計	74.9					74.9 m	
						合　　計			74.9					74.9 m	

防護柵工 延長調書

Gr-C-4E

Gr-C-4E								Gr-C-4E							
測　　点	延　長					合　計	摘　要	測　　点	延　長					合　計	摘　要
								ANO.4 + 8.3 ～ ANO.7 + 18.3	67.3					67.3	
計						m		計	67.3					67.3 m	
						合　　計			67.3					67.3 m	

舗　装　工

舗装工数量集計表

種別・工種	規　　格	細　　別	単位	数　　量		備　　考
				実数値	積算値	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工						
車　道　部	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装					
表　　層	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ	13　t= 4cm	m2	1753.0	1753	
路　　盤	再生粒度調整砕石	RM-30 t=12cm	m2	1698.4	1698	
路床安定処理	セメント改良	t=65cm	m2	1143.4	1143	既設拡幅部
坂　　路	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装					
表　　層	ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2	t=10cm	m2	87.7	88	
路盤紙			m2	87.7	88	
路　　盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-30 t=10cm	m2	87.7	88	
アスカーブ			m	67.7	68	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ						
	ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2	t=7cm	m2	82.8	83	

舗装工数量計算書

車道アスファルト舗装

測点名称	区間距離	表層 3.0≧W			路盤 3.0≧W			路床安定処理			備　考
		幅	平　均	立積	幅	平　均	面積	幅	平　均	面積	
A路線											
起点ﾌﾟﾗﾆ				111.9			111.9			111.9	舗装根拠図より
NO.5～8+15付近	左側			101.3			101.3			-	舗装根拠図より
NO.10+15～12+9付近	左側			78.4			78.4			-	舗装根拠図より
～ABC.2は起点ﾌﾟﾗﾆによる										-	
ABC.2	0.0	5.00	-	-	3.77	-	-	4.53	-	-	
ASP.2	20.3	5.00	5.00	101.5	2.92	3.35	68.0	4.41	4.47	90.7	
AEC.2	20.3	5.00	5.00	101.5	5.00	3.96	80.4	3.83	4.12	83.6	
ABC.3	7.5	5.00	5.00	37.5	5.00	5.00	37.5	4.06	3.95	29.6	
ASP.3	8.8	5.00	5.00	44.0	5.00	5.00	44.0	5.00	4.53	39.9	
AEC.3	8.8	5.00	5.00	44.0	5.00	5.00	44.0	3.87	4.44	39.1	
ANO.5	18.0	5.30	5.15	92.7	5.30	5.15	92.7	1.75	2.81	50.6	
ABC.4	7.9	5.30	5.30	41.9	5.30	5.30	41.9	0.55	1.15	9.1	
ASP.4	5.7	5.30	5.30	30.2	5.30	5.30	30.2	0.93	0.74	4.2	
AEC.4	5.7	5.30	5.30	30.2	5.30	5.30	30.2	1.92	1.43	8.2	
ANO.7	20.6	5.30	5.30	109.2	5.30	5.30	109.2	1.49	1.71	35.2	
ABC.5	18.8	5.00	5.15	96.8	5.00	5.15	96.8	5.00	3.25	61.1	
ASP.5	10.7	5.00	5.00	53.5	5.00	5.00	53.5	5.00	5.00	53.5	
AEC.5	10.7	5.00	5.00	53.5	5.00	5.00	53.5	5.00	5.00	53.5	
ANO.10	19.8	5.00	5.00	99.0	5.00	5.00	99.0	5.00	5.00	99.0	
ABC.6	22.0	5.00	5.00	110.0	5.00	5.00	110.0	5.00	5.00	110.0	
ASP.6	14.9	5.00	5.00	74.5	5.00	5.00	74.5	5.00	5.00	74.5	
AECBC.7	14.9	5.00	5.00	74.5	5.00	5.00	74.5	5.00	5.00	74.5	
ASP.7	11.3	5.00	5.00	56.5	5.00	5.00	56.5	2.43	3.72	42.0	
AEC.7	11.3	5.00	5.00	56.5	5.00	5.00	56.5	5.00	3.72	42.0	
ANO.13 + 17.000	2.7	5.00	5.00	13.5	5.00	5.00	13.5	5.00	5.00	13.5	
	5.5	5.00	5.00	27.5	5.00	5.00	27.5	1.42	3.21	17.7	
AEC.8											
ABC.9											
ASP.9											
AEC.9											
ANO.19											
ABC.10											
小　計	266.2	m		1640.1	m^2		1585.5	m^2		1143.4	m^2

アスファルト舗装

測点名称	区間距離	表層 1.4>W			路盤 1.4>W			路床安定処理			備　考
		幅	平　均	立積	幅	平　均	面積	幅	平　均	面積	
B路線											
BEC.1											
BNO.1											
BBC.2											
BSP.2											
BNO.1 + 14.000											
BBC.3											
BSP.3											
BEC.3											
BNO.3											
BNO.3 + 8.000											
BNO.3 + 16.000											
BNO.5											
BNO.6											
交差点ﾌﾟﾗﾆ(BNO.1)											
終点ﾌﾟﾗﾆ											
計	0.0										
S路線											
起点部プラニメータ				3.6			3.6				MH部側溝設置参考平面図より
起点部プラニメータ				5.9			5.9				
	0.0	0.30	－	－	0.30	－	－				
SNO.1	16.1	0.30	0.30	4.8	0.30	0.30	4.8				
SNO.2	20.0	0.30	0.30	6.0	0.30	0.30	6.0				
SNO.3	20.0	0.30	0.30	6.0	0.30	0.30	6.0				
SNO.3 + 13.140	13.1	0.50	0.40	5.2	0.50	0.40	5.2				
SNO.4	6.9	0.87	0.69	4.8	0.87	0.69	4.8				
SNO.5	20.0	0.77	0.82	16.4	0.77	0.82	16.4				
	14.1	0.77	0.77	10.9	0.77	0.77	10.9				
交差点ﾌﾟﾗﾆ(SNO.6)				49.3			49.3				
計	110.2			112.9			112.9				
小　計	110.2	m		112.9	m^2		112.9	m^2			m^2
合　計	376.4	m		1753.0	m^2		1698.4	m^2		1143.4	m^2

舗装工数量計算書

コンクリート舗装

測点名称	区間距離	表層 3.0≦W			路盤 3.0≦W						備　考
		幅	平　均	面積	幅	平　均	面積	幅	平　均	面積	
ANO.3+6.2～ANO.4+3.0	（右側）										
ANO.7+18.3～ANO.8+3.0	（右側）			59.9			59.9				舗装根拠図より
ANO.9+18.4～ANO.9+19.5	（右側）			2.0			2.0				舗装根拠図より
ANO.11+2.7～ANO.11+3.8	（右側）			0.2			0.2				舗装根拠図より
ANO.12+13.5～ANO.12+15.2	（右側）			1.9			1.9				舗装根拠図より
ANO.12+15.2～ANO.12+18.0	（右側）			18.9			18.9				舗装根拠図より
SNO.6～SNO.6+2.5	（左側）			4.8			4.8				舗装根拠図より
BSP.1～BNO.0+12.5	（右側）										
BNO.0+18.2～BNO.1+0.2	（右側）										
BNO.1+6.8～BNO.1+8.9	（右側）										
BNO.1+19.0～BNO.2+1.1	（右側）										
BNO.1+16.5～BNO.1+18.8	（右側）										
BNO.3+9.8～BNO.3+11.6	（右側）										
BNO.3+9.8～BNO.3+11.6	（右側）										
BNO.4+15.0～BNO.5+0.5	（右側）										
BNO.4+17.5～BNO.5+0.5	（右側）										
BNO.6+1.0～BNO.6+3.0	（右側）										
BNO.6+3.3～BNO.6+6.4	（右側）										
BNO.6+4.8～BNO.6+7.4	（左側）										
合　計	0.0	m		87.7	m^2		87.7	m^2			

付属施設工 延長調書

アスカーブ

左側								右側							
測　　点	延　長					合　計	摘　要	測　　点	延　長					合　計	摘　要
								ANO.4 ＋ 8.3 ～ ANO.7 ＋ 17.9	67.7					67.7	
計					m2			計	67.7					67.7 m2	
					合　　計				67.7					67.7 m2	

舗装工数量計算書

コンクリート張(t=7cm)

測点名称	区間距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ張									備　考
		幅	平　均	面積	幅	平　均	面積	幅	平　均	面積	
	0.0	0.50									
AEC.1	8.3	0.50	0.50	4.2							
ABC.2	3.6	0.50	0.50	1.8							
ASP.2	20.7	0.50	0.50	10.4							
AEC.2	20.7	0.50	0.50	10.4							
ABC.3	7.5	0.50	0.50	3.8							
ASP.3	9.3	0.50	0.50	4.7							
AEC.3	9.3	0.50	0.50	4.7							
	11.5	0.50	0.50	5.8							
計	90.9			45.8							
ANO.8+15～ANO.10+15付近				17.9							舗装根拠図より
ANO.12+9.0～ANO.14+17付近				19.1							舗装根拠図より
ANO.17+18～ANO.19+8.5付近											
合　計	181.8	m		82.8	m^2						

舗装数量根拠図(1)

S=1:500

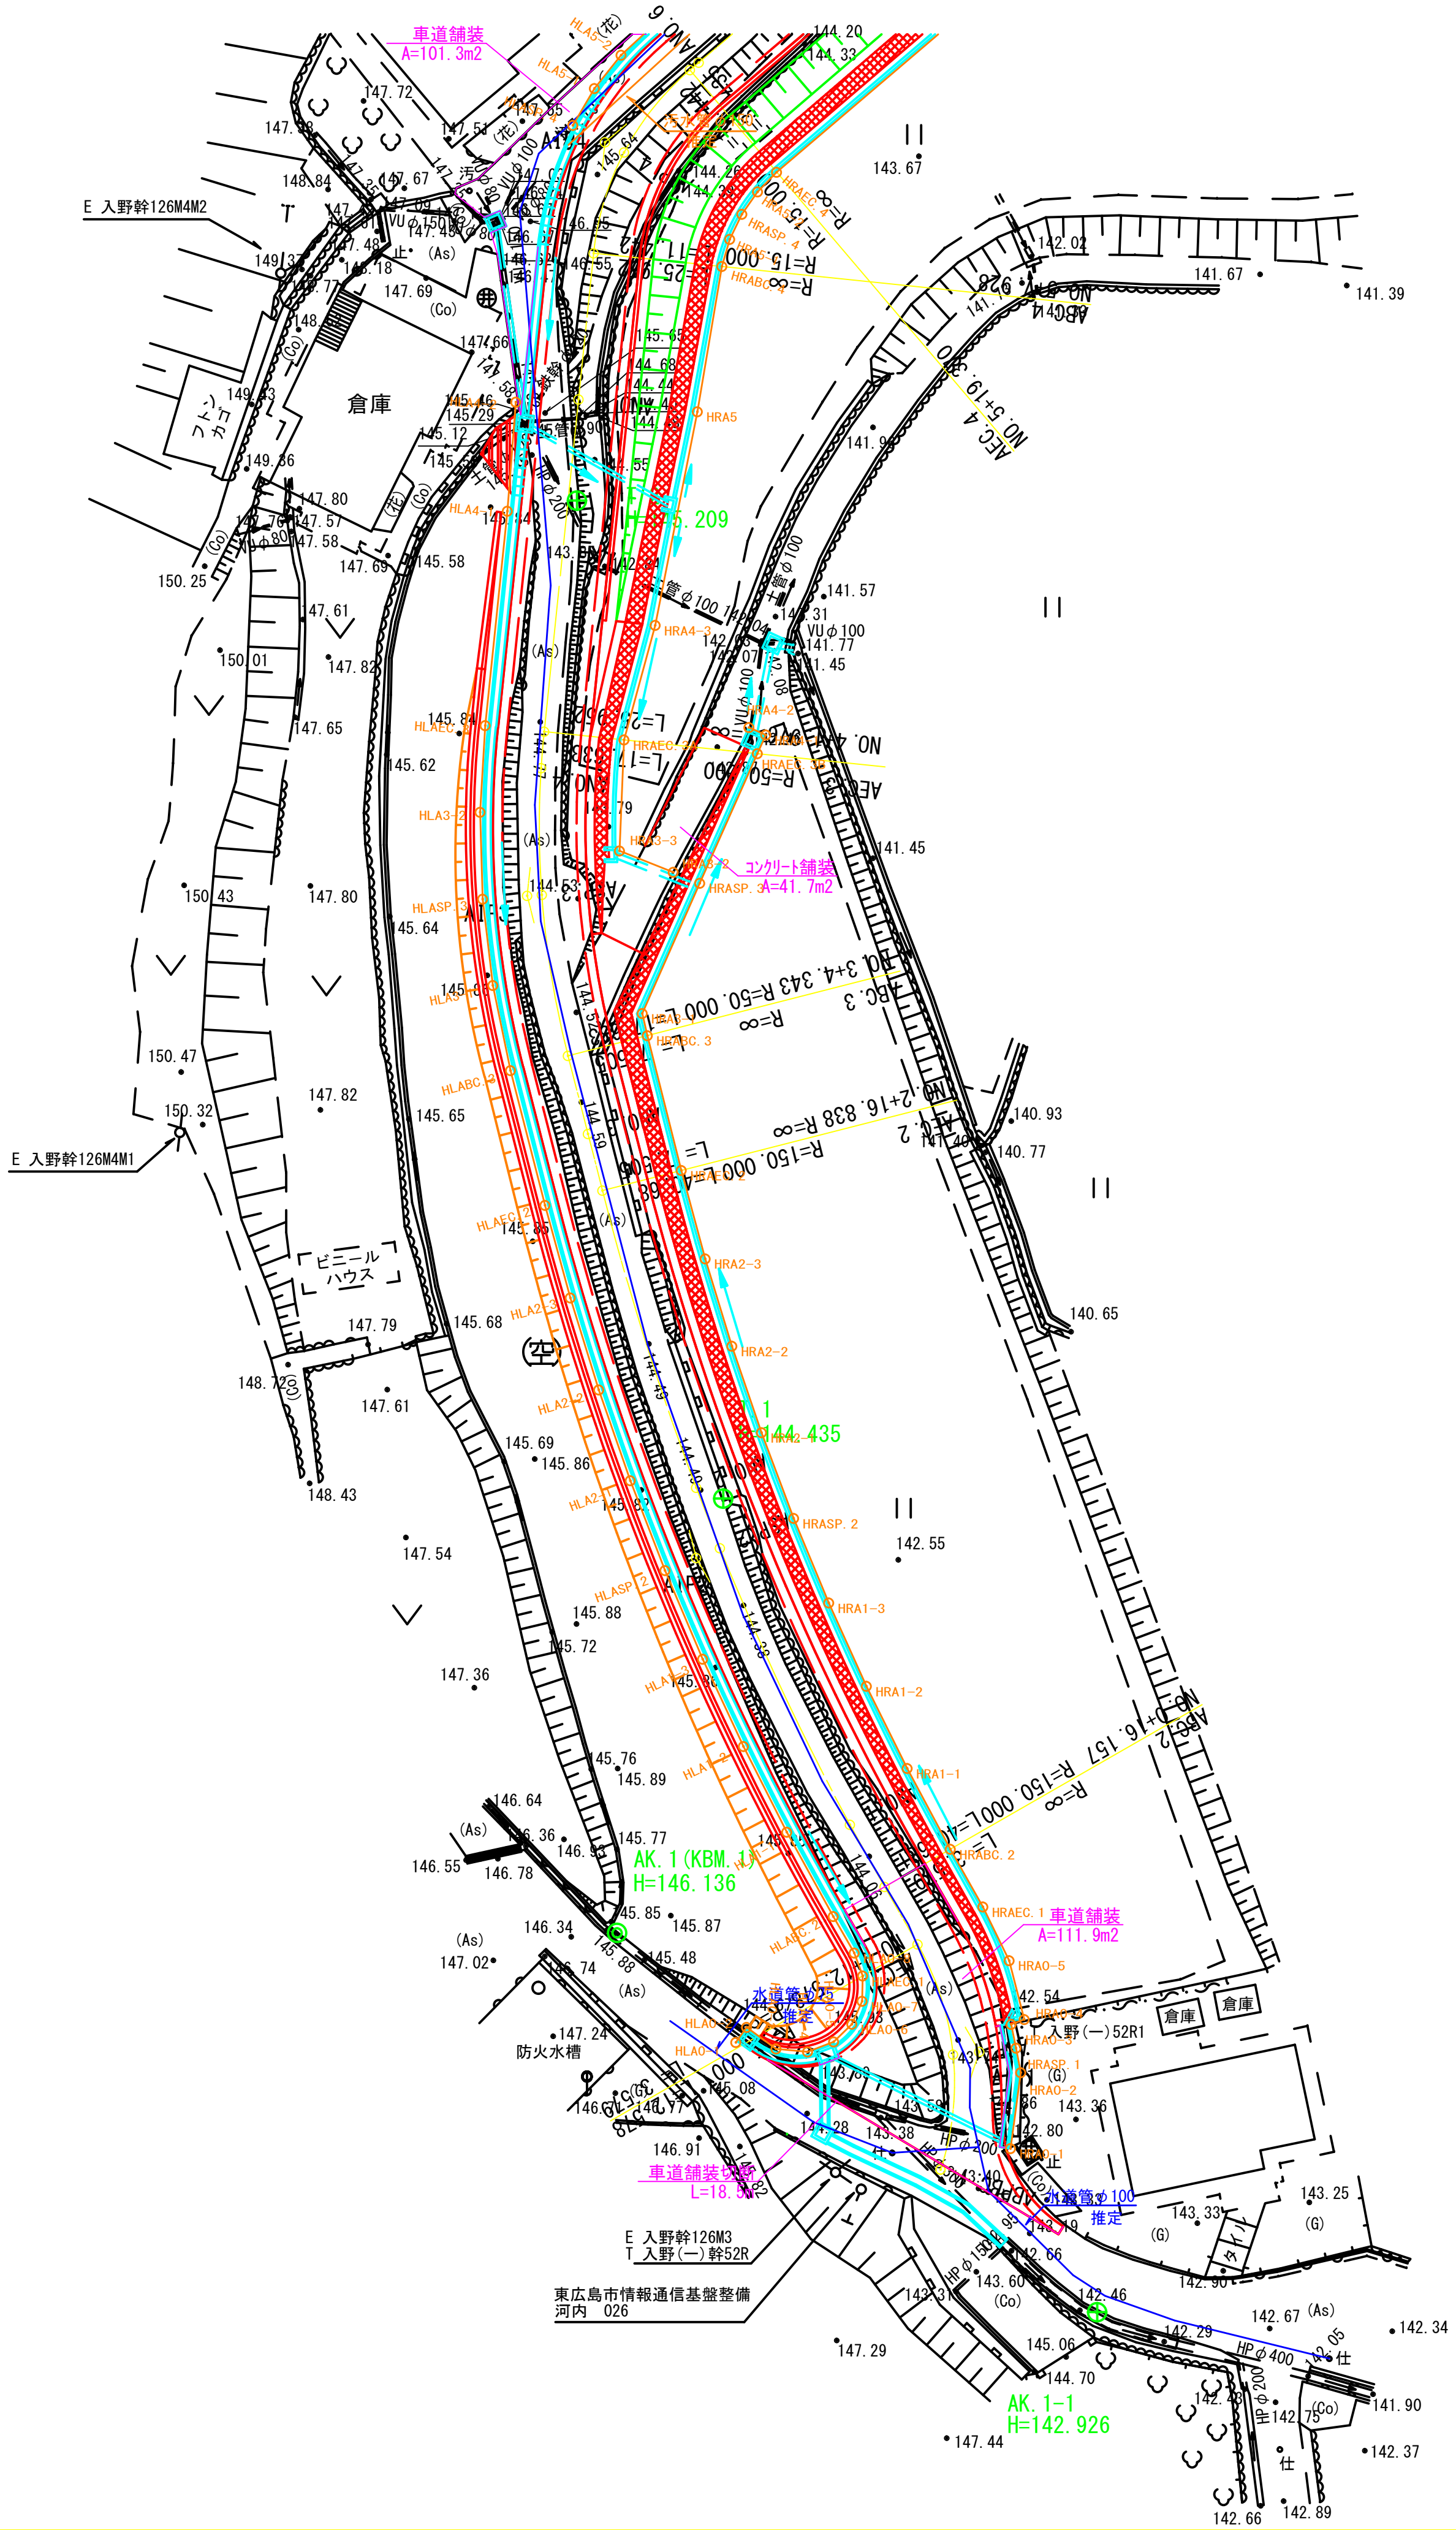

舗装数量根拠図(2)

S=1:500

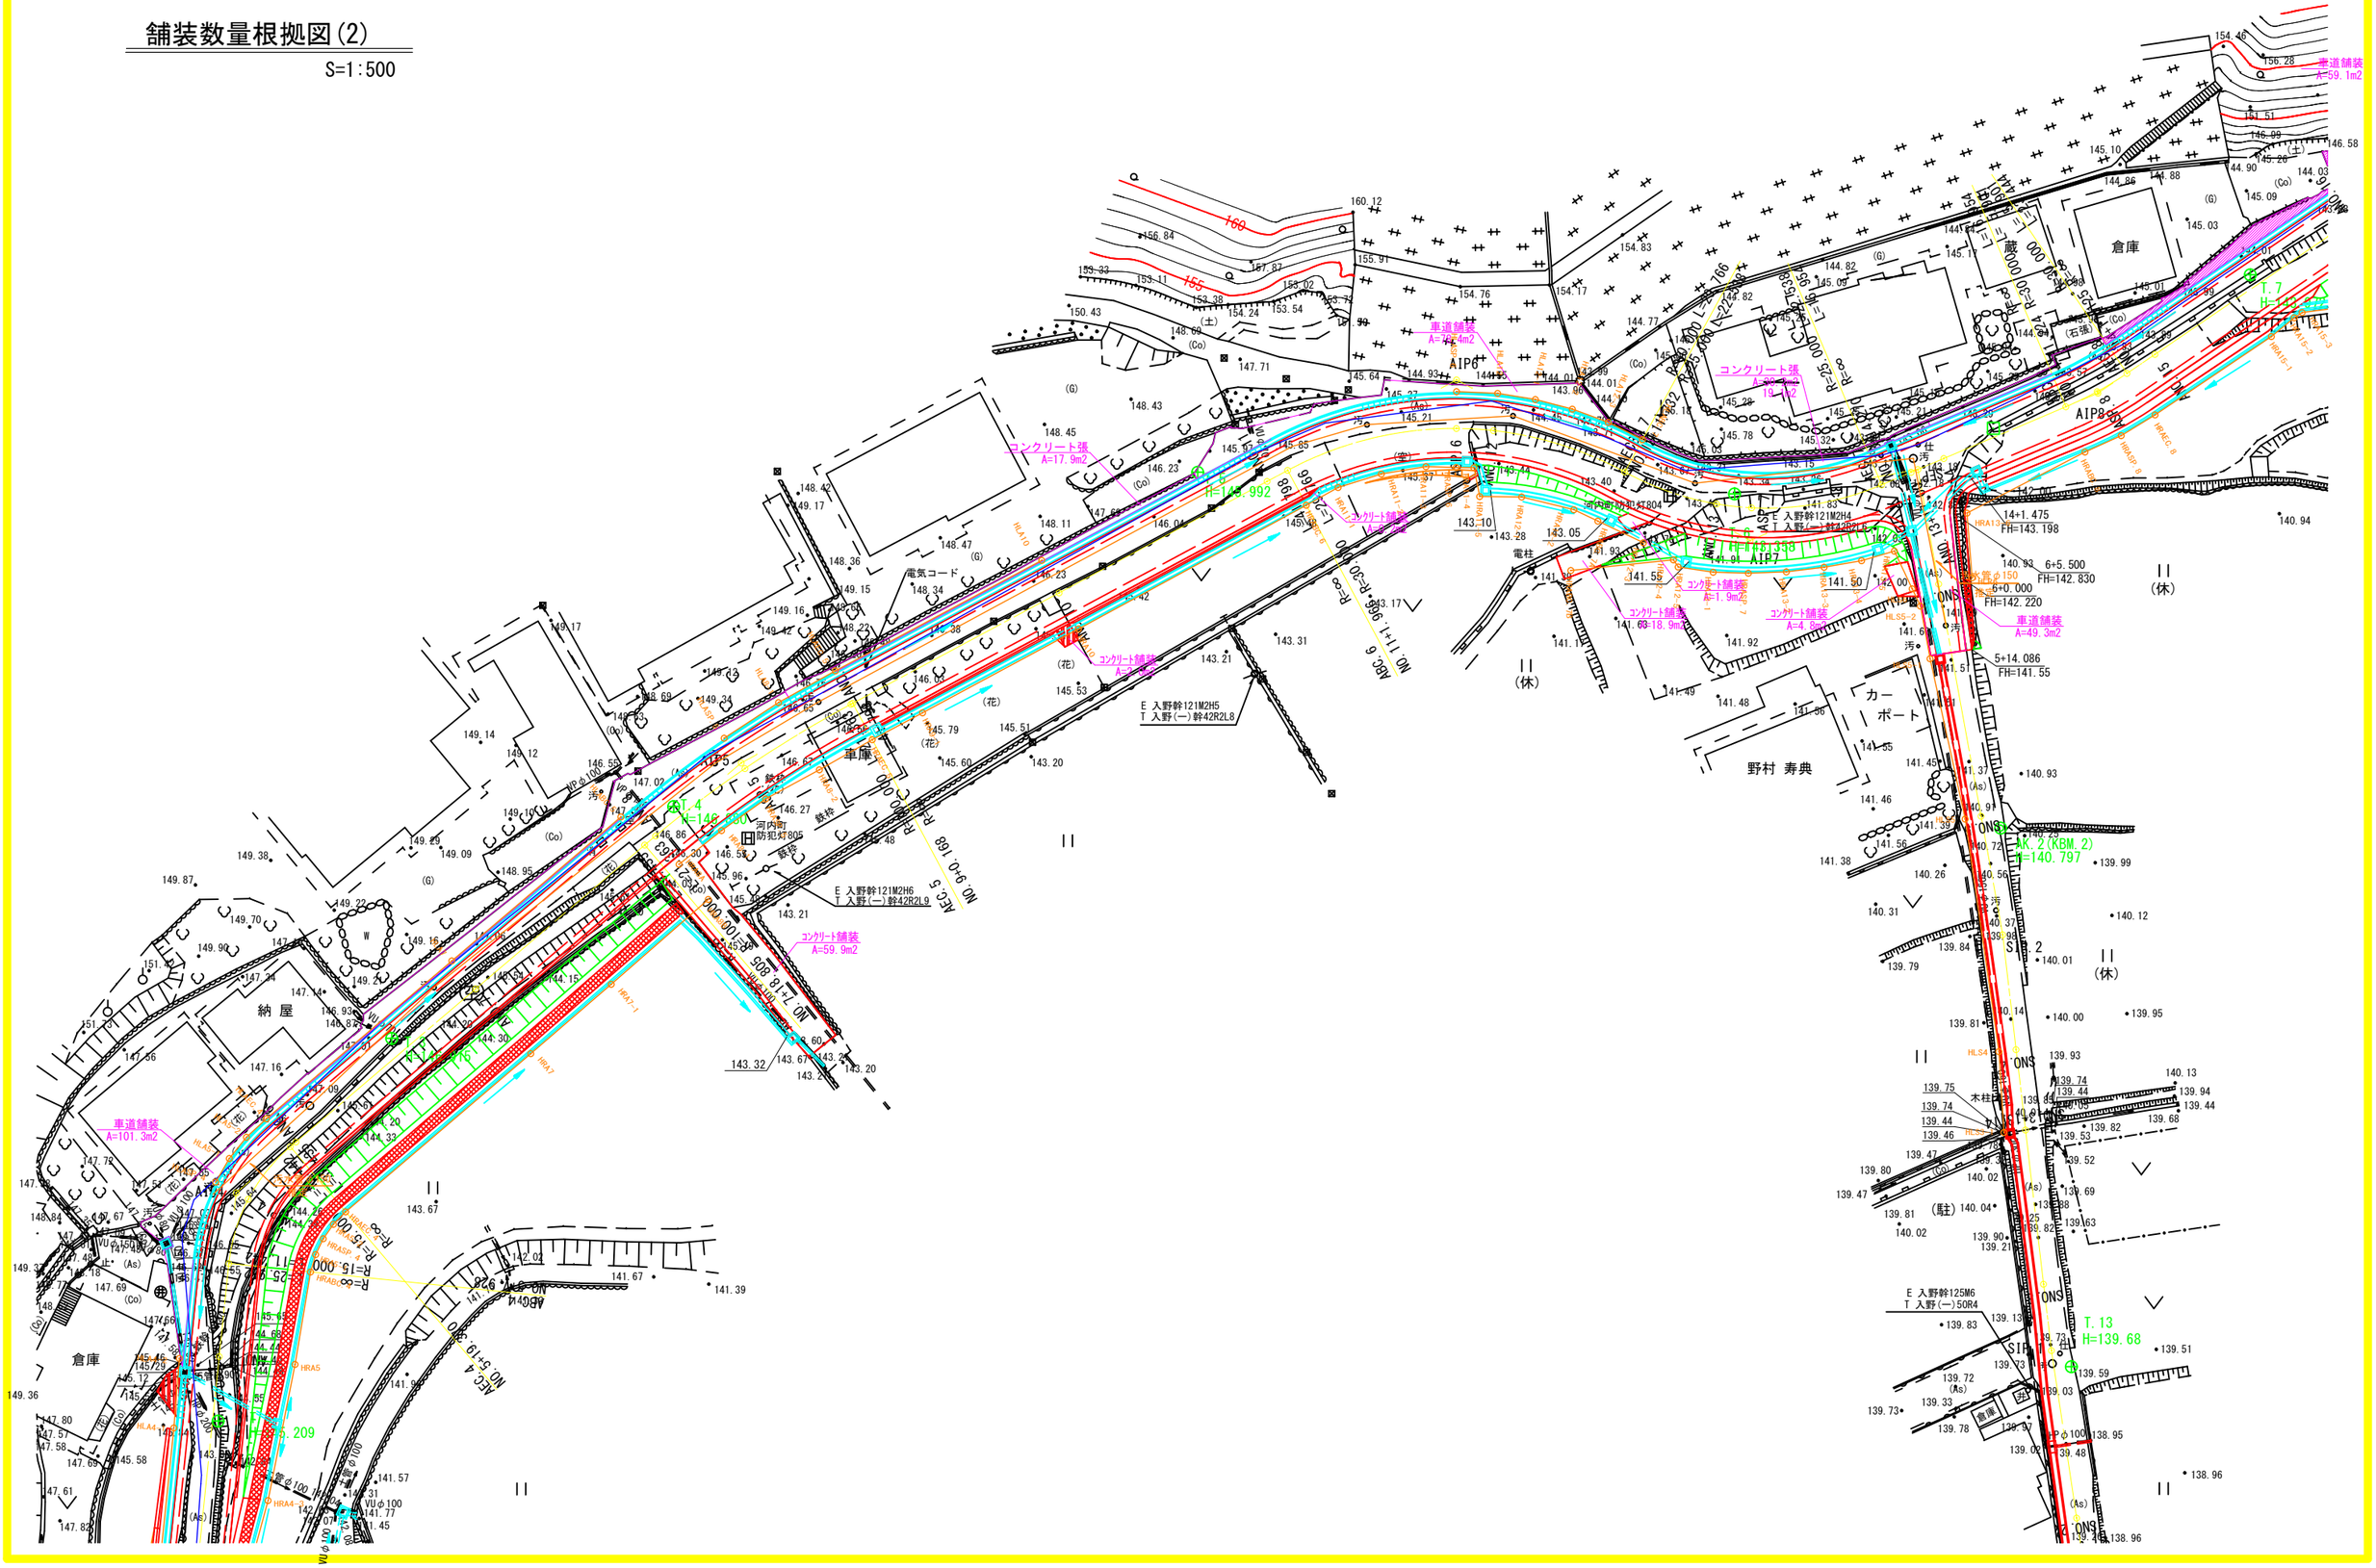

マンホール部側溝設置参考平面図

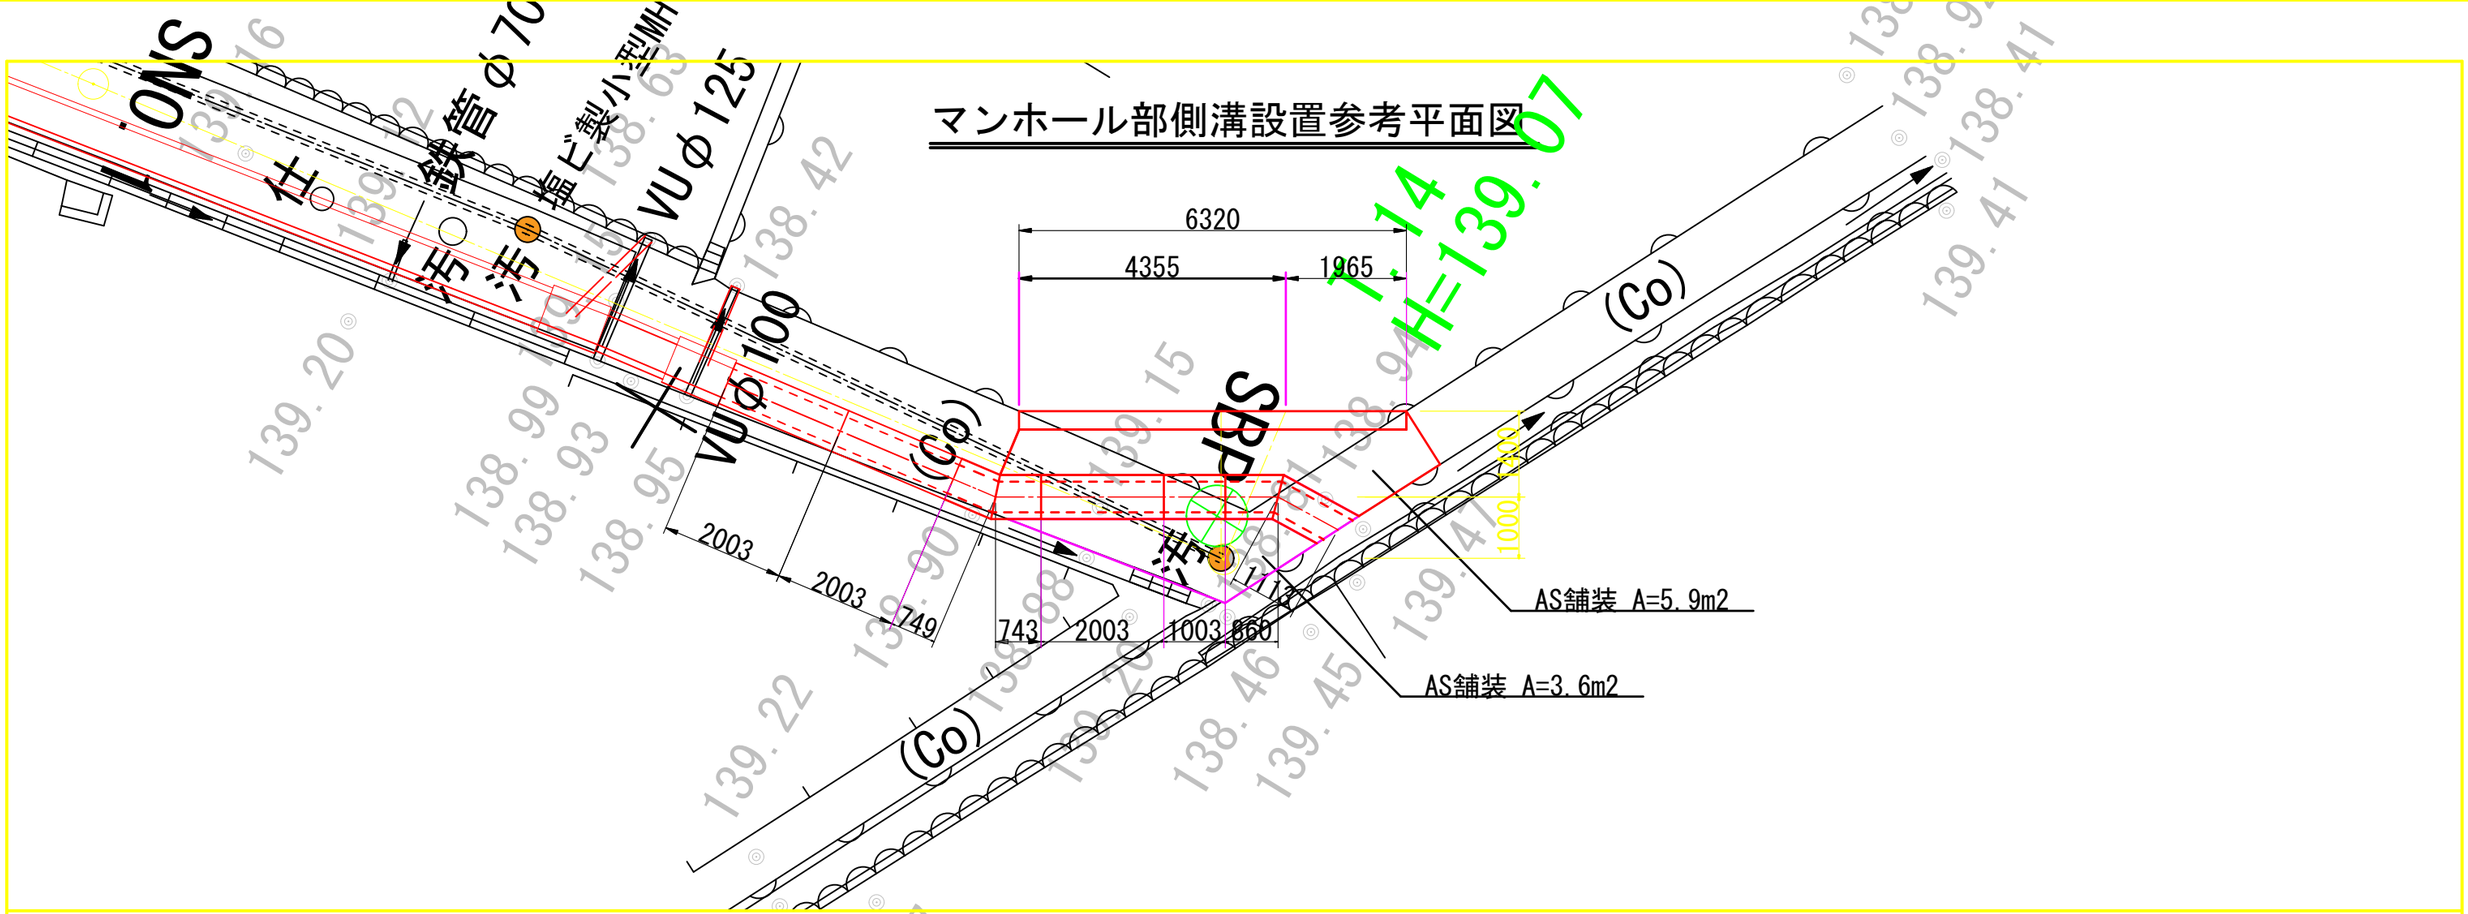

マンホール部側溝設置参考断面図

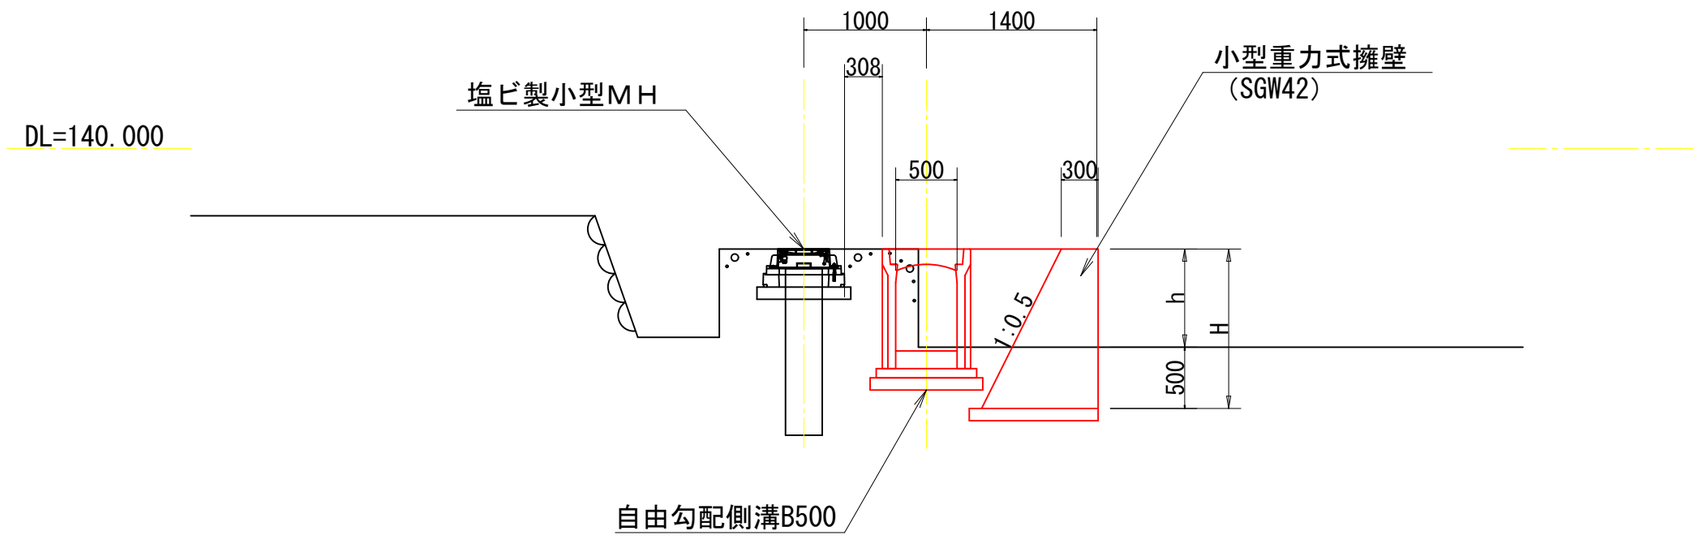

仮　設　工

仮設工数量計算書

仮設工

測点名称	区間距離	表土剥取			路体盛土			掘削（撤去）			整地			敷鉄板			備　考
		面積	平 均	立積	面積	平 均	立積	面積	平 均	立積	面積	平 均	立積	幅	平 均	面積	
①																	
sect + 0.000		0.9			0.9			0.9			0.9						
sect + 23.800	23.8	0.9	0.90	21.4	0.9	0.90	21.4	0.9	0.90	21.4	0.9	0.90	21.4				
②																	
sect + 0.000		0.9			0.9			0.9			0.9						
sect + 17.800	17.8	0.9	0.90	16.0	0.9	0.90	16.0	0.9	0.90	16.0	0.9	0.90	16.0				
③																	
sect + 0.000		0.9			0.9			0.9			0.9						
sect + 22.300	22.3	0.9	0.90	20.1	0.9	0.90	20.1	0.9	0.90	20.1	0.9	0.90	20.1				
④																	
sect + 0.000		0.9			0.9			0.9			0.9						
sect + 10.800	10.8	0.9	0.90	9.7	0.9	0.90	9.7	0.9	0.90	9.7	0.9	0.90	9.7				
スロープ																	
平面図より																	
							3.1			3.1							
							0.9			0.9							
							1.2			1.2							

仮設工平面図 S=1:500

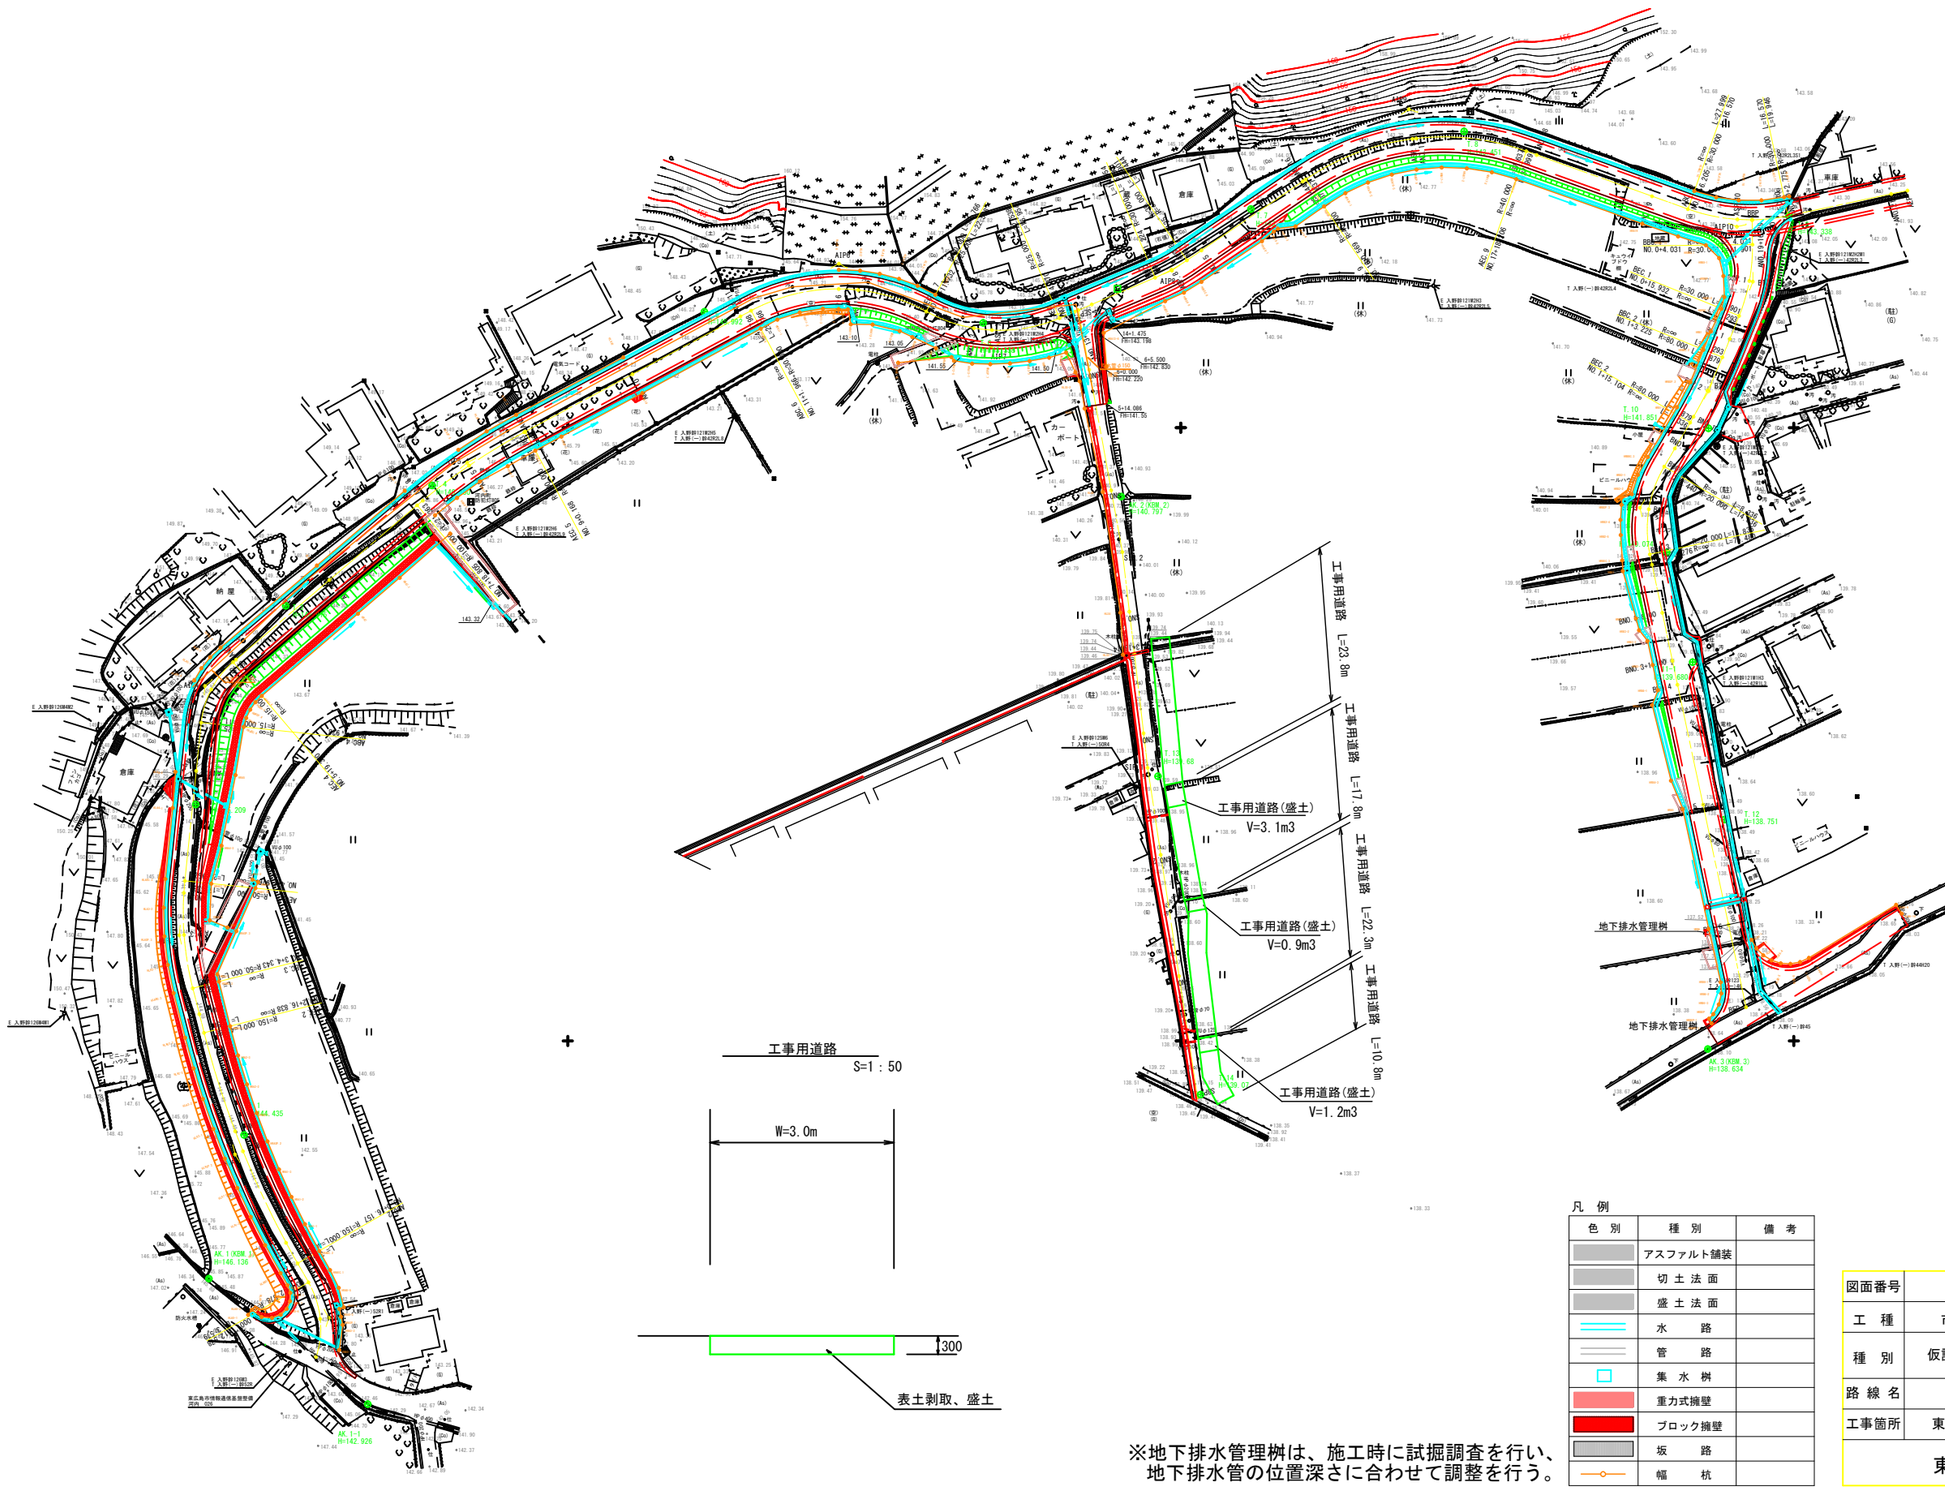

工事用道路
S=1：50

※地下排水管理桝は、施工時に試掘調査を行い、
地下排水管の位置深さに合わせて調整を行う。

凡 例

色 別	種 別	備 考
	アスファルト舗装	
	切 土 法 面	
	盛 土 法 面	
	水 路	
	管 路	
	集 水 桝	
	重力式擁壁	
	ブロック擁壁	
	坂 路	
	幅 杭	

図面番号	/	縮 尺	1：500
工 種	市道整備事業		
種 別	仮設工平面図（参考図）	番号	1／1
路線名	道面郷線		
工事箇所	東広島市河内町入野		

東 広 島 市
